

PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU

Desembru 2014

Sumariu Mensal.



1. Progresu Gastu Subsídriu Husi Relatóriu Komunidade.

Konteudo :

- 1. Progresu gastu subsídriu husi relatóriu komunidade
- 2. Progresu atividades Fase I, II III & Fase I Siklus 2.

Esplikasaun kona ba progresu gastu ejekusaun orsamentu PNDS ba Fase I, Fase II & Fase III no Fase I Siklus 2 Fulan Desembru 2014 mak hanesan tuir mai ne'e:




Fase I:
Progresu ejekusaun nivel komunidade iha Faze I 149 Sucos ba Fulan Desembru subsídriu operasional gastu ona **\$ 455,475.10 \$ ou 51. %** husi total Orsamentu **\$ 883,750.00**. Subsídriu Infraestrutura gastu ona **\$ 4,339,160.33 ou 65.44 %** husi total **\$ 6,631,250.00**. Fase I Infraestrutura prosesu konstrusaun fisiku realiza ona iha sub-projetu 336. Orsamentu Subsídriu Operasional restu sei uja fali ba Fase I Siklus 2 ho total **\$ 428,274.90**

Fase II
Progresu ejekusaun nivel komunidade ba iha Faze II, 91 Sucos iha fulan Desembru : Subsidiu Operasional gastu ona **\$ 253,151.98 ou 47.43 %** husi total **\$ 533,750.00** no Subsídriu Infraestrutura gastu ona **\$ 1,416,921.40 ou 35.19 %** husi total **Orsamentu \$ 4,026,250.00**

Fase III :
Subsidiu Operasional ba Fase III iha sucos 202 husi Governu hamutuk \$ 1,171,000.00 no Orsamentu ne'ebe mak restu iha Pilotu sei uja fali ba iha Fase III ho total Orsamentu \$ 44,552.28. Subsidiu Operasional Fase III gastu ona **168,816.80 ou 13.89 %** husi total Orsamentu **1,215,552.28**

Fase I Siklus 2 :
Orsamentu ba Fase I Siklus 2 hamutuk **\$ 883,759.00** no gastu ona **\$ 141,644.85 ou 10.80%**. Orsamentu restu husi Fase I siklus 1 ne'ebe mak atu suporta ba aktividade & progresu Fase I Siklus 2 hamutuk **\$ 428,274.90**

Tabela 1 : Gastus Subsidiu Operaun & Infraestrutura Faze I & Progresu Fisiku

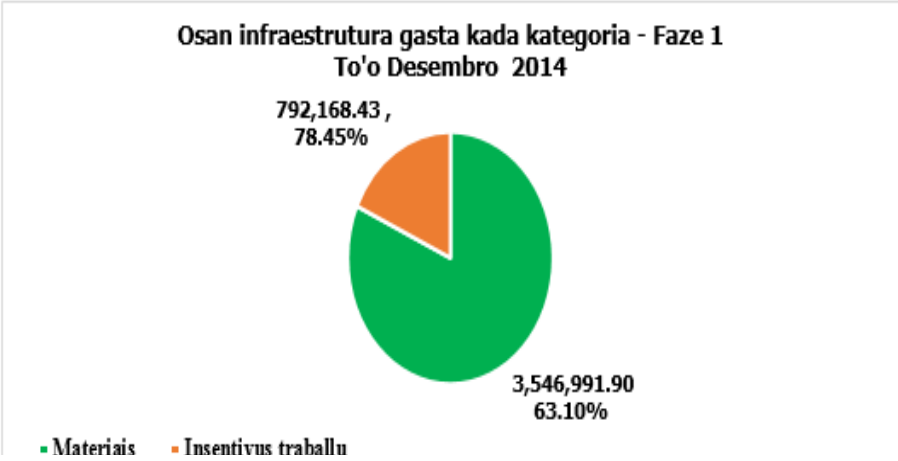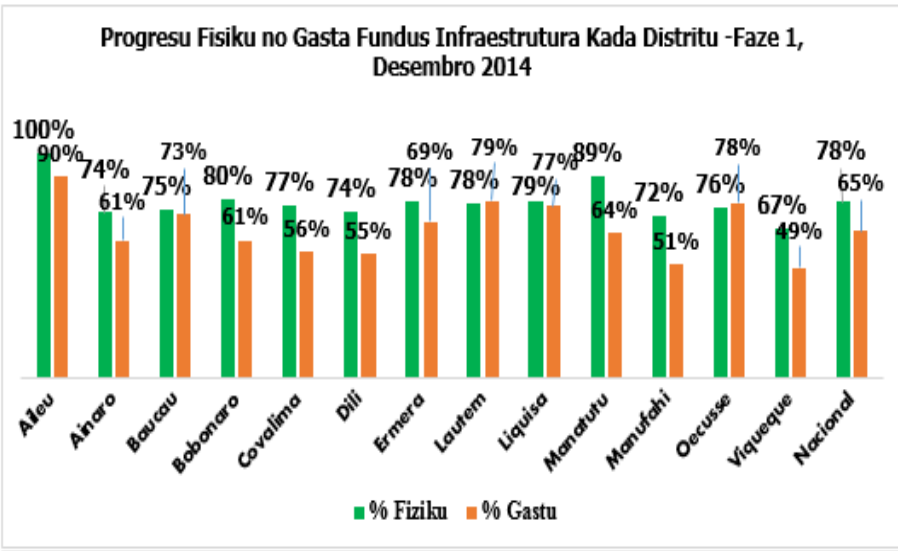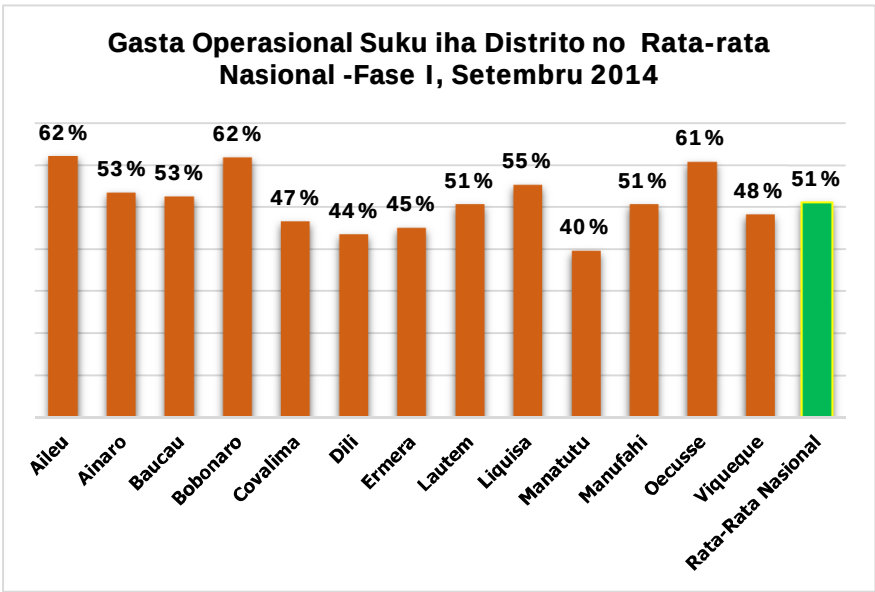

2. PROGRESU AKTIVIDADES FASE I,II,III & FASE I SIKLUS 2

Iha Fulan Desembru 2014, progresu implementasaun PNDS ne’ebe mak elabora kona ba progresu actividades no Ezekusaun Fundus Operasional & Infraestrutura Faze I, Faze II, Fase III no Fase I Siklus 2, Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir Siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne’e:

FAZE I (149 SUCO): Tama ona ba Etapa 12 Enkontru Akontabilidade Final Auditoria & Evaluasaun. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun actividades Faze I iha suku 149 nebe’e maka realiza ona iha fulan Desembru 2014 mak hanesan tuir mai ne’e :

- Fase I ho total Projetu 336 no projetu nebe mak kompleta ona hamutuk 65 projetu, no halo ona inaugurasau. Projetu balun sei iha prosesu mak foin atinje 70% - 50%.





Projetu Rehabilita Estrada, iha Suco Costa Distritu Oe-cusse ho Total Orsamentu \$. 33,922.00 comunidade serbisu hamutuk tantu Feto, Mane, Ferik & Katuas hodi konstrusaun iha sira nia suku.

- Progresu rata – rata iha Nivel Nasional mak 79.49%
- Iha Fase I, 149 suku ne’ebe mak hala’o ona enkontru akontabilidade hamutuk 28 suku no suku balun sei prosesu.
- Auditoria Final iha 149 suku, 28 suku Mak hala’o ona no suku balun mak sei iha prosesu.
- Kona ba Trasfere Aset ba EOM, suku balun hala’o ona no suku balun mak sei prosesu.

FAZE I SIKLUS 2 : Tama ona ba Etapa 2 & 4 Sosoailizasaun Suku no Aldeia & Formasaun ba Ekipa Jestaun Suku no Fasilitador Suku. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun actividades Faze I Siklus 2 nebe’e mak realiza ona iha fulan Desembru 2014 maka hanesan tuir mai ne’e :

- Sosializasaun iha Distritu, Sub-Dist, Aldei & Suku ba Fase I siklus 2 remata ona.
- Forma Ekipa Jestaun suku no Fasilitador suku ba Fase I Siklus 2 realiza ona iha suku.
- Treinamentu Modul A- D realiza ona iha suku. Informasaun kona ba Tabela subsidiu gastu operasional ba Fase I Siklus 2 hanesan tuir mai ne’e :

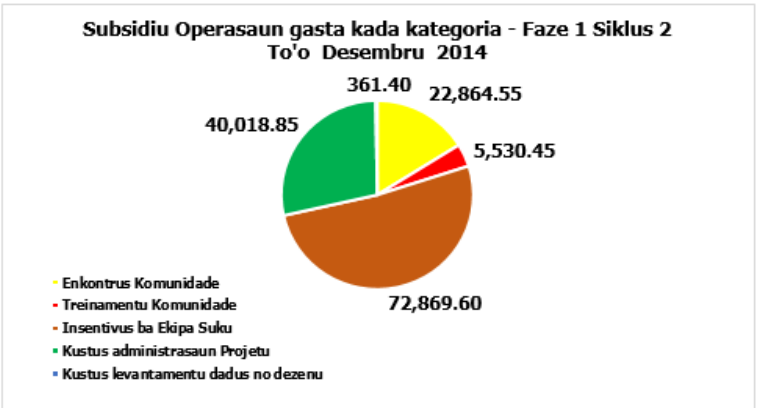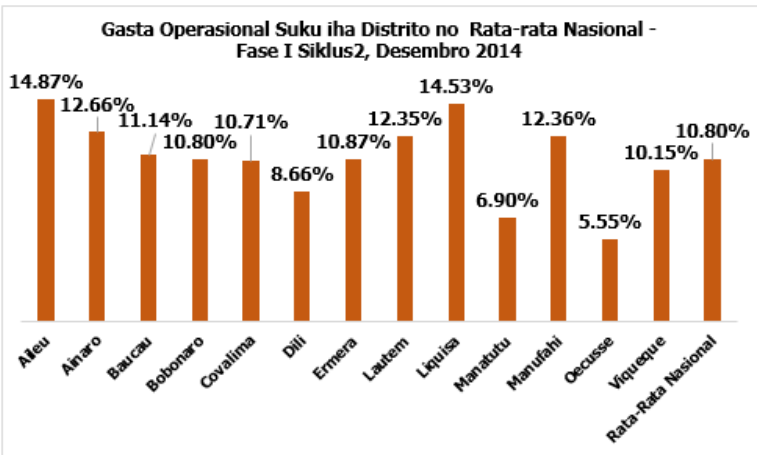


FAZE II (91 SUCO) : Tama ona ba Etapa 10 Certifika, Hala’o Enkontru Akontabilidade no Trasferensia Final (50%) Fundus Infraestrutura. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun actividades Faze II iha suku 149 nebe’e mak realiza ona iha fulan Desembru 2014 mak hanesan tuir mai ne’e :

- Fase II Total 91 Suku, no suku ne’ebe mak kompleta ona Projetu hamutuk 70 suku. Total Projetu ba Fase II hamutuk 220 no 138 mak implementa ona. Projetu balun mak sei prosesu hamutuk 60 (Mobaliza Trabalhadores & kompras material).




Komunidade iha suco Cunha Distritu Oequsse serbisu hamutuk hodi implementa projetu Konstrusaun Kanal Irigasaun ho Total Orsamentu \$ 11677.

- Progresu rata – rata iha Nivel Nasional mak 34.72%
- Informasaun kona ba Prioridades Final ba Fase II hanesan Grafiku tuir mai :

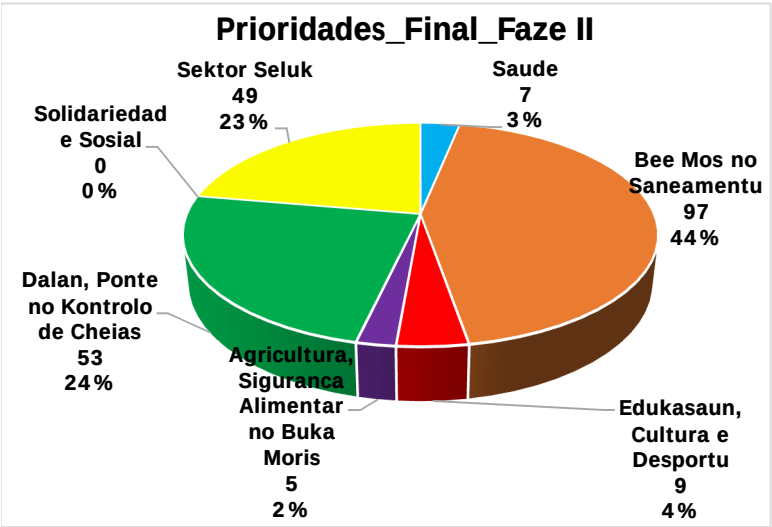

- Partisipasaun comunidade iha Determina Prioridade ba Fase II iha Tabela tuir mai :

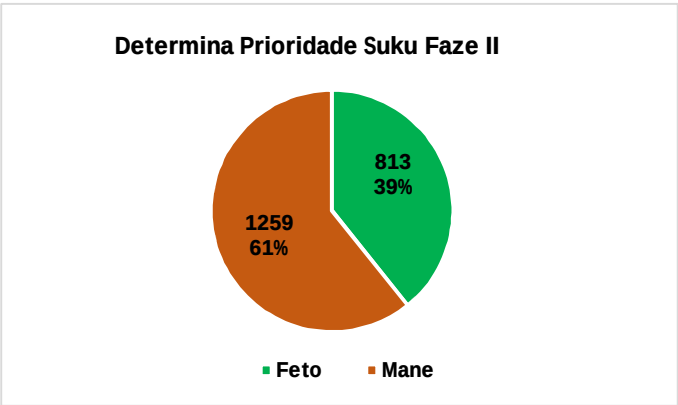


FAZE III (202 SUCO): Tama ona ba etapa 4 Formasaun ba Ekipa Jestaun Sukus no Fasilitador Suku. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades Faze III iha sukus 149 nebe'e mak realiza ona iha fulan Desembru 2014 mak hanesan tuir mai ne'e :



Ekipa Jestaun Suku tuir treinamentu MODUL D husi Fasilitador Finansas kona ba: (Jestaun finansas 1)

- Treinamentu Modul A to'o E , suku ne'ebe mak realiza ona hamutuk 17 no sukus 185 sei iha prosesu.
- Determina prioridade ba Fase III Distritu 4 (Covalima, Ermera, Baucau no Viqueque) realiza ona no hamutuk 20 sukus. Distritu 9 mak sei iha prosesu
- Esplikasaun kona ba subsídiu gastu operacional ba Fase III bele hare iha tabela tuir mai:

Tabela 4. Gastus Subsidiu Operasaun Fase III

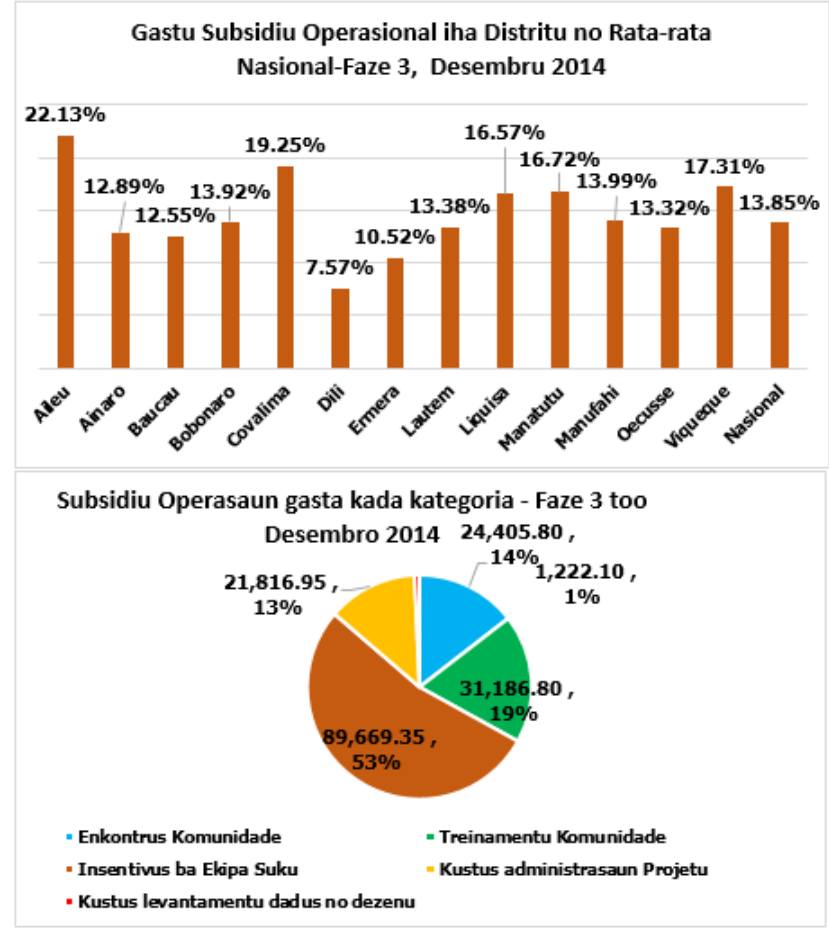

- Esplikasaun kona ba progresu fisiku & subsídiu gastu fundus infraestrutura ba Fase II bele hare iha tabela tuir mai:

Tabela 3. Progresu Fisiku & Gastus Subsidiu Infraestrutura Fase II

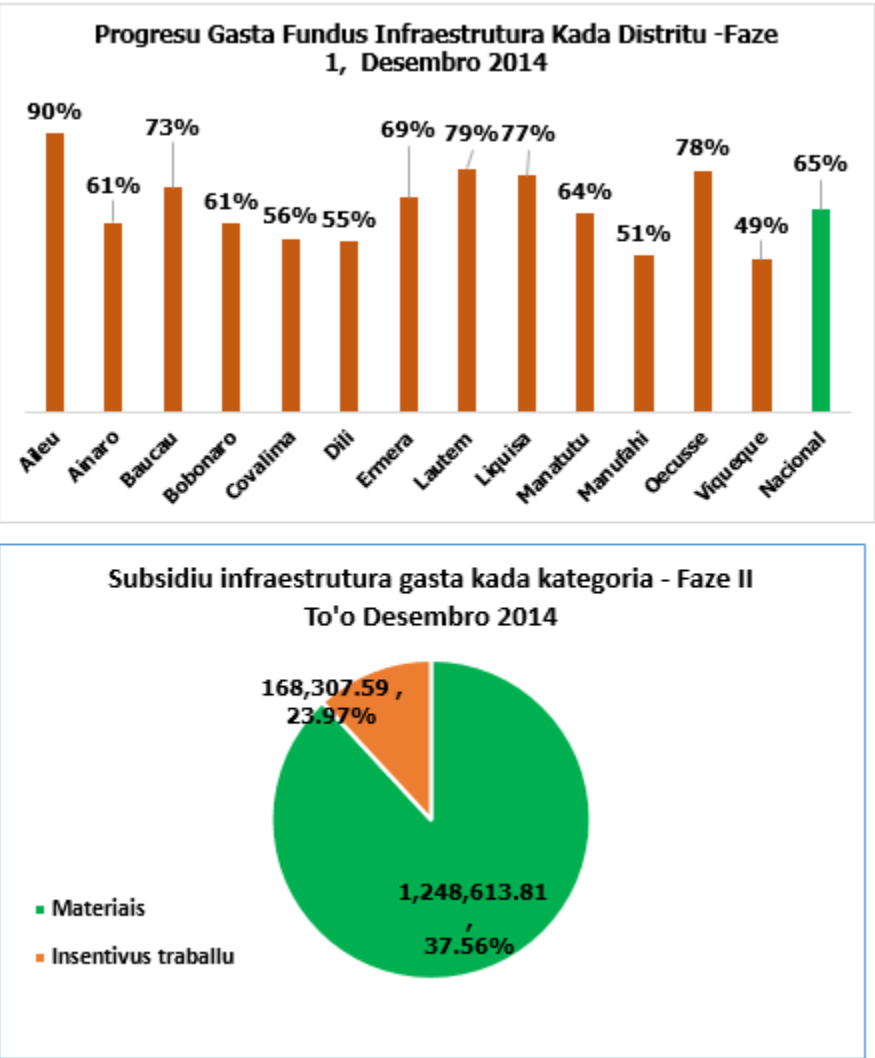


Tabela 3 : Gastus Subsidiu Operasaun Fase II

- Informasaun kona ba Tabela subsídiu gastu operacional ba Fase II hanesan tuir mai ne'e :

