




PNDS simu apoiu husi



Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

National Program for Village Development

Relatóriu Mensal

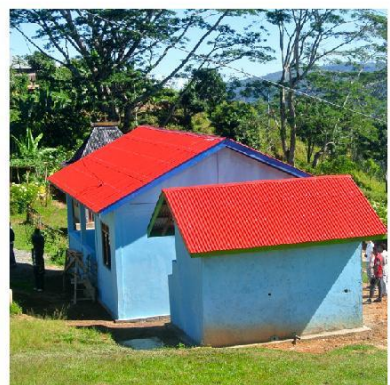

Maio 2015



PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU
"HAMUTUK ITA DEZENVOLVE NASAUN"


Secretariadu PNDS, Edifício Central do MPIE, Fatuhada Hodi Laran
Dili, Timor Leste. Tel: 331 0980



Hato'o ba : Sua Ex. cia Ministro Planeamentu e Investimentu Estratéjico,
Sua Ex. cia Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da
Administração do Estado e da Justiça e Ministro Administração Estatal.

Offício No : 184 /PNDS /MPIE-MAE /VI /2015

Assuntos : Relatoriu Progresu Implementasaun PNDS – Mensal Maio 2015



Excelencias,

Relasiona ho asunto nebe mensionado iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio mensal ba fulan Maio 2015 konaba progresu implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) nebe sei kobre progresu tomak iha fulan Maio nian relasiona ho implementasun Faze I, II, III no Faze I siklu II.

Relatório ida ne'e sei submete ba Sua Ex. Cias Ministro MAE no MPIE bazeia ba Despacho Conjunto nº 86/2015/MAE/MPIE (Art 1.º *Gestão do Programa Nasional Dezenvolvimentu dos Sucos*).

Ida ne'e mak relatorio mensal PNDS, ba sua. Excêlensia sira nian konsiderasaun. Obrigada

Dili 30 Juñu 2015

Dulce Guterres Junior
Diretora Operasional e Kordenadora Jeral Programa
PNDS

30/06/2015

CC ba : - Ex.mo Diretor Jeral Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (DG-ADN),
- Arquivo



Melly

30 6 15

Konteúdo

1. Progresu gastu subsídiu husi relatóriu komunidade
2. Progresu atividades Faze I, II III & Faze I Siklus 2


Sumario
Relatóriu Mensal
(Maio 2015)

1. PROGRESU GASTU SUBSÍDIU HUSI RELATÓRIU KOMUNIDADE.

Esplikasaun konaba progresu gastu ezekusaun orsamentu PNDS ba Faze I, Faze II & Faze III No Faze I Siklus 2, fulan Maio 2015 mak hanesan tuir mai ne'e:


Faze I : Progresu ezekusaun nivel komunidade iha **Faze I 149** Sukus ba fulan Maio subsídiu operacional gastu ona **\$449,846.20** ou **50.90%** husi total Orsamentu **\$883,750.00** no Subsídiu Infraestrutura gastu ona **\$ 5,672,154.85** ou **85.54%** husi total **\$6,631,250.00**. Faze I Infraestrutura prosesu konstrusaun fisiku realiza ona iha sub-projetu 336. Orsamentu Subsídiu Operasional restu sei uja fali ba Faze I Siklus 2 ho total **\$ 430,312.10**. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

Grafiku 1 : Gastus fundus Infraestrutura & Progresu Fisiku Faze I & Operasional

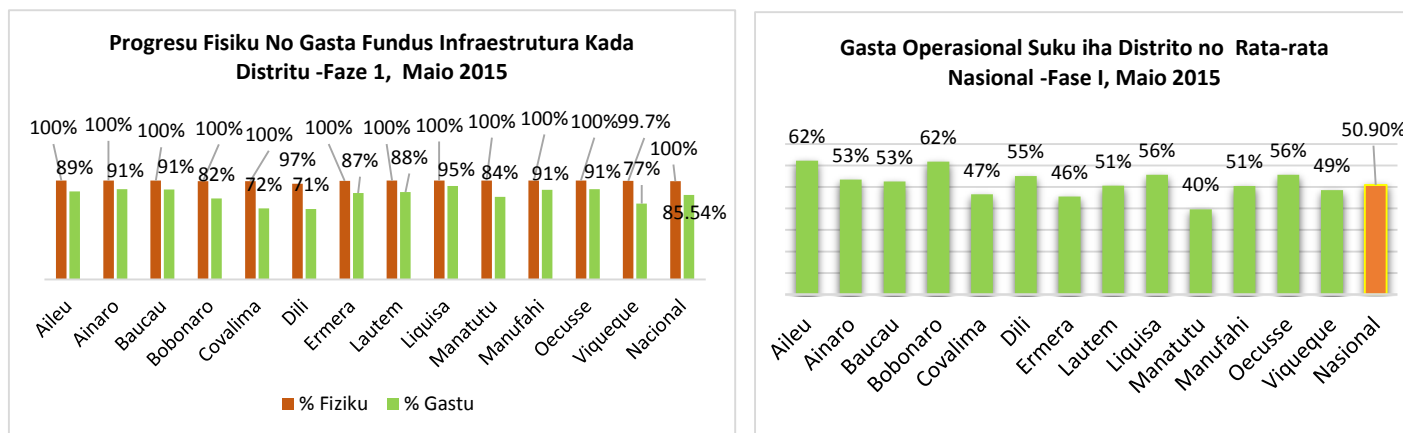

Faze II : Progresu ezekusaun iha nivel komunidade ba iha **91** sukus iha fulan Maio, Subsidiu Operasional gastu ona **\$ 378,983.98** ou **71.00%** husi total **\$ 533,750.00** no Subsídiu Infraestrutura gastu ona **\$ 3,097,363.76** ou **76.93%** husi total Orsamentu **\$4,026,250.00**. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :



Grafiku 2 : Gastus fundus imfraestrutura, progresu fisiku & gastu Infraestrutura kada categoria Faze II

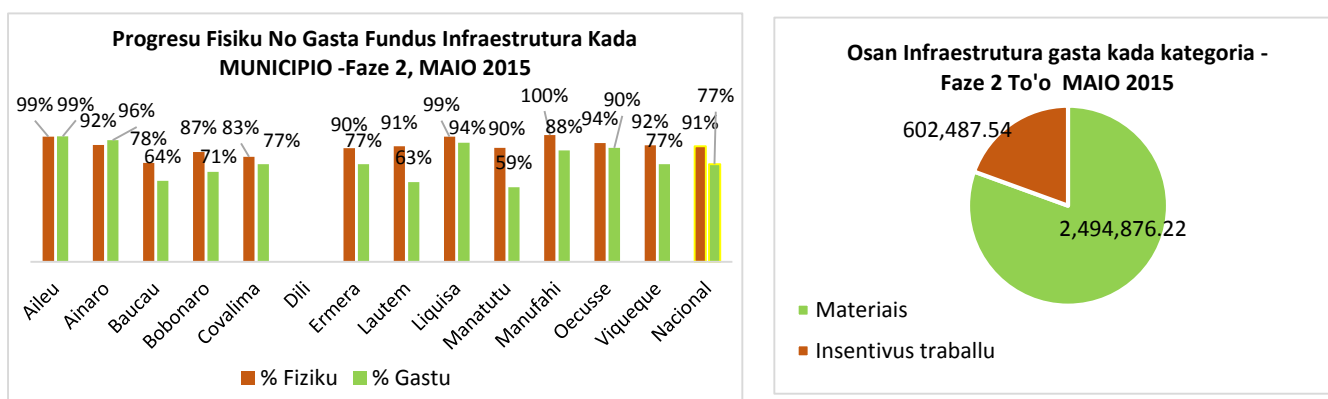

Faze III : Subsidiu Operasional ba Faze III iha sukus 202 husi Governu hamutuk **\$1,171,000.00** no Orsamentu ne'ebe mak restu iha Pilotu sei uja fali ba iha Faze III ho total Orsamentu **\$42,768.28**. Subsidiu Operasional Faze III gastu ona **\$435,861.85** ou **35.91%** husi total Orsamentu **\$1,213,768.28**

Faze I Siklus 2: Orsamentu ba Faze I Siklus 2 hamutuk \$ 1,312,128.60 no gastu ona \$392,619.30 ou 29.80%. Orsamentu restu husi Faze I siklus 1 ne'be mak atu suporta ba aktividade & progresu Faze I Siklus 2 hamutuk \$430,312.10. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

Grafiku 3 : Gastus Operasional rata – rata & gasta subsidiu operasional kada kataegoria Faze I siklus II

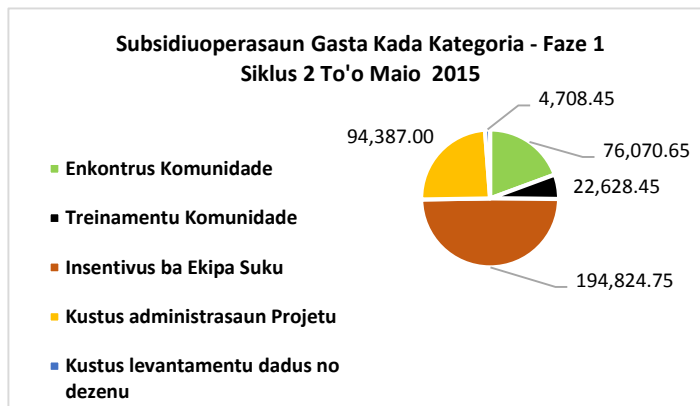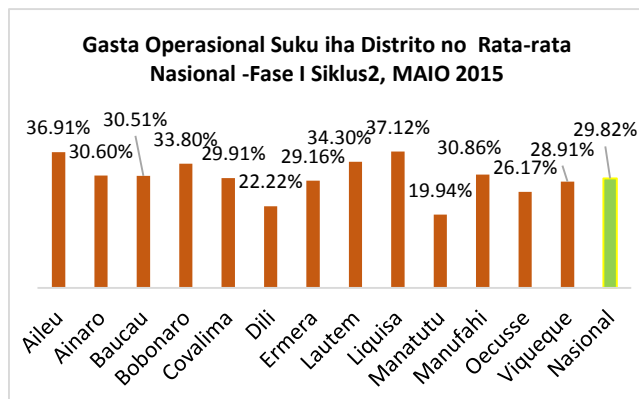

2. PROGRESU AKTIVIDADES FAZE I,II,III & FAZE I SIKLUS 2


Iha Fulan Maio 2015, progresu implementasaun PNDS ne'be mak elabora kona ba progresu aktividades no Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir Siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

FAZE I (149 SUCO): Tama ona ba etapa 11 & 12 *kompleta konstrusaun & enkontru akontabilidade Final*. Esplikasaun klaru konaba progresu implementasaun aktividades Faze I nebe'e maka realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :

- Husi 336 projeitu 331 projeitu mak kompleta ona konstrusaun no projeitu 5 mak sei prosesu konstrusaun.
- Enkontru akontabilidade final halao ona iha 32 suku. 117 suku mak seidauk tamba sei prosesu kompleta konstrusaun.
- Treinamentu modul A-H kompleta ona iha 149 suku, no total suku nebe mak halao ona treinamentu modul mak hanesan (I=129, J=119, K=118, L=97) suku.
- Persentajen progresu fisiku rata-rata nivel nasional 99.74%
- Informasaun kona ba Prioridades Final ba Faze I hanesan Grafiku tuir mai ne'e :




Comunidade suku Leotala partisipa Enkontru Akontabilidade final iha postu Administrativu Liquisa

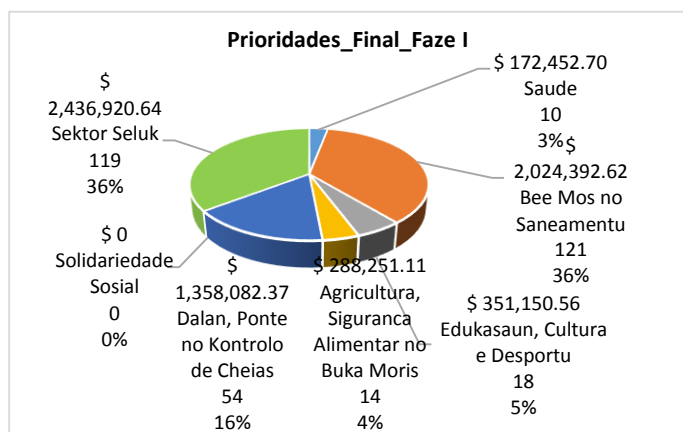

Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze I iha sorin, ita hare katak **Sektor Be'e mo'os no Saneamento** hetan porsentu maka'as liu kompara ho sector sira seluk.

Total_Partisipasaun_Generu_Treinamento EJS_Modul

Faze I



Modul Treinamento

- A: Introdusaun no Planeamento
- B: Kapasitasaun Feto 1
- C: Orientasaun ba Fasilitator Suku
- D: Jestaun Finansas 1
- E: Hakerek Proposta
- F: Kapasitasaun Feto 2
- G: Jestaun Konstrusaun
- H: Jestaun Finansas 2
- I : Monitorizasaun no Akontabilidade
- J: Operasaun no Manutensaun
- K: Jestaun Finansas 3
- L: Monitorizasaun no O&M

Grafiku iha sorin, reprezenta dadus partisipasaun **generu** iha treinamento EJS ba modul **A-L** iha faze I. Grafiku hatudu katak persentajen mane bo'ot liu kompara ho **feto**.


FAZE II (91 SUCO) : Tama ona ba etapa **11** no **12 Auditoria, encontre akontabilidade final**. Informasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades Faze II nebe'e mak realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :

- Total Sub-Projetu nebe mak remata konstrusaun ou kompleta ona 100% hamutuk **89** Sub-projetu. Sub-projetu nebe implementa ona hamutuk **219** husi **220** projetu. Projetu 1 mak seidauk implementa, tamba konstrusaun pasadeira nebe atu konstrui bele fo impakto ba comunidade nia natar iha seiçal postu administrativo Baucau Villa.
- Progresu fisiku rata-rata nivel nasional **91.20%**
- Informasaun kona ba Prioridades Final ba Faze II hanesan Grafiku tuir mai ne'e :



Konstrusaun Be'e Mos Suku Dau Udu – Postu Administrativu Cailaco Municipio Maliana ho Total Orsamentu \$ 11,073.19

Prioridades_Final_Faze II

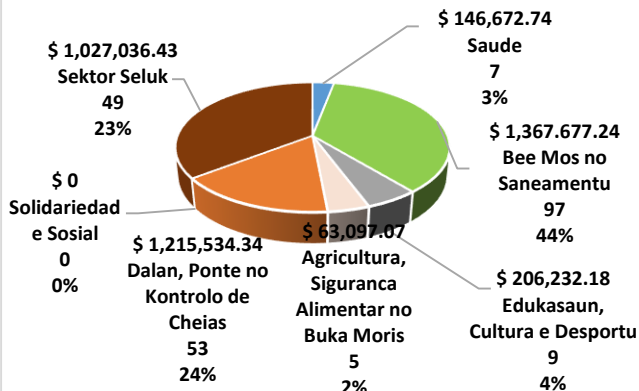

Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze II iha sorin, ita hare katak **Sektor Be'e mo'os no Saneamento** hetan porsentu maka'as liu kompara ho sector sira seluk.


FAZE III (202 SUCO): Tama ona ba etapa **4 to'o 9 formasaun ba ekipa jestaun suku & fasilitador suku no transfere fundus infraestrutura**. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades ba Faze III iha fulan Maio 2015 mak hanesan tuir mai ne'e :

- Modul treinamentu **A** kompleta ona iha **188** suku, no suku nebe mak halao ona Modul Treinamentu hanesan, (**B=185, C=188, D=192, E=143, F=110, G=74, H=60, I=31**) **sukus**.
- **148** sucos mak kompleta ona dezenu no BOQ, no **54** sucos mak seidauk tamba sei prosesu determina prioridade sucos
- Informasaun kona ba Prioridades Final suku ba Faze III no partisipasaun generu modul treinamentu faze III hanesan Grafiku tuir mai ne'e :




EJS tuir Treinamentu modul D iha Municipio Bobonaro



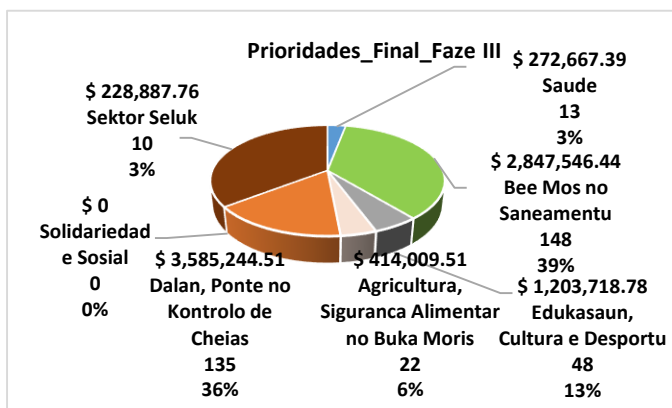

Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze III iha sorin, ita hare katak **Sektor Be'e mo'os no Saneamento** hetan porsentu maka'as liu kompara ho sector sira seluk.

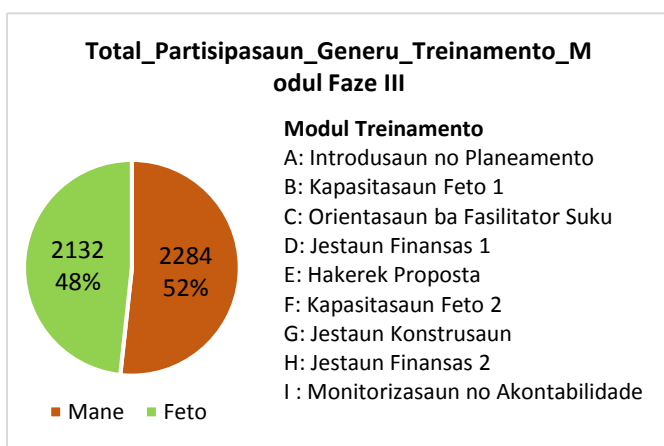

Grafiku iha sorin, reprezenta dadus partisipante **generu** iha treinamentu ba modul A-I faze III. Grafiku iha sorin hatudu katak persentajen mane bo'ot liu kompara ho persentajen **feto**.


FAZE I SIKLUS 2: Tama ona ba Etapa 4-6 *formasaun ba ekipa jestaun suku & prepara no berifika proposta projetu*. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades Faze I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Maio 2015 maka hanesan tuir mai ne'e :

- Modul treinamentu **A** kompleta ona iha 37 suku, no total suku nebe mak halao ona treinamentu modul mak hanesan : (**B=30, C=36, D=23, E=31, F=25**) suku
- Konaba verifika projetu seidauk tanba sei prosesu treinamentu
- Informasaun kona ba total partisipasaun generu ba partisipasaun EJS iha Faze I siklu 2 hanesan Grafiku tuir mai ne'e :



EJS tuir treinamentu modul H iha postu administrative Lolotoe Municipio Bobonaro

Total Partisipante EJS ba Modul Treinamentu Faze 1 siklu 2



Grafiku iha sorin reprezenta total partisipasaun EJS modul treinamentu A-F ba Faze I siklu II. Se ita hare ba grafiku iha sorin katak, persentajen feto a'as liu kompara
