

PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU

Novembru 2014

Sumariu Mensal.



1. Progresu Gastu Subsídiu Husi Relatóriu Komunidade.

Konteudo :

- 1. Progresu gastu subsídiu husi relatóriu comunidade
- 2. Progresu actividades Fase I, II & III

Esplikasaun kona ba progresu gastu ejekusaun orsamentu PNDS ba Fase I, Fase II & Fase III no Fase I Siklus II 2014 mak hanesan tuir mai ne'e:

Fase I:

Total Subsidiu Fase I siklus I, ne'ebe mak aloka ba iha suco 149 mak hamutuk: **\$ 7,515,000**; husi total ida nee mak fahe ba parte rua mak hanesan Subsidiu ba Operasional **\$ 883,750.00** no Subsidiu ba Infraestrutura **\$ 6,631,250**. Progresu ejekusaun nivel comunidade iha Faze I 149 Sucos ba Fulan Novembru subsidiu operacional gastu ona **\$ 450,830.30 \$** ou **51.01%** husi total **\$ 883,750.00** Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$ 3,581,375.51** ou **54%** husi total **\$ 6,631,250** . Fase I Infraestrutura prosesu konstrusaun fisiku realiza ona iha sub-projetu 336. Orsamentu Subsidiu Operasional restu sei uja fali ba Fase I Siklus II ho total **\$ 432,365.40**

Fase II

Progresu ejekusaun nivel comunidade ba iha faze II, 91 Sucos: Subsidiu Operasional gastu ona **\$ 224,477.73** ou **42.06%** husi total **\$ 533,750.00** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$ 956,909.62** ou **23.77%** husi total **\$ 4,026,250.00**.




Fase III :

Subsidiu Operasional ba Fase III sucos 202 gastu ona **55,174.95** ou **4.53%** husi total orsamentu **1,217,919.93**

Fase I Siklus 2 :

Orsamentu ba Fase I Siklus II hamutuk **\$ 883,759.00** Orsamentu restu Subsidiu Operasional ne'ebe mak atu suporta ba aktividade & progresu Fase I Siklus II hamutuk **\$ 432,365.40** Husi total orsamentu hirak ne'e hotu hamutuk **\$ 1,316,115.40** no gastu ona **\$ 91,959.34**

Tabela 1 : Gastus Subsidiu Operaun & Infraestrutura Faze I & Progresu Fisiku

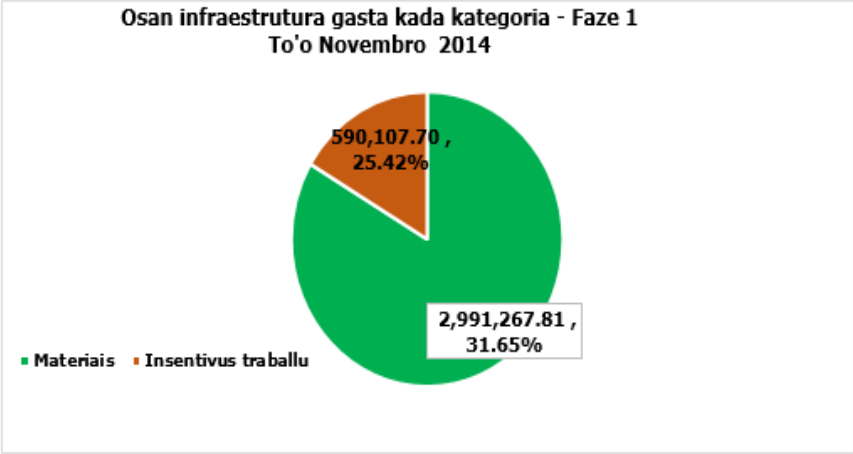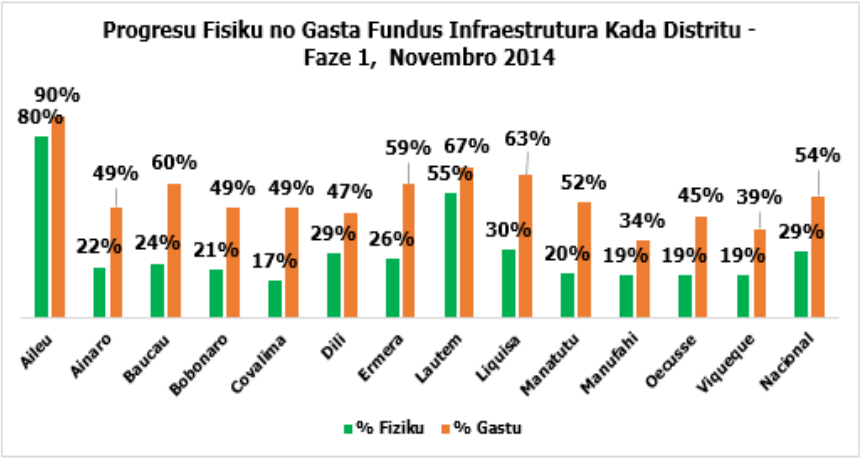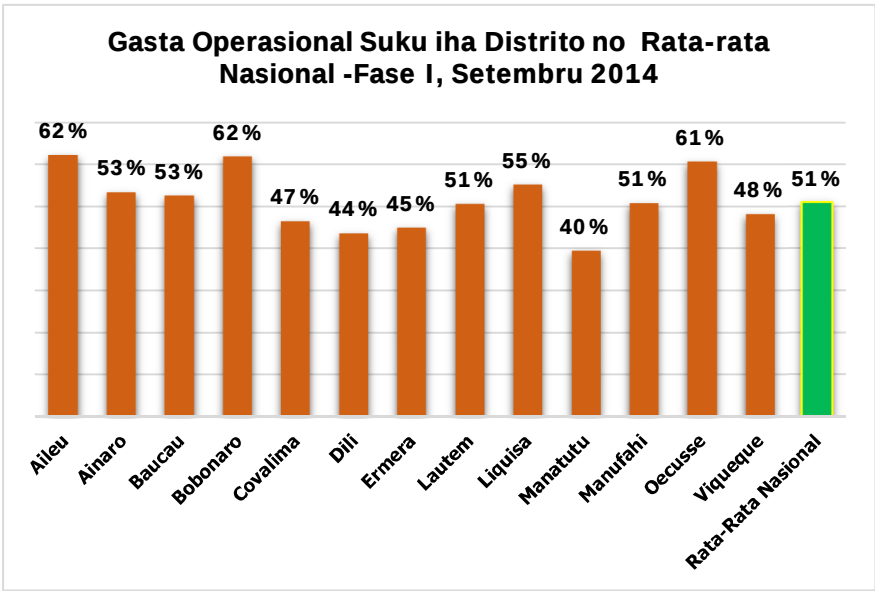

2. PROGRESU AKTIVIDADES FASE I,II,III & FASE I SIKLUS 2

Iha fulan Novembru 2014, progresu implementasaun PNDS ne’ebe mak elabora kona ba progresu actividades no ezekusaun fundus operacional & Infraestrutura Faze I, Faze II, Fase III no Fase I Siklus 2, Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne’e:

FAZE I (149 SUCO): Tama ona ba etapa 4 to’o 12 Formasaun ba Ekipa Jestaun Suku & Fasilitador Suku no mos Enkontru Akontabilidade Final Auditoria & Evaluasaun. Espikasau klaru kona ba progresu aktifidade iha fulan Novembru hanesan tuir mai ne’e :

Atividades & Progresu Fase I iha suku 149 ne’ebe maka realiza ona iha fulan Novembru mak hanesan tuir mai ne’e:

- Fase I ho total Projetu 336 no projeitu nebe mak kompleta ona hamutuk 29 projetu, no halo ona inaugurasau. Projeitu balun sei iha prosesu mak foin atinji 70% - 50%.



Sua. Ex.^{Cia} Presidente asina plaka inaugurasau projetu PNDS Centru Comunitariu Multi Propozitu iha Suku Maluru, Quelicai-Baucau

- 149 suku nebe mak hala’o ona enkontru akontabilidade hamutuk 76 suku no suku balun sei prosesu.
- Auditoria final iha 149 suku, 76 suku Mak hala’o ona no suku balun mak sei iha prosesu.
- Kona ba Trasfere Aset ba EOM, suku balun hala’o ona no suku balun mak sei prosesu.

FAZE II (91 SUCO) : Tama ona ba etapa 10 Certifika, Hala’o Enkontru Akontabilidade no Trasferensia Final (50%) Fundus Infraestrutura. Espikasau klaru kona ba progresu aktifidade Faze II iha fulan Novembru ne’ebe maka realiza ona hanesan tuir mai ne’e :


- Fase II iha Total Projetu 220 no 81 Projetu mak komesa implementa ona. Projetu balun mak sei prosesu hamutuk 94 (Mobaliza Trabalhadores & kompras material).



Komunidade iha suco Lifau Distritu Oequsse serbisu hamutuk hodi implementa projetu Rehabilitas Istrada iha sira nia suku.

- Enkontru Akontabilidade primeiru & sertifikasaun, iha suku balun mak hala’o ona no suku balu sei iha prosesu
- Trasfere Fundus Infraestrutura Fase II ba 91 suku remata ona.
- Tuir mai Tabela kona ba subsidiu gastu operacional ba Fase II :

Tabela 3 : Gastus Subsidiu Operasaun Faze II

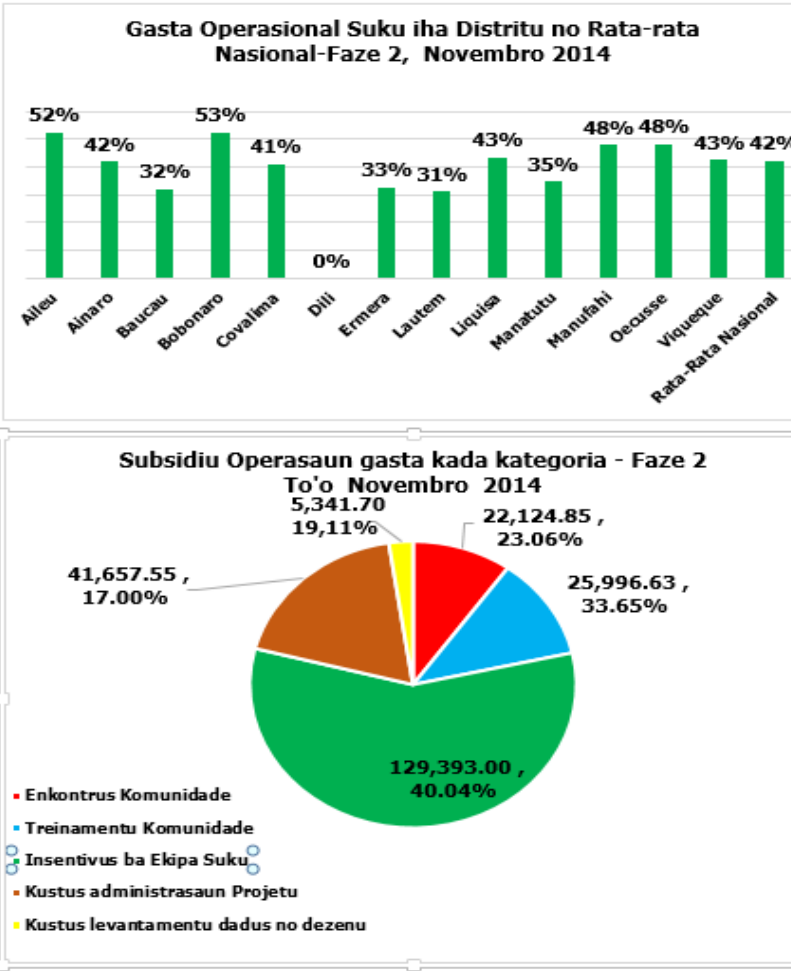


FAZE III (202 SUCO) : Tama ona ba 4 Formasaun ba Ekipa Jestaun Suku no Fasilitador Suku. Atividades & Progresu Faze III iha suku 91 ne'ebe maka realiza ona iha fulan Novembru mak hanesan tuir mai ne'e:



Ekipa Jestaun Suku tuir treinamentu MODUL D kona ba: Modul D (Jestaun finansas 1) iha Suco Uma Boco Sub-Dist Natarbora Distrito Manatuto.

- Transferensia 100% husu fundus operacional ba suku 202 remata ona.
- Treinamntu husi Modul A-D iha 202 suku realiza ona Treinamentu kona ba : A.(Introdusaun & planeamentu), B (Kapasitasaun Feto 1), C (orientasaun ba fasilitador suku), D (Jestaun finansas 1).
- Esplikasaun kona ba subsídiu gastu operacional ba Fase III bele hare iha tabela tuir mai:



Tabela 4. Gastus Subsidiu Operasaun Fase III

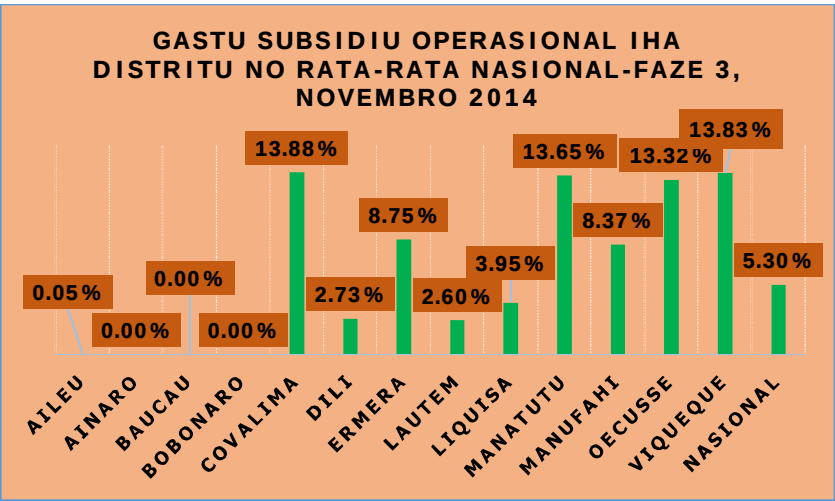

FAZE I SIKLUS 2 : Atividades & Progresu Faze I Siklus II ne'ebe maka realiza ona iha fulan Novembru mak hanesan tuir mai ne'e:

- Sosializasaun iha distritu, Sub-Dist,Aldei & Suku ba Fase I siklus 2 remata ona.
- Tranferensia 100% fundus operacional ba suku remata ona.
- Treinamentu Modul A- D realiza ona iha suku.
- Tuir mai Tabela kona ba subsídiu gastu operacional ba Fase I Siklus 2 :
-

Tabela 2 : Gastus Subsidiu Operasaun Faze 1 Siklus 2

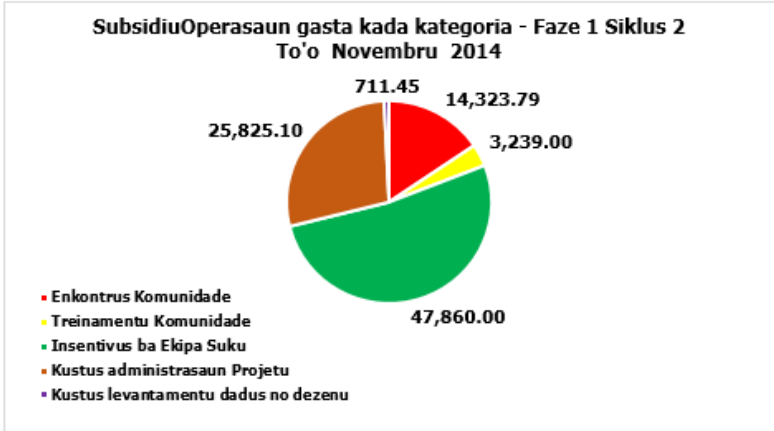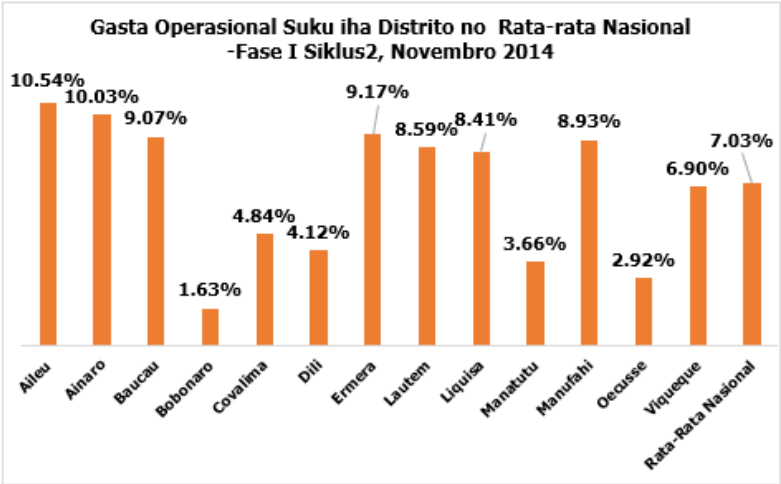

- Esplikasaun kona ba progresu fisiku & subsídiu gastu fundus infraestrutura ba Fase II bele hare iha tabela tuir mai:

Tabela 3. Progresu Fisiku & Gastus Subsidiu Infraestrutura Fase II (Kontinuasaun Tabela 3)

