

PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU

Outubro 2014



Sumariu Mensal.

1. Progresu Gastu Subsídriu Husi Relatóriu Komunidade

Konteudo :

- 1. Progresu gastu subsídriu husi relatóriu comunidade
- 2. Progresu actividades Fase I, II & III

Esplikasaun kona ba progresu gastu ejekusaun orsamentu PNDS ba Fase I, Fase II & Fase III no Fase I Siklus II 2014 mak hanesan tuir mai ne'e:

Fase I:

Total Subsidiu Fase I siklus I, ne'ebe mak aloka ba iha suco 149 mak hamutuk: **\$ 7,515,000**; husi total ida nee mak hodi fahe ba parte rua mak hanesan Subsidiu ba Operasional **\$ 883,750.00** no Subsidiu ba Infraestrutura **\$ 6,631,250.**

Progresu ejekusaun nivel comunidade iha Faze I 149 Sucos ba subsídriu operacional gastu ona **\$ 32,382.49** ou **2.49%** husi total **\$ 1,298,767.55** Subsídriu Infraestrutura gastu ona **\$ 2,857,020.91** ou **43.08%** husi total **\$ 6,631,250.00.** Fase I Infraestrutura prosesu konstrusaun fisiku realiza ona iha sub-projetu 336. Orsamentu restu sei uja fali ba Fase I Siklus II ho total **\$ 432,365.40**

Fase II :

Progresu ejekusaun nivel comunidade ba iha faze II, 91 Sucos: Subsidiu Operasional gastu ona **\$ 201,983.78** ou **37.84%** husi total **\$ 533,750.00** no Subsídriu Infraestrutura gastu ona **\$ 356,598.35** ou **8.86%** husi total **\$ 4,026,250.00.**





Fase III :

Total Orsamentu ba Fase III hamutuk **\$ 1,171,000.00** no orsamentu restu Subsidiu Operasional husi pilotu atu suporta aktividade & progresu fase III ho total orsamentu **\$ 48,493.68.** Husi total orsamentu hirak ne'e hotu hamutuk **\$ 1,219,493.68** no gastu ona **\$ 7,021.55.**

Fase IV :

Orsamentu ba Fase I Siklus II hamutuk **\$ 883,759.00** Orsamentu restu Subsidiu Operasional ne'ebe mak atu suporta ba aktividade & progresu Fase I Siklus II hamutuk **\$ 432,365.40** Husi total orsamentu hirak ne'e hotu hamutuk **\$ 1,316,115.40**

Tabela 1 : Gastus Subsidiu Operaun & Infraestrutura Faze I & Progresu Fisiku

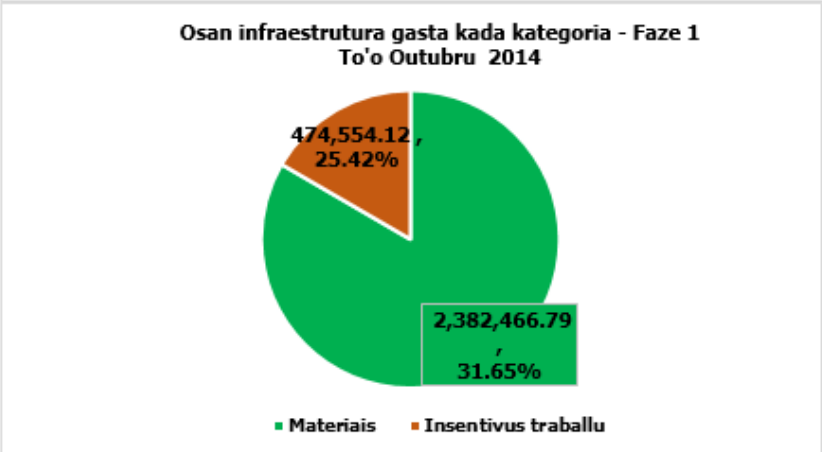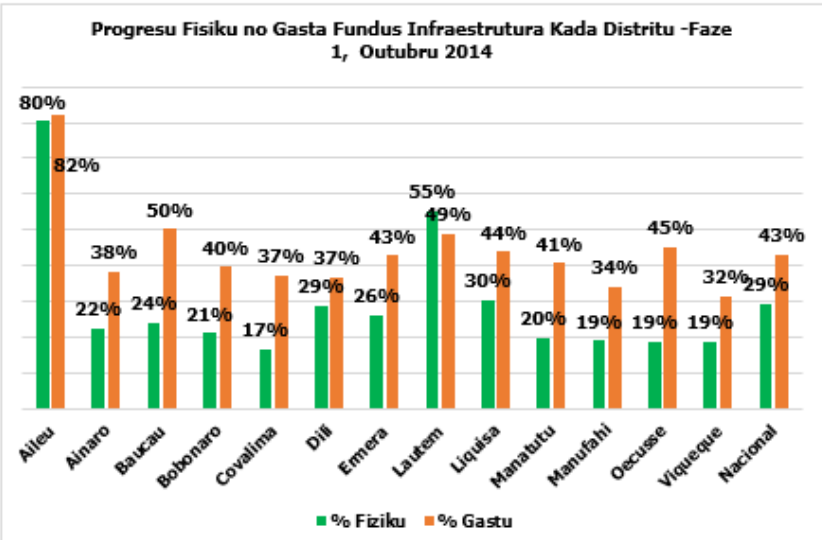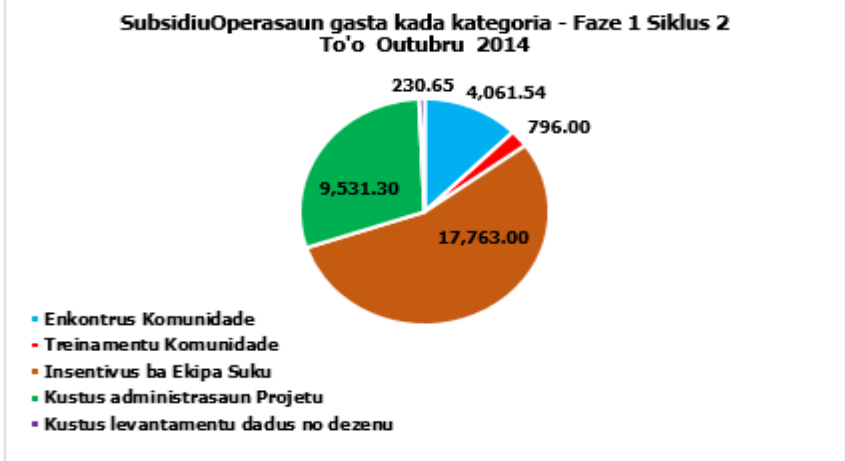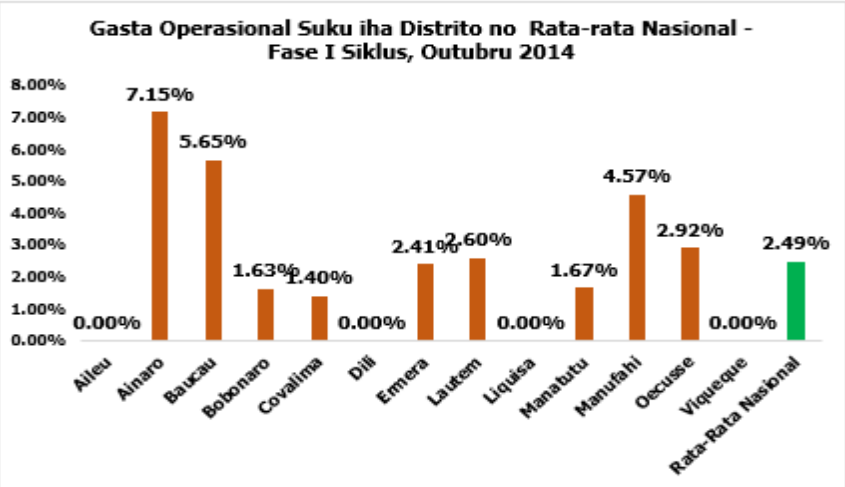

2. PROGRESU AKTIVIDADES FASE I, II & III

Iha fulan Outobru 2014, progresu implementasaun PNDS ne'ebe mak elabora kona ba progresu actividades no ezekusaun fundus operacional & Infraestrutura Faze I, Faze II, no Fase III . Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:


FAZE I (149 SUCO): Tama ona ba etapa 3 to'o 10 Loke konta bankaria suco & trasferensia 100% fundus operacionais & Halo konstrusaun.



Iha imagen hatudu katak inan feto sira komesa iha intere nebe mak bot iha programa PNDS hodi kontinua serbisu implementa projeitu iha sira nia suku.

Atividades fase I iha sukus 149 ne'ebe maka realiza ona iha fulan Outobro mak hanesan tuir mai ne'e:

- Orsamentu operacional trasfere tia ona ba konta bankaria 149 Sukus.
- Asina akordu subsídiu annual remata tia ona iha sukus 149.
- Treinamentu Modul J (Operasaun & Manutensaun suku 66 mak remata ona, Treinamentu Modul K (Jestaun Finansas 3) suku 64 mak remata ona, Treinamentu Modul L (Monitorizasaun O&M)) suku 25 mak remata ona.
- Grafiku aktual ba Projeitu nebe tama Prioridade final ba faze I hamutuk 336 projeitu mak hanesan tuir mai neé:

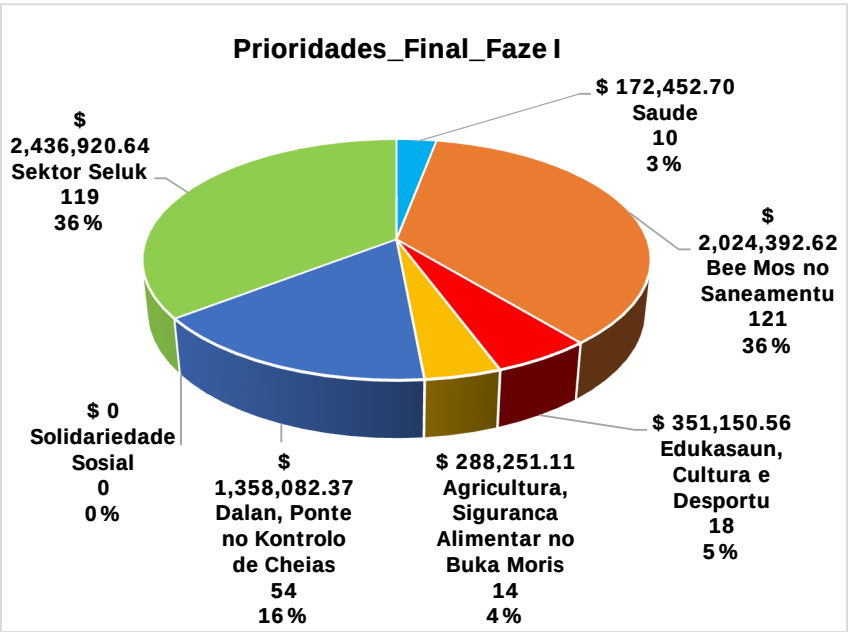

- Progresu implementasaun projeitu iha 149 suku ba Fase I, total projeitu hamutuk 336 kompleta implemeta ona.
- Progresu fisiku ba Fase I Distritu Aileu mak atinji as liu 80% no ki'ik liu mak Distritu Covalima atinji 17% atu hatene klaru liu bele hare iha Tabela 1.
- Husi total projetus 336, sucos balun hala'o tiha ona enkontru

akontabilidade premeiru no sucos seluk sei iha prosesu


FAZE II (91 SUCO) : Tama ona ba etapa 9 halo konstrusaun.



Inan feto sira iha Aldeia Loiquero Sub-Dist Tutuala serbisu maka'as hodi hahu konstrusaun projeitu Centru Komunitario iha sira nia suku.

Progresu actividades Faze II iha suku 91 ne'ebe maka realiza ona iha fulan Outobru mak hanesan tuir mai ne'e:

- 91 sukus mobaliza ona traballhador no halo aprosionamentu & komesa hahu konstrusaun.
- Hatama Requizisaun Pagamentu Fundus Infraestrutura (faze II) ba suku remata ona iha sukus 91,
- Transfere fundus infraestrutura (faze II) ba konta bankaria sukus 91 remata ona?
- Distritu 2 hanesan Liquisa no Oecusse komesa hala'o ona konstrusaun tuir projeitu sira nebe'e mak determina ona.
- Total projeitu ba Fase II hamutuk 220, Dizenho & BOQ iha 91 sukus 200 mak kompleta ona falta 20 mak sei iha prosesu.
- Ba Fase II konstrusaun iha sukus balu komesa realiza ona no suku seluk sei iha prosesu
- Total Prioridades Final ba Fase II hamutuk 219 projecto atu hatene klaru liu bele hare iha gráfiku tuir mai.

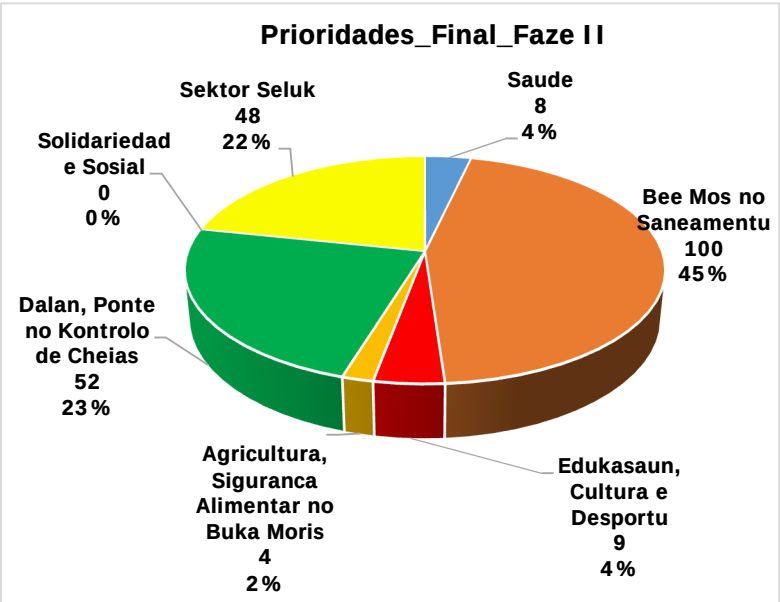

- Gastu Operasional suku iha Distritu Rata- rata nasional Fase II outobru 2014, Distritu 4 mak uja ona osan operacional mak Distritu Dili, Ermera, Manatuto & Liquisa. Distritu Liquisa gastu ona 4.50% no Distritu 8 mak sidauk gasta osan Operasional.


FAZE III (202 SUCO) : Tama ona ba Etapa 2 toó 4 Sosializasaun Suku & Aldeia, Formasaun ba ekipa jestaun suku & fasilitador suku & loke konta bankaria suku & transferensia. Progresu atividades Faze II iha suku 91 ne’ebe maka realiza ona iha fulan Outobru mak hanesan tuir mai ne’e:




Ekipa Jestaun Suku tuir treinamentu MODUL A kona ba Introdusaun & planeamentu.

Sosializasau iha suku & aldeia.

- Sosializasaun iha Nivel suku ba Fase III hamutuk 202 suku & Total Aldeia 289 remata ona halo sosializasaun , no total participante mane no feto determina prioridade ba Fase III hanesan grafiku tuir mai ne’e :



- Treinamentu Modul C (Orientasaun ba Fasilitador Suku) Suku 151 kompleta tia ona Treinamentu falta 51 mak sei Prosesu & Modul D (Jestaun Finansas 1) Suku 174 mak kompleta tia ona treinametu no 28 suku mak sei prosesu.
- Tuir mai gráfiku participante Treinamentu husi Modul A to'o I



- Osan Operasional tama tioan ona ba 202 suku
- Suku 202 remata ona loke konta bankaria.
- Aktividade Forma ekipa jestaun suku (EJS) ba fase III husi suku 202, Detailu hanesan gráfiku tuir mai ne’e:




Tabela 2. Gastus Subsidiu Operasaun & Gastus Subsidiu Infraestrutura Fase II

