

PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU

Setembro 2014



Sumariu Mensal

1. Progresu Gastu Subsídiu Husi Relatóriu Komunidade

Konteudo :

- 1. Progresu gastu subsídiu husi relatóriu comunidade
- 2. Progresu actividades Fase I, II & III

Progresu ejekusaun orsamentu PNDS iha nivel comunidade ba implementasaun faze I 149 sucos ho montante **883,750.00** fundus operacional no \$ **6,631,250.00** fundus infraestrutura 100% transfere ona ba iha conta bankaria Suku, ba faze I, 91 sucos hamutuk **\$ 533,750.00** fundu operacional, no **\$ 4,026,250.00** ba infraestrutura, 100% transfere ona ba iha conta bankaria Suco. Atu hatene detaillu progresu gastu ejekusaun orsamentu PNDS 2014 maka hanesan tuir mai ne'e:





Fase I:

Progresu ejekusaun nivel comunidade iha faze I 149 Sucos: gastu ona gastus ona **\$ 450,774.80** ou **51.01 %** husi total **\$ 883,750.00**. Fundu Operasional ba suco 149. Fundu Infraestrutura gastu ona gastus ona **\$ 2,035,933.88** ou **30,70 %** husi total **\$ 6,631,250.00**. Fase I Infraestrutura hahú ona prosesu konstrusaun fisiku. Total fundus Fase I siklus I, ne'ebe mak aloka ba iha suco 149 hamutuk: **\$ 7,515,000**, husi total orsamentu ida ne'e mak fahe ba iha parte rua hanesan: Fundus ba operacional **\$ 883,750.00** no fundus ba infraestrutura **\$ 6,631,250**.

Fase II :

Progresu ejekusaun nivel comunidade ba iha faze II, 91 Sucos: gastu ona **\$158,902.48** ou **29.77 %** husi total **\$533,750.00** fundu operacional ba suco 91 iha faze II. Total fundus sub-subsidio husi Governo ba Suco 91 iha faze 2 mak hanesan **\$ 533,750.00** ba operacional no **\$ 4,026,250.00** ba infraestrutura. Orsamentu Infraestrutura ba faze II tama ona ba iha Suco ida-idak ninia conta bankaria. Ba iha faze II Infraestrutura progresu Fisiku halao ona iha Distrito 2 mak hanesan Distrito Liquiça no Distrito Oecusse, husi Distrito 2 gastu ona **\$28,428.45** ou **0.71 %** husi total orsamentu, Distrito 10 seidak iha Progresu tamba subsidiu infraestrutura foi mak tama hotu iha conta bankaria Suco.

Tabela 1 : Gastus Subsidiu Operaun & Infraestrutura Fase I

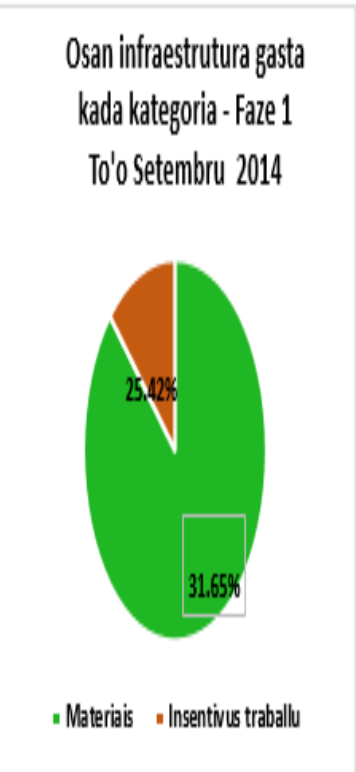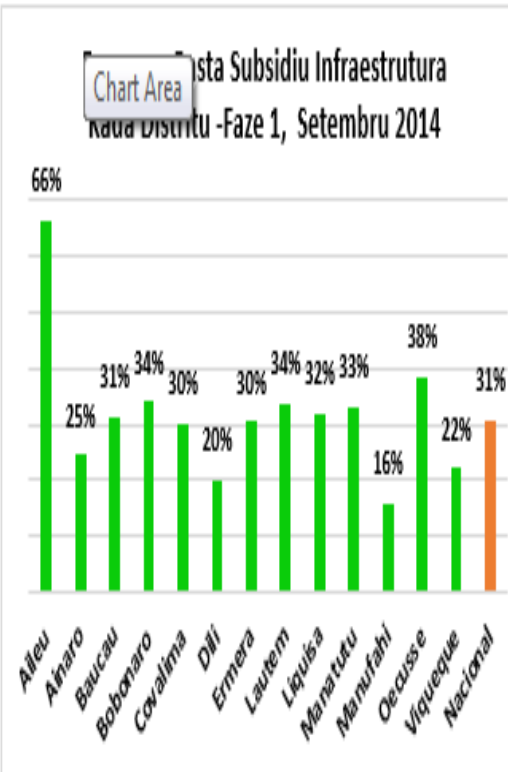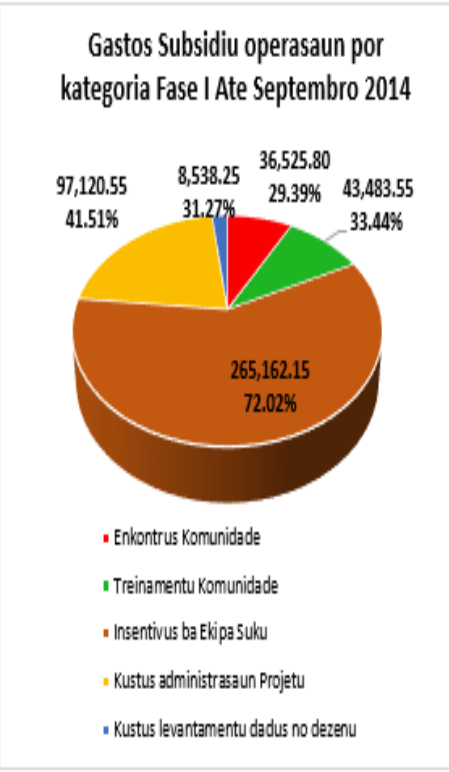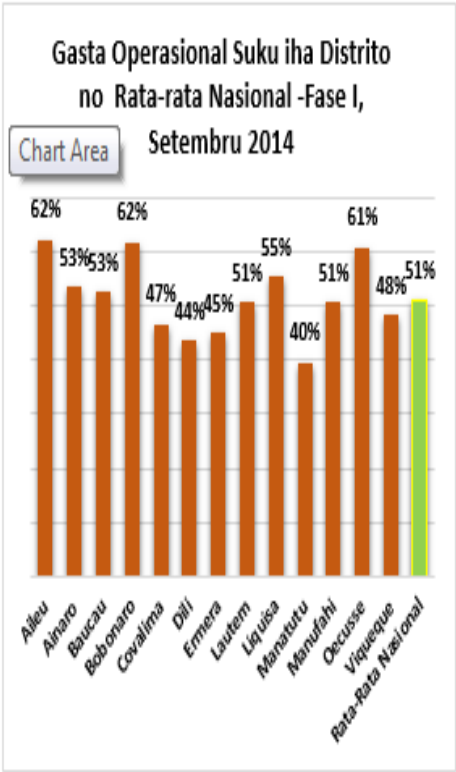

2. PROGRESU AKTIVIDADES FASE I, II & III


Iha fulan Setembro 2014, progresu implementasaun PNDS ne’ebe mak elabora kona ba progresu actividades no ezekusaun fundus operacional & Infraestrutura Faze I & Faze II, no Fase III . Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir siklus PNDS mak:

FAZE I (149 SUCO):Tama ona ba etapa 4 to’o 10
Forma ba ekipa jestaun suku & Fasilitador suku, no
certifika,hala’o enkontru akontabilidade & tranferensia final
50 % fundus infraestrutura.

Atividades fase I iha suku 149 ne’ebe maka realiza ona
iha fulan Setembro mak hanesan tuir mai ne’e:

- Asina akordu subsidiu annual remata tia ona iha suku 149.
- Treinamentu Modul J (Operasaun & Manutensaun suku 66 mak remata ona, Treinamentu Modul K (Jestaun Finansas 3) suku 64 mak remata ona, Treinamentu Modul L (Monitorizasaun O&M)) suku 25 mak remata ona.
- Transferensia fundus infraestrutura primeiru ba suku 149 remata ona.
- Progresu implementasaun projetu iha 149 suku ba Fase I, total projetu hamutuk 336, projetu ne’ebe mak komesa implementa ona hamutuk **326** no atinji ona **52.22 %** . projetus 10 mak sei iha etapa sosa materiais konstrusaun no mobalizasaun traballadores.
- Husi total projetus ba iha 149 sucos hamutuk **22** sucos mak halo tiha ona enkontru akontabilidade premeiru
- Trasfere fundus infraestrutura (fase 2) ba suku 149 hala’o tia ona.

Grafiku Progresu Fisiku Faze I

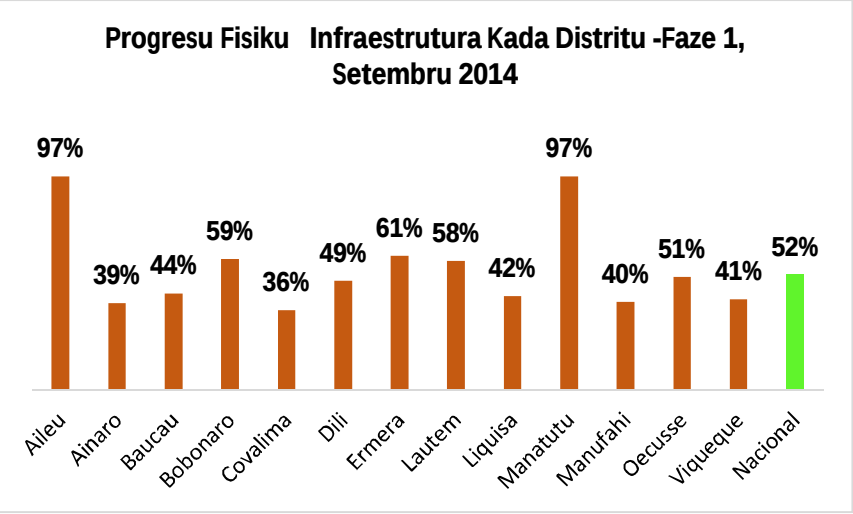


FAZE II (91 SUCO) : tama ona ba etapa 4 to’o 9
Forma ba ekipa jestaun suku & Fasilitador suku & Trasferensia
Fundus infraestrutura (primeiru) & komesa konstrusaun.



Ekipa Jestaun suku komesa sosa materials hodi hahú konstrusaun iha suku

Progresu actividades Faze II iha suku 91 ne’ebe maka realiza
ona iha fulan Septembro mak hanesan tuir mai ne’e:

- Treinamentu Modul ba Ekipa Jestaun Suku (EJS): Modul G (Jestaun Konstrusaun) suku 103 mak remata ona, Treinamentu Modul H (Jestaun Finansas 1) suku 86 mak remata ona, Treinamentu Modul I (Monitorizasaun & akontabilidade) suku 37 mak remata ona.
- Hatama Requizisaun Pagamentu Fundus Infraestrutura (faze I) ba suku remata ona iha suku 91,
- Distritu 2 hanesan Liquisa no Oecusse komesa hala’o ona konstrusaun tuir projeitu sira nebe’e mak determina ona.
- Transfere fundus infratrutura (fase I) ba suku 91 remata ona
- Total prioridades ba Faze II, kobre 91 Sucos ho total 12 Distrito. Husi dadus nota katak Prioridade Final **Sektor 002 (Sektor Be’e mo’os no Saneamentu)** hetan porsentu maka’ás liu kompara ho **sector sira seluk**. Total Prioridades Final ba Faze II hamutuk 219 projecto atu hatene klaru liu bele hare iha gráfiku.

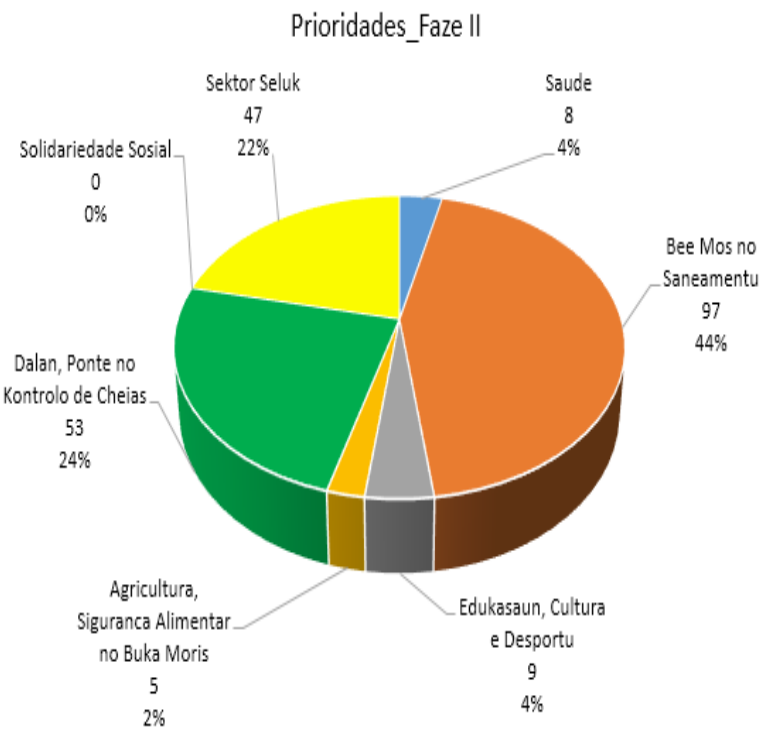

FAZE III (202 SUCO) : Tama ona ba etapa 2 toó 4 sosializasaun suku & aldeia, formasaun ba ekipa jestaun suku & fasilitador suku & loke konta bankaria suku & transferensia.rogresu atividades Faze II iha suku 91




Komunidade partisipa Sosializasaun iha suku Laclubar hodi rona esplikasaun husi ekipa PNDS kona ba programa PNDS


ne'ebe maka realiza ona iha fulan Septembro mak hanesan tuir mai ne'e:

a. Sosializasau iha suku & aldeia.

- Sosializasaun iha suku ba fase III total aldeia hamutuk 289 remata ona, husi Grafiku hatudu katak, representa sosializasaun iha nivel suku ba Faze III, numero generu partisipasaun mane aás liu feto (Mane: 3381 pessoas no Feto: 2351 pessoas).



- Sosializasaun iha aldeia ba fase III total aldeia Hamutuk 289 remata ona, husi Grafiku hatudu katak, representa sosializasaun iha nivel aldeia ba Faze III, numero generu, partisipasaun mane aás liu feto (Mane: 17420 pessoas no Feto: 11743 pessoas). Atu hatene klaru liu bele hare gráfiku tuir mai.



- Asina akordu subsidiu annual ba suku 202 remata ona.
- Sukus 202 remata ona loke konta bankaria.
- Aktividade Forma ekipa jestaun suku (EJS) ba fase III husi suku 202, Detailu hanesan gráfiku tuir mai ne'e:


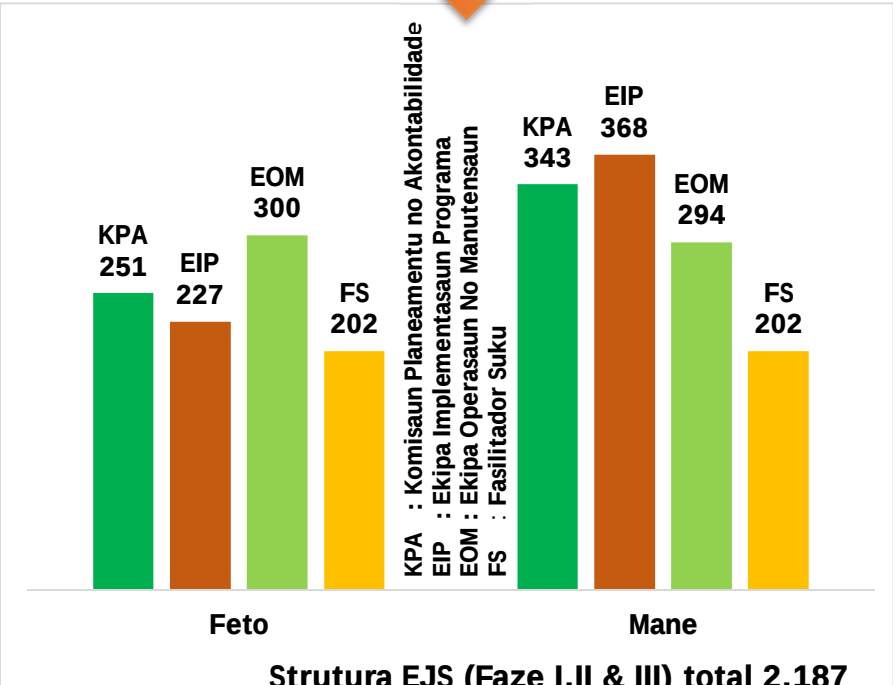


Tabela 2 : Gastus Subsidiu Infraestrutura Faze II

