




PNDS simu apoiu husi
**Australian
Aid** 

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

National Program for Village Development

Relatóriu Mensal

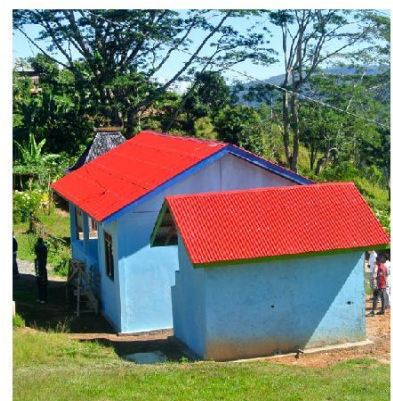

Abril 2015



PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU
"HAMUTUK ITA DEZENVOLVE NASAUN"

Secretariadu PNDS, Edifício Central do MPIE, Fatuhada Hodi Laran
Dili, Timor Leste. Tel: 331 0980



Hato'o ba : Sua Ex.cia *Ministro Planeamento e Investimento Estratégico,*
Sua Ex.cia *Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da*
Administração do Estado e da Justiça e Ministro da Administração Estatal

Officio No : ____ /PNDS /MPIE-MAE /VI /2015

Asuntos : **Relatoriu Progresu Implementasaun – Mensal Abril 2015**


Excelencias,

Relaciona ho assunto nebe mensionado iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatóriu mensal ba fulan Abril 2015 konaba progresu implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) nebe sei kobre progresu tomak iha fulan Abril nian relaciona ho implementasaun Faze I, II no Faze III.

Relatóriu ida nee sei submete ba Sua Ex.cias Ministro MAE no MPIE bazeia ba Depacho Conjunto nº 86 /2015/ MAE/ MPIE (Art 1.º *Gestão do Programa Nasional Dezenvolvimento dos Sucos*).

Ida nee mak relatóriu mensal PNDS, ba Sua.Excêlencias sira nian konsiderasaun. Obrigada

Dili, dia 03 de Juñu de 2015


Dulce Guterres Junior
Diretora Unidade Operacional
PNDS

CC ba : - Ex.mo Diretor Jeral Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (DG-ADN),
- *Arquivo*

Konteúdo

1. Progresu gastu subsídiu husi relatóriu komunidade
2. Progresu atividades Faze I, II III & Faze I Siklus 2


Sumario
Relatóriu Mensal
(Abril 2015)

1. PROGRESU GASTU SUBSÍDIU HUSI RELATÓRIU KOMUNIDADE.

Esplikasaun konaba progresu gastu ezekeusaun orsamentu PNDS ba Faze I, Faze II & Faze III No Faze I Siklus 2, fulan Abril 2015 mak hanesan tuir mai ne'e:


Faze I : Progresu ezekeusaun nivel komunidade iha **Faze I 149** Sukus ba fulan Abril subsídiu operacional gastu ona **\$453,581.70** ou **51.32%** husi total Orsamentu **\$883,750.00** no Subsídiu Infraestrutura gastu ona **\$ 5,640,282.32** ou **85.06%** husi total **\$6,631,250.00**. Faze I Infraestrutura prosesu konstrusaun fisiku realiza ona iha sub-projetu **336**. Orsamentu Subsídiu Operasional restu sei uja fali ba Faze I Siklus 2 ho total **\$ 430,312.10** atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

Grafiku 1 : Gastus fundus Infraestrutura & Progresu Fisiku Faze I & Operasional

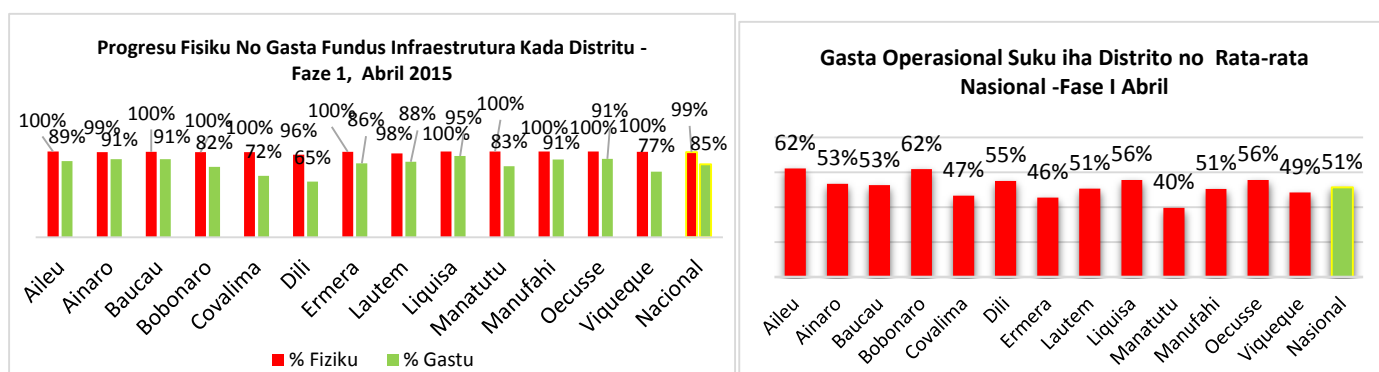

Faze II : Progresu ezekeusaun iha nivel komunidade ba iha **91** sukus iha fulan Abril, Subsidiu Operasional gastu ona **\$ 363,215.58** ou **68.05%** husi total **\$ 533,750.00** no Subsídiu Infraestrutura gastu ona **\$ 2, 820,728.83** ou **70.06%** husi total Orsamentu **\$4,026,250.00**. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :



Grafiku 2 : Gastus fundus imfraestrutur, progresu fisiku & gastu Infraestrutur kada categoria Faze II

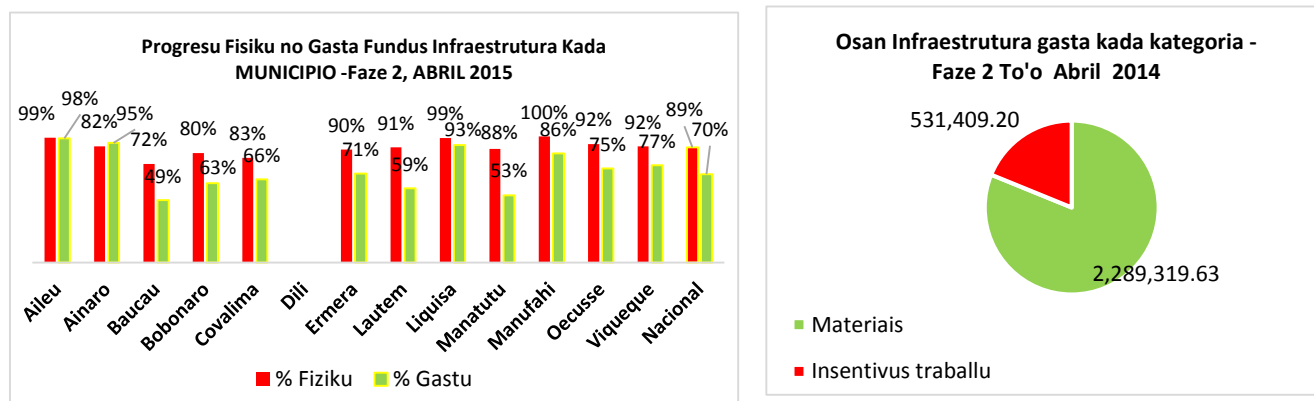

Faze III : Subsidiu Operasional ba Faze III iha sukus 202 husi Governu hamutuk **\$1,171,000.00** no Orsamentu ne'be mak restu iha Pilotu sei uja fali ba iha Faze III ho total Orsamentu **\$44,552.28** Subsidiu Operasional Faze III gastu ona **\$363,604.50** ou **29.92%** husi total Orsamentu **\$1,215,553.13**

Faze I Siklus 2: Orsamentu ba Faze I Siklus 2 hamutuk \$ 1,312,128.60 no gastu ona \$362,935.00 ou 27.63%. Orsamentu restu husi Faze I siklus 1 ne'be mak atu suporta ba aktividade & progresu Faze I Siklus 2 hamutuk \$430,312.10. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

Grafiku 3 : Gastus Operasional rata – rata & gasta subsidiu operasional kada kataegoria Faze I siklus II

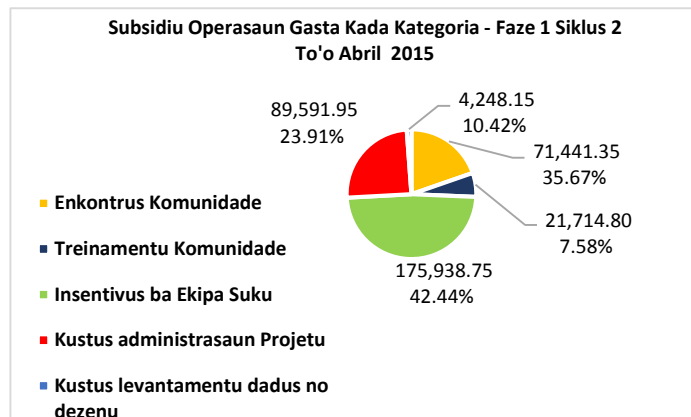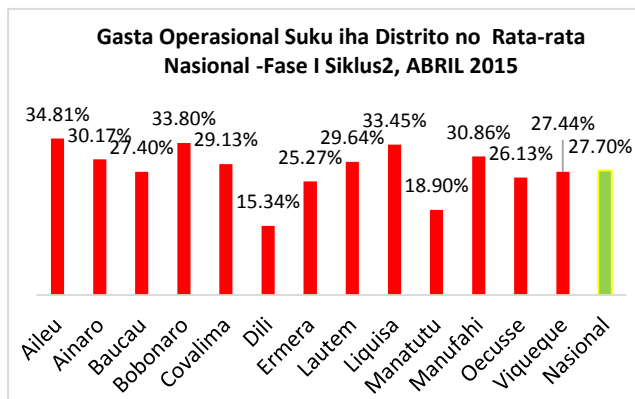

2. PROGRESU AKTIVIDADES FAZE I,II,III & FAZE I SIKLUS 2


Iha Fulan Abril 2015, progresu implementasaun PNDS ne'be mak elabora kona ba progresu aktividades no Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir Siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

FAZE I (149 SUCO): Tama ona ba etapa 11 & 12 *kompleta konstrusaun & enkontru akontabilidade Final*. Esplikasaun klaru konaba progresu implementasaun aktividades Faze I nebe'e maka realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :


- Implementsaun projeto fase I hamutuk 336 iha 149 suku, husi 336 projeto 325 projeto mak remata ona konstrusaun, no 11 projeto mak sei prosesu konstrusaun.
- Modul treinamentu L kompleta ona iha suku 8, 141 suku mak sei prosesu treinamentu
- Persentajen rata-rata nivel nasional 99.48%
- Informasaun kona ba Prioridades Final ba Faze I hanesan Grafiku tuir mai ne'e :



Kompleta konstrusaun ponte ba komunitade iha Postu Administrativo Hatolia ho total Orsamnetu \$48.750. 00

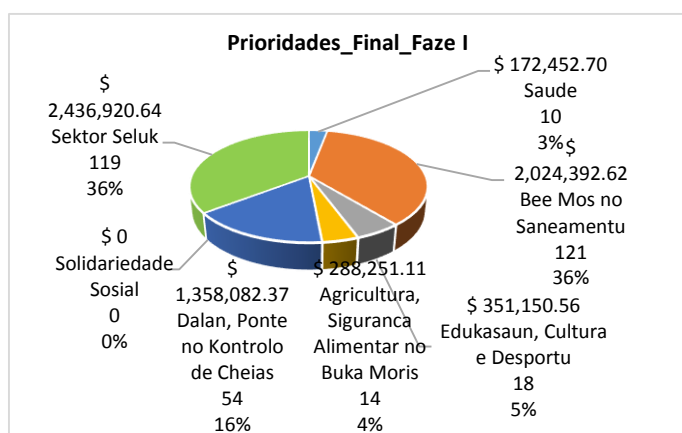

Total_Partisipasaun_Generu_Treinamento EJS_Modul L Faze I



Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze I iha leten, ita hare katak **Sektor Be'e mo'os no Saneamento** hetan porsentu maka'as liu kompara ho sector sira seluk.


Grafiku iha leten, representa dadus partisipasaun **generu** iha treinamento EJS ba modul L iha faze I. Grafiku iha leten hatudu katak persentajen mane bo'ot liu kompara ho feto.

FAZE II (91 SUCO) : Tama ona ba etapa **12 Auditoria, transferensia asset ba O&M**. Esplikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades Faze II nebe'e mak realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :

- Total Sub-Projetu nebe mak remata konstrusaun ou kompleta ona 100% hamutuk **81** Sub-projetu. Sub-projetu nebe implementa ona hamutuk **215** husi **220** projetu.
- Total Sukus Nebe mak Implementa ona Sub-Projetu Hamutuk **90** Sukus husi **91** Sukus
- Konaba **auditoria, no transferensia asset ba O & M** seidauk tanba sei prosesu konstrusaun.
- Persentajen rata-rata nivel nasional **88.95%**
- Informasaun kona ba Prioridades Final ba Faze II hanesan Grafiku tuir mai ne'e :



Inan feto sira iha suku Tapo postu administrativo Bobonaro serbisu maka'as hodi hahu konstrusaun projetu rekonstrusaun Estrada iha sira nia suku

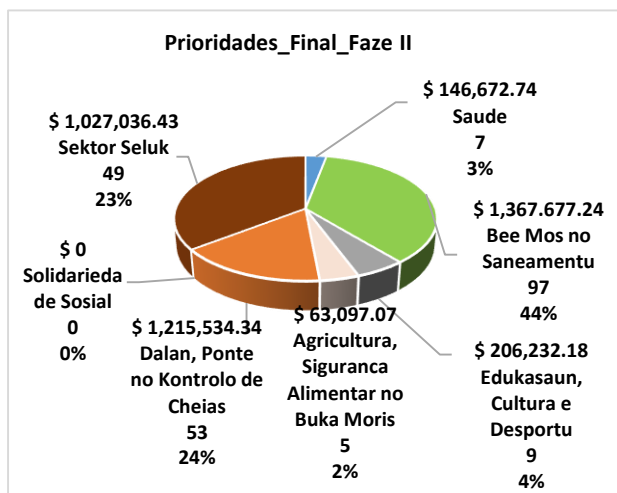


Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze II iha sorin, ita hare katak **Sektor Be'e mo'os no Saneamento** hetan porsentu maka'as liu kompara ho sector sira seluk.

FAZE III (202 SUCO): Tama ona ba etapa **4 formasuasn ba ekipa jestaun suku & fasilitador suku**. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun atividades ba Faze III iha fulan Abril 2015 mak hanesan tuir mai ne'e :

- Husi total **202** Sukus, **187** Sukus mak kompleta ona Dezeñu no **BoQ**
- Modul treinamentu A-C kompleta ona iha 52 suku, no sukus nebe mak halao ona Modul Treinamentu hanesan, **(E=28, F=45, G=12, H=12, I=7) sukus**.
- Informasaun kona ba Prioridades Final suku ba Faze III no partisipasaun generu sosialisasaun faze III hanesan Grafiku tuir mai ne'e :




Formasaun modul H ba Fasiitador Suku Postu Administrativo Dili iha Municipio Dili

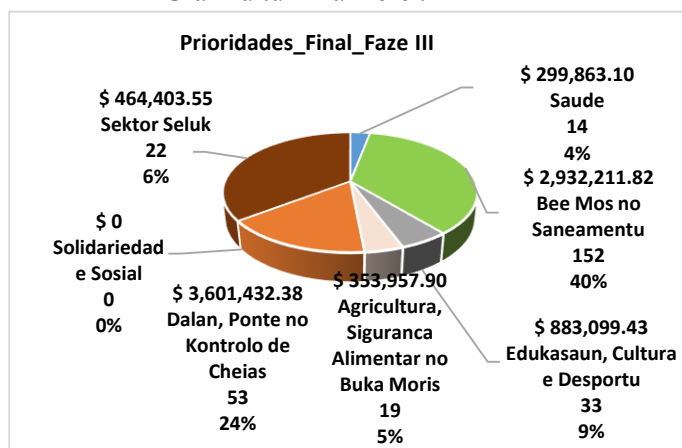

Hare ba grafiku Determina Prioridade Final faze III iha sorin, ita hare katak **Sektor Be'e mo'os no Saneamento** hetan porsentu maka'as liu kompara ho sector sira seluk.

**Total partisipasaun generu determina
prioridade suku Faze III**



Grafiku iha sorin, reprezenta dadus partisipasaun **generu** determinantes prioridade suku faze III. Grafiku iha sorin hatudu katak persentajen mane bo'ot liu kompara ho persentajen **feto**.


FAZE I SIKLUS 2: Tama ona ba Etapa **8 & 9** implementasaun *projetu no komesa konstrusan*. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun actividades Faze I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Abril 2015 maka hanesan tuir mai ne'e :

- Sosializasaun iha aldeia kobre ona **100** aldeias no nivel suku kobre ona **26** sukus
- Konaba implementasaun *projetu seidauk tanba sei prosesu sosializasaun*
- Informasaun kona ba total partisipasaun generu ba sosializasaun iha Faze I siklu 2 hanesan Grafiku tuir mai ne'e :



**Komunidade sira partisipa sosializasaun
nivel suku iha suku Batugade Postu
Aministrativu Bobonaro**

**Sosializasaun Nivel Suku Faze I
siklu II**



Grafiku iha leten reprezenta total partisipasaun generu sosializasaun nivel suku ba Faze I siklu II. Se ita hare ba grafiku iha leten katak, persentajen mane a'as liu kompara ho persentajen **feto**.
