



Relatoriu Mensal
Programa Nasional Dezenvolvimentu
Suku

(PNDS/ III/ 2015)

Data Reporta, Dia 31 Janeiru 2015



Konteúdo


1. Progresu gastu subsídiu husi relatóriu comunidade
2. Progresu atividades Faze I, II III & Faze I Siklus 2.

1. PROGRESU GASTU SUBSÍDIU HUSI RELATÓRIU KOMUNIDADE.

Esplikasaun konaba progresu gastu ezekusaun orsamentu PNDs ba Faze I, Faze II & Faze III No Faze I Siklus 2, fulan Janeiru 2015 mak hanesan tuir mai ne'e:


Faze I : Progresu ezekusaun nivel comunidade iha **Faze I 149** Sucos ba fulan Janeiru subsídiu operacional gastu ona **\$455,475.10** ou **51.54%** husi total Orsamentu **\$883,750.00** no Subsídiu Infraestrutura gastu ona **\$ 4,824,962.85** ou **72.76%** husi total **\$6,631,250.00**. Faze I Infraestrutura prosesu konstrusaun fisiku realiza ona iha sub-projetu **336**. Orsamentu Subsídiu Operasional restu sei uja fali ba Faze I Siklus 2 ho total **\$ 428,274.90**. atu hatene percentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

Grafik 1 : Gastus Subsidiu Operasional & Infraestrutura Faze I & Progresu Fisiku

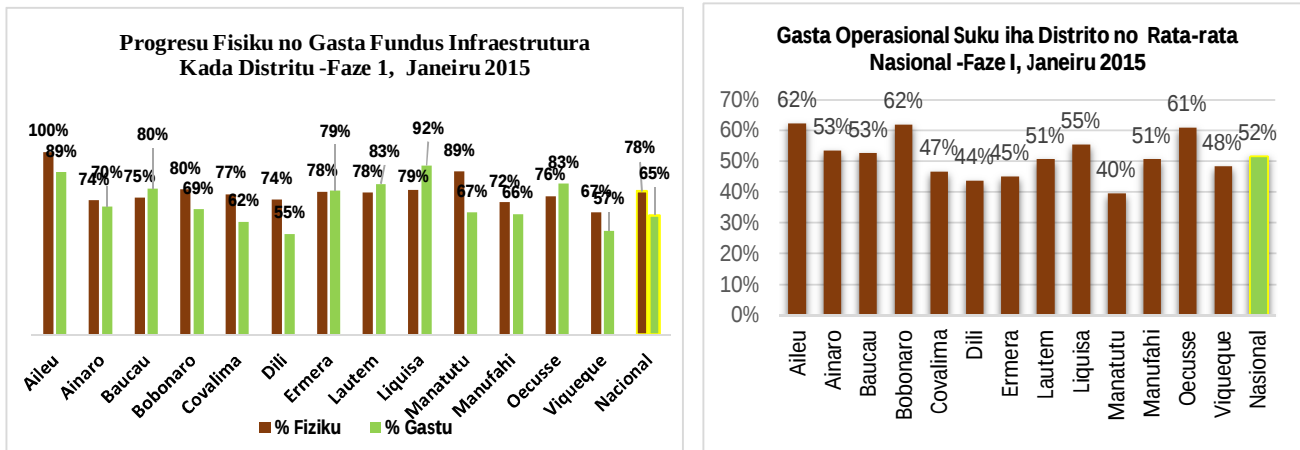

Faze II : Progresu ezekusaun iha nivel comunidade ba iha **91 sucos** iha fulan Janeiru, Subsidiu Operasional gastu ona **\$279,835.38** ou **52.43%** husi total **\$533,750.00** no Subsídiu Infraestrutura gastu ona **\$1,774,126.16** ou **43.57%** husi total Orsamentu **\$4,026,250.00**. Atu hatene percentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :


Tabela 2 : Gastus Subsidiu Operasional & fundus Infraestrutura Faze II

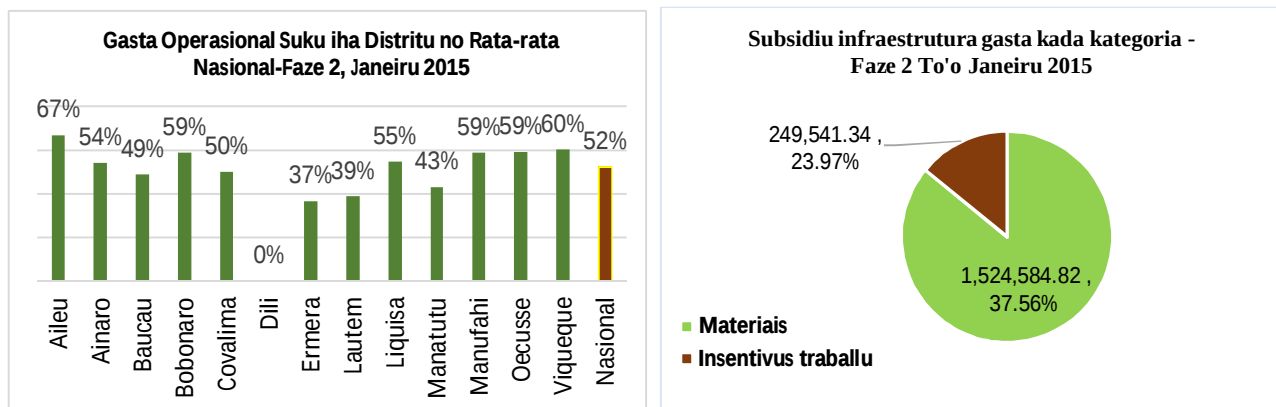

Faze III : Subsidiu Operasional ba Faze III iha sucos 202 husi Governu hamutuk **\$1,171,000.00** no Orsamentu ne'ebe mak restu iha Pilotu sei uja fali ba iha Faze III ho total Orsamentu **\$44,552.28** Subsidiu Operasional Faze III iha tinan kotuk gastu ona **\$219,355.85 ou 18.05%** husi total Orsamentu **\$ 1,215,552.28**.

Faze I Siklus 2 : Orsamentu ba Faze I Siklus 2 hamutuk **\$ 1,312,128.60** no gastu ona **\$203,666.00 ou 15.52%**. Orsamentu restu husi Faze I siklus 1 ne'ebe mak atu suporta ba aktividade & progresu Faze I Siklus 2 hamutuk **\$ 428,274.90**. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

Tabela 3 : Gastus Operasional rata – rata & gastu subsidiu operasional kada kataegoria Faze I siklus II

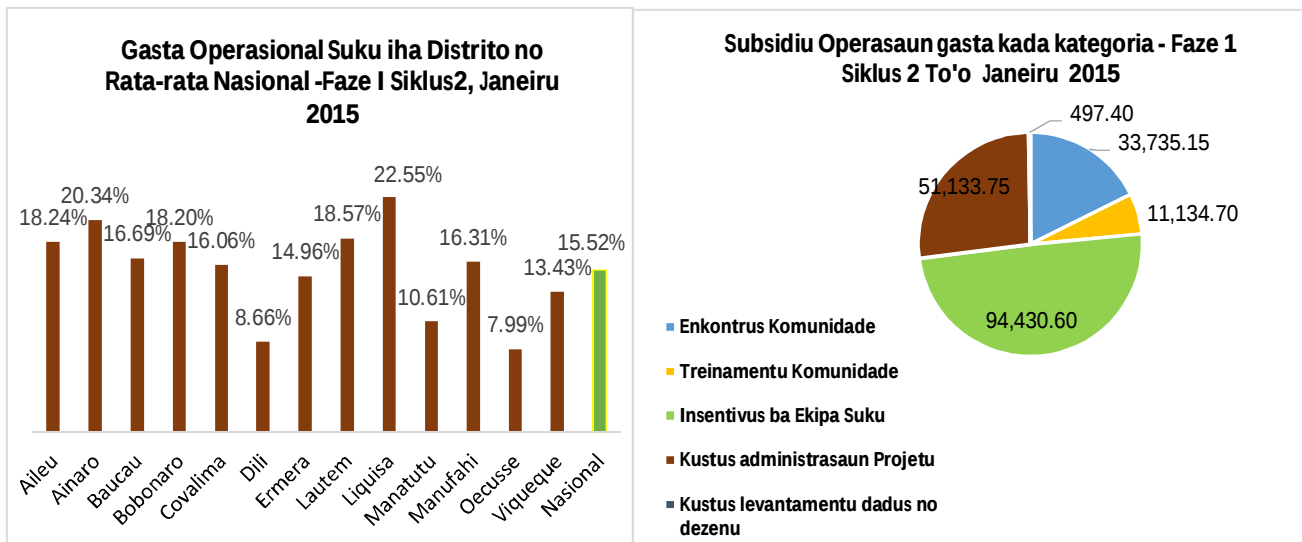

2. PROGRESU AKTIVIDADES FAZE I,II,III & FAZE I SIKLUS 2


Iha Fulan Janeiro 2015, progresu implementasaun PNDS ne'ebe mak elabora kona ba progresu aktividades no Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir Siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

FAZE I (149 SUCO): Tama ona ba etapa 11 & 12 enkontru akontabilidade Final auditoria & evaluasaun. Esplikasaun klaru kona ba progresu implementasaun aktividades Faze I nebe'e maka realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :

- Faze I ho total Projetu **336** no projetu nebe mak kompleta ona hamutuk **123** projetu. Projetu **213** mak foin **atinje 50% - 98%**.
- Informasaun kona ba Prioridades Final ba Faze I hanesan Grafiku tuir mai ne'e :

FAZE II (91 SUCO) : Tama ona ba tapa 10 certifika, hala'o enkontru akontabilidade no Trasferensia Final (50%) Fundus Infraestrutura. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun aktividades Faze II nebe'e mak realiza ona mak hanesan tuir mai ne'e :

- Sukus ne'ebe mak kompleta ona Projetu hamutuk **81** sukus. Projetu ne'ebe mak implementa ona hamutuk **183** husi **220** projetu no Projetu balun mak sei prosesu **Mobiliza Trabalhadores & kompras material**.
- Persentajen Rata-Rata Nivel Nasionál **51.68%**
- Informasaun kona ba Prioridades Final ba Faze II hanesan Grafiku tuir mai ne'e :

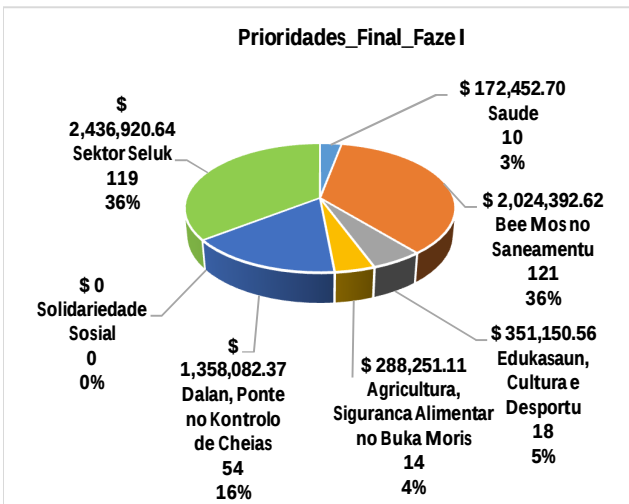


Iha grafiku ita hare katak (Sektor Be'e mo'os no Saneamentu) hetan porsentu maka'ás liu kompara ho sector sira seluk.

- Iha Faze I, 149 suku ne'ebe mak hala'o ona Enkontru akontabilidade final hamutuk **120** suku no 29 suku sei prosesu (**kompleta konstrusaun, operasaun no manutensaun**).
- Treinamentu modul **A-H** kompleta ona iha suku 149 no suku balun halao ona Treinamentu modul **I - L**, mak hanesan (**I = 120 suku, J = 110 suku, K = 110 suku, L = 73**).




Projeitu Kanal Irigasaun iha Suku Cunha Distritu Oequsse ho Total Orsamentu \$ 11677.

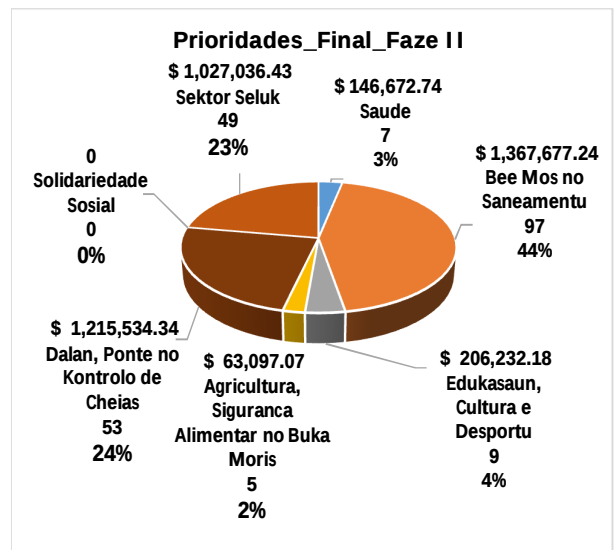

Iha grafiku ita hare katak (Sektor Be'e mo'os no Saneamentu) hetan porsentu maka'ás liu kompara ho sector sira seluk.

- Suku ne'ebe mak kompleta ona Treinamentu modul **A-F** hamutuk 91 suku. Suku ne'ebe mak halao ona Treinamentu ba modul **G-L** mak hanesan (**G=86 suku, H=85 suku, I=36 suku, J=5 suku, K=5 suku, no L=5 suku**).

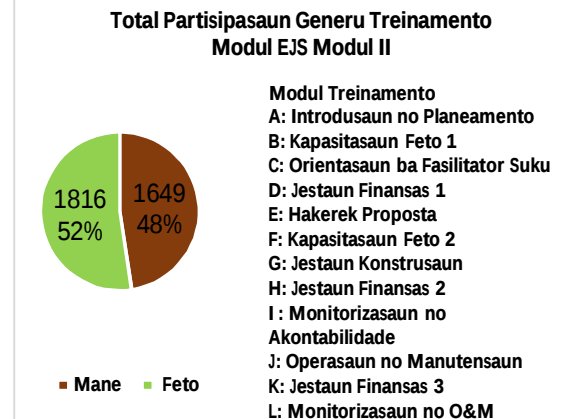

Grafiku iha leten, reprezenta dadus partisipasaun **EJS** iha treinamento ba modul **A- L** iha faze II. Se ita hare ba grafiku iha leten katak, persentagem mane nebe sai membru EJS ho persentagem nebe maka'as kompara ho **EJS** feto.




Komunidade servisu hamutuk tanto feto & mane hodi implementa konstrusaun baleta iha suku nalmeco

FAZE III (202 SUCO): Tama ona ba etapa 4 Formasaun ba Ekipa Jestaun Suku no Fasilitador Suku. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun actividades ba Faze III iha fulan Janeiro 2015 mak hanesan tuir mai ne'e :

- Faze 3 ba iha 13 municipiu, **202** suku simu hotu ona subsidu operacional ne'be kada suco hetan ho valor ne'be mak la hanesan tuir distancia no total populasau.
- Suku ne'be mak realiza ona Treinamentu Modul A hamutuk **148** no suku **54** sei iha prosesu loke konta bankaria suku.
- Modul treinamentu (**B=132 suku, C=186 suku, D=191 suku, E=61 suku, F=34 suku, G=4 suku, H=4 suku**) mak halao ona, no suku balun sei prosesu treinamentu ba modul **A**.
- Informasaun kona ba partisipasaun determina Prioridades suku ba Faze III hanesan Grafiku tuir mai ne'e :

Total_Partisipasaun_Generu_Determina_Prioridade_Suku
Faze III



- Grafiku iha leten, representa total partisipasaun generu Determina Prioridade nivel Suku ba Faze III. Se ita hare ba grafiku iha leten katak, percentagem mane a'as liu.



Ekipa Finansas prepara materi hodi fo treinamentu Modul D kona ba (jestaun finansas 1) ba ekipa jestaun suku iha suco Manelima Distritu Manatuto

FAZE I SIKLUS 2 : Tama ona ba Etapa 2 & 4 Sosializasaun Suku no Aldeia & Formasaun ba Ekipa Jestaun Suku no Fasilitador Suku. Espikasaun klaru kona ba Progresu implementasaun actividades Faze I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Janeiro 2015 maka hanesan tuir mai ne'e :


- Faze faze I siklus II ba iha 13 municipiu, **149** suku simu hotu ona subsidu operacional ne'be kada suco hetan ho valor ne'be mak la hanesan tuir distancia no total populasau.
- Sosializasaun nivel Sub-Distrito, ba Faze I siklus 2 remata ona iha municipio 3 mak hanesan (**Oecusse, Bobonaro no Liquica**).
- Forma Ekipa Jestaun suku no Fasilitador suku ba Faze I Siklus 2 realiza ona iha suku.



Comunidade Suku Mausiga hamutuk ho fasilitador suku komesa forma ona ekipa EJS iha sira nia suku

- Informasaun kona ba grafiku partisipasaun generu sosializasaun ba Faze I Siklus 2 hanesan tuir mai ne'e :

Partisipasaun Generu Sosializasaun Nivel Aldeia
Faze I Ciclos II



Grafiku iha leten kona ba partisipasaun Sosializasaun generu Nivel Aldeia . Provisoriamamente dados nebe foin tama ma'ak iha municipio 3 (**Ainaro, Bobonaro no Liquica**) Hare ba grafiku iha leten Percentagem mane a'as liu compara ho feto.
