



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

Relatório Anual

2019



Sekretariadu PNDS :

E-mail : info@pnlds.gov.tl

Website : www.pnlds.gov.tl



MINISTÉRIO DA
**ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL**



REF: 66/VM-MAE/II/2020

Data : 10 Fevereiro de 2020

Para : Sua Excelência Primeiro Ministro RDTL
Senhor Taur Matan Ruak

Assunto : Relatório PNDS Annual 2019

Excelência Senhor Primeiro Ministro,

Iha biban ida ne'e, hato'o ba Sua Excelência Senhor Primeiro Ministro, Relatório PNDS Annual 2019.

Relatório Refere Kompostu Husi:

1. Rezultadu Implementasaun no Ezekusaun Orsamentu PNDS;
2. Progresu Implementasaun Fatin Halimar;
3. Progresu Implementasaun Programa Retornu Ekonómika Baziku;
4. Progresu Implementasaun Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa.

Ba Sua Excelência Primeiru Ministru nia atensaun hau hato'o obrigado wain



Abílio José Caetano

Vice-Ministro



Konteudu

Akrónimu	1
Sumariu Ezekútivu	2
1. Introdusaun.....	7
1.1 Indrodusaun.....	7
1.2 Objetivu	7
1.3 Enkuadramentu Programa PNDS.....	8
1.4 Rekursu	9
2. Rezultadu Implementasaun PNDS Anual 2019	10
2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Prosesu no Prosedimentu.....	10
2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun Komunitade Sira	15
2.3 Infra-Estrutura ho Kualidade Di'ak, Harií no Mantein ona Husi Komunitade.....	17
2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun	25
2.5 Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosiál (JIS) Integradu iha PNDS.....	29
2.6 Atividade Adisional.....	32
2.6.1 Implementasaun Konstrusaun Fatin Halimar (Playground).....	32
2.6.2 Programa Retornu Ekonómika Baziku (PREB).....	33
2.6.3 Programa Harií Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa.....	34
3. Konklusaun.....	36
Planu 1 ^o Trimestre (Janeiru - Marsu 2020).....	37
4. Anexu	38

Akrónimu

CDD	<i>Community Driven Development</i>
DNIE	Diresaun Nasionál Infraestrutura Edukativa
EHD	Ema ho Defisiensia
EIP	Ekipa Implementasaun Programa
EJS	Ekipa Jestaun Suku
FDCH	Fundus Dezenvolvimentu Capital Humano
FS	Fasilitador Suku
GTTM	Grupu Traballu Tékniku interMinisterial
HANDS	Halimar Aprende no Deskobre Susesu
IT	Informasaun Teknolójia
JIS	Jéneru no Inkluzsaun Sosial
KIEE	Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa
KPA	Komisaun Planeamentu no Akontabilidade
KKT	Komite Kordenasaun Téknika
MAE	Ministériu Administrasaun Estatal
MEJD	Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu
MIS	<i>Management Information System</i> (Sistema Jestaun Informasaun)
PF	Pontu Fokal
PNDS	Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku
PARTISIPA	Parseria hodi Reforsa Dezenvolvimentu iha Munisípiu no Suku
PREB	Programa Retornu Ekonómika Baziku

Sumariu Ezekútiu

Relatóriu ida ne'e hanesan relatóriu Anual kada tinan ne'ebé Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) halo hodi submete ba iha Ministériu Administrasaun Estatál. Relatóriu ida ne'e esplika kona-ba rezultadu ne'ebé mak atinji durante tinan ida nia laran tuir Planu Asaun Anual 2019 PNDS nian. Ba tinan ida ne'e PNDS kontinua implementa iha Suku 452, nune'e mós kompleta implementasaun programa mak hanesan: kontinuaun implementasaun Fatin Halimar 66 no implementasaun Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa (KIEE) 9. Rezultadu implementasaun PNDS xave sira mak hanesan:

Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS

Ba tinan 2019 Governu Timor-Leste liu husi Ministériu Administrasaun Estatál aloka Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ba PNDS liu husi kategória 3 (tolu) hanesan rúbrika Beins no Servisus, Kapital Menor no Transferensia Públiku hamutuk **\$9,972,706.00** no gastu atinji ona **\$9,964,458.05 (99,91%)**. Bele haree esplikasaun detalhe hanesan iha tabela tuir mai:

No	Deskrisaun	Alokasaun	Gastus	Balansu	Ezekusaun
1	Beins no Servisus	\$ 769,600.00	\$ 769,289.05	\$ 310.95	100%
2	Kapital Menor	\$ 83,600.00	\$ 82,400.00	\$ 1,200.00	99%
3	Transferensia Públiku (Subsidu Operasional)	\$ 1,791,195.00	\$ 1,784,458.00	\$ 6,737.00	100%
	Transferensia Públiku (Subsidu Infraestrutura)	\$ 7,328,311.00	\$ 7,328,311.00	\$ -	100%
Total		\$ 9,972,706.00	\$ 9,964,458.05	\$ 8,247.95	99,91%

Fontes Informasaun Husi Finansa MAE.

Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS

Progresu gastus subsídiu operasionál no infraestrutura Suku durante tinan 2019 mak hanesan tuir mai:

Subsídiu Infraestrutura Suku

Subsídiu Infraestrutura Suku						
Faze/Siklu	Transfer	Osan Restu Tinan	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	%
Faze 3 Siklu II	\$ 7,328,311.00	\$ 813,607.17	\$ 8,141,918.17	\$ 1,922,543.52	\$ 5,405,767.48	26%
Total	\$ 7,328,311.00	\$ 813,607.17	\$ 8,141,918.17	\$ 1,922,543.52	\$ 5,405,767.48	26%

Subsídiu Operasional Suku

Subsídiu Operasional Suku						
Faze	Transfer	Osan Restu Tinan Kotuk	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	Ezekusaun
Faze I	\$ 490,250.00	\$ 538,347.70	\$ 1,028,597.70	\$ -	\$ 1,028,597.70	0%
Faze II	\$ 326,237.50	\$ 326,237.50	\$ 652,475.00	\$ -	\$ 652,475.00	0%
Faze III	\$ 974,707.50	\$ 1,044,775.00	\$ 2,019,482.50	\$ 289,281.46	\$ 1,730,201.04	14%
Total	\$ 1,791,195.00	\$ 1,909,360.20	\$ 3,700,555.20	\$ 289,281.46	\$ 3,411,273.74	8%

Progresu Implementasaun

Iha tinan 2019, PNDS fasilita treinamentu ba EJS no Komunitade hamutuk ema nain 26,195 kompostu husi feto nain 10,495 no mane nain 15,700.

Iha tinan 2019, Suku 442 mak hetan alokasaun ba subsídiu operasional no Suku 201 ba subsídiu infraestrutura. Projetu hamutuk 279 ne'ebé implementa iha Faze III siklu 2 iha Suku 202 no progresu fiziku atinji ona porsentu 59. Husi implementasaun ne'e Suku 126 realiza ona enkontru akontabilidade dahuluk no Suku 3 mak realiza enkontru akontabilidade final wainhira ezekeusaun subsídiu atinji ona porsentu 70.

Treinamentu

Iha tinan 2019, PNDS hetan apoiu husi Governu Timor-Leste (GoTL) liu husi *Fundo Desenvolvimento do Capital Humano* (FDCH), Governu Australia (GoA) liu husi DFAT nomós Governu Nova-Zelandia (NZMFAT) hodi suporta atividade treinamentu hodi hasa'e kapasidade no aumenta koñesimentu iha area oioin. Total partisipante ema hamutuk atusualu hitunulu-resin-sia (879).

Fundu	Orsamentu	Ezekuta	%	Benefisiariu	
				Mane	Feto
GoTL (FDCH)	\$ 50,000.00	\$ 47,481.40	95%	127	37
GoA (DFAT)	\$ 19,674.52	\$ 19,674.52	100%	316	139
GoNZ (NZMFAT)	\$ 20,073.50	\$ 20,073.50	100%	184	76
Total	\$ 89,748.02	\$ 87,229.42	98%	627	252

Progresu Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosiál (JIS)

Implementasaun atividade PAAJIS 2018/2019 nian atinji ona porsentu 100. Atividade ne'ebé mak hala'o durante tinan ida ne'e mak hanesan Partisipa iha enkontru ekipa Trabalho Jenéru no Inklusaun Sosiál nian, implementa *Radio Talk Show* iha Munisípiu 7, halibur dados iha Sistema MIS-PNDS, workshop JIS, treinamentu kona-ba JIS, Seminariu no Mini Expo no seluk-seluk tan.

Progresu Implementasaun Programa Retornu Ekonómika Baziku

Iha tinan 2019, PNDS liu husi Programa Retornu Ekonómika Baziku hala'o asesmentu viabilidade ekonómia ba implementasaun atividade sosú ekonómika iha tinan oin. Asesmentu ne foka liu ba prioridade prinsipal haat (4) mak hanesan Uma Bainaka, Mini Merkadu, Armagen Agrikola no Lutu ba To'os. Atividade ne'e konsentra iha Suku sanulu-resin-sia (19) iha Munisípiu hitu (7).

Rezultadu husi asesmentu viabilidade ekonómia ne'e Suku haat (4) mak tama iha kategoria viabilidade no sei hahú halo pilotu iha tinan 2020.

Progresu Implementasaun Konstrusaun Fatin Halimar (Playground)

PNDS kontinua Implementasaun Fatin Halimar ba iha Pre-Eskolar ba etapa daruak hamutuk projetu 66. Progresu husi implementasaun ne'e atinji ona porsentu 59,87.

Progresu Implementasaun Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa

Iha 2019 PNDS hahú implementa hodi harii Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa sia (9) iha Munisípiu hitu (7). Progresu husi implementasaun ne'e atinji ona porsentu 38,83.



Komunidade Suku Caemau Postu Administrativu Turiscái Munisípiu Manufahi Hahú Utiliza ona Be'e Mos Ne'ebé Harii Rasik Husi Komunitade.

1. Introdusaun

1.1 Fundus

Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (2011-2030) identifika prioridades dezenvolvimentu sosiál no ekonómiku nasaun nian. Atu atinji metas planu ida ne'e, Governu Timor-Leste dezenvolve ona programa dezentralizadu ne'ebé foka ba dezenvolvimentu lokal iha nivel comunidade iha Suku no Aldeias.

Planu ne'e mós presiza Governu Timor-Leste atu fornese oportunidades atu hasa'e partisipasaun no involvimentu sidadaun nian iha dezenvolvimentu lokal. Aselera dezenvolvimentu infraestrutur no asesu ba atendimentu públiku importante atu atinji metas dezenvolvimentu planu nian, iha tempu hanesan hamósu benefisius sosial no ekonómiku ne'ebé sei kontribui ba dezenvolvimentu Nasionál ne'ebé di'ak, sustentavel no justu ba ema hotu.

Atu responde ba iha planu estratéjiku ida ne'e, Governu Timor-Leste estabelese Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) hodi bele aselera dezenvolvimentu husi baze. PNDS hanesan programa Nasionál ho durasaun tinan 8 husi 2013-2021 no kada tinan hetan alokasaun subsidiu husi Governu Timor-Leste hodi implementa programa infraestrutur baziku iha Suku hotu.

Iha tinan 2019, PNDS hetan alokasaun ba orsamentu infraestrutur ba Suku 201 iha Faze III siklu 2 nian no operacional ba Suku 442.

Atividade seluk ne'ebé mak PNDS hala'o durante tinan ida ne'e mak hanesan: kontinua harii Fatin Halimar hamutuk 66 ho orsamentu hamutuk **\$270,330.60** ne'ebé apoiu husi Governu Nova Zelandia. Alende ida ne'e mós Governu Nova Zelandia apoiu orsamentu ho montante **\$588,571.19** hodi harii Konstrusaun Infraestrutur Eskola Edukativa hamutuk 9 no prosesu implementasaun tuir Memorandu Entendimentu ne'ebé implementa tuir Manual Operasional PNDS nian.

1.2 Objetivu

PNDS iha objetivu ba implementasaun programa hanesan tuir mai:

META: Hadi'ak Kondisaun Sósio Ekonómiku no Governasaun Lokal ba mane no feto sira iha Suku laran iha Timor-Leste liu husi infraestrutur ne'ebé Komunitade mak jere rasik.

1.3 Enkuadramentu Programa PNDS

META (OBJETIVU JERAL)		
Hadi'ak kondisaun Sósio-Ekonómiku no Governasaun Lokál ba mane no feto sira iha Suku laran iha Timor-Leste liu husi infraestrutura ne'ebé Komunitade mak jere rasik.		
Rezultadu/Atividades	Indikadores de Dezipenhu	Meta Anual 2019
Rezultadu 1: HAMETIN PNDS NIA SISTEMA, PROESU NO PROSEDIMENTU HODI FÓ IMPLEMENTASAUN DIRETA BA KOMUNITADE		
1.1 Halo prosesu transferensia ba subsídiu operacional no infraestrutura ba Suku	Suku 452 simu subsídiu Operasional no Infraestrutura	452* *depende ba alokasaun orsamentu transferensia públiku
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu (40% mak feto)	Fornese treinamentu iha área Tékniku, Sosial no Finansa	Ema nain 90
1.3 Resolve keixa Komunitade nian	Keixa resolve ona	80% resolve
Rezultadu 2: HASA'E PARTISIPASAUN KOMUNITÁRIA NO KAPASIDADE ATU HALO PLANEAMENTU NO JERE INFRAESTRUTURA LOKÁL		
2.1 Kapasitasaun kontinua ba membrus Ekipa Jestaun Suku no Komunitade	# EJS no Komunitade partisipa iha treinamentu	4,972 membru EJS* *depende ba alokasaun orsamentu transferensia públiku
2.2 40% husi feto sira partisipa iha PNDS nia atividade	% Husi feto sira partisipa iha atividade PNDS	40%
Rezultadu 3: INFRAESTRUTURA HO KUALIDADE DI'AK HARI'I NO MANTEIN ONA HUSI KOMUNITADE SIRA		
3.1 Monitorizasaun no supervisaun regular ba projetu PNDS	% Husi infraestrutura baziku iha qualidade Tékniku	80% projetu PNDS atinji qualidade di'ak padraun Tékniku PNDS
3.2 Halo visita terenu ba projetu iha Suku	# Suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	452 Suku monitorizadu husi ekipa PNDS

Rezultadu 4: PLANEAMENTU, KORDENASAUN NO KOMUNIKASAUN HODI HAMÓSU IMPLEMENTASAUN PROGRAMA NE'EBÉ EFETIVU NO KUALIDADE DI'AK

4.1 Enkontru kordenasaun regular (external) ho seitor relevante	# Enkontru kordenasaun External iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 4
4.2 Enkontru kordenasaun mensal (internal) iha nivel Nasionál & Munisípiu	# Enkontru kordenasaun iha nivel Nasionál no Munisípiu realizadu	Enkontru realiza dala 12

Rezultadu 5: JÉNERU, INKLUZAUN SOSIÁL, AMBIENTE NO DEFISIÊNCIA INTEGRADU IHA PNDS NIA ESTRATÉJIA SIRA, PLANU UNIDADE, DEPARTAMENTU NO INDIVIDUÁL

5.1 Prepara Planu Asaun Anual ba Jéneru no Inklusaun Sosiál (PAAJIS)	Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual
--	----------------------------	-------------

1.4 Rekursu

1.4.1 Finansa

Governu Timor-Leste iha tinan 2019, liu husi Ministériu Administrasaun Estatál aloka Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2019 ba PNDS liu husi rúbrika Beins no Servisus, Transferensia Públiku no Kapital Menor ho montante hamutuk **\$9,972,706.00** no gastu atinji ona **\$9,964,458.05 (99,91%)**. Bele haree espikasaun detalhe kona-ba gastus orsamentu PNDS ba tinan 2019 hanesan iha tabela tuir mai:

No	Deskrisaun	Alokasaun	Gastus	Balansu	Ezekusaun
1	Beins no Servisus	\$ 769,600.00	\$ 769,289.05	\$ 310.95	100%
2	Kapital Menor	\$ 83,600.00	\$ 82,400.00	\$ 1,200.00	99%
3	Transferensia Públiku (Subsidu Operasional)	\$ 1,791,195.00	\$ 1,784,458.00	\$ 6,737.00	100%
	Transferensia Públiku (Subsidu Infraestrutura)	\$ 7,328,311.00	\$ 7,328,311.00	\$ -	100%
Total		\$ 9,972,706.00	\$ 9,964,458.05	\$ 8,247.95	99,91%

Fontes Informasaun Husi Finansa MAE.

2. Resultadu Implementasaun PNDS Anual 2019

PNDS iha resultadu prinsipál 5 (haree anexu 2) ne'ebé mak presija atinji liu husi atividade sira ne'ebé mak defini husi programa. Tuir mai espikasau detalhe kona-ba resultadu implementasaun husi fulan Janeiru - Dezembru 2019, tuir Planu Asaun Anual PNDS 2019.

2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Progresu no Prosedimentu

Atividade / Indikador	Metas Anual	Resultadu 2019
1.1 Suku 452 simu subsídiu Operasional no Infraestrutura	452	Suku 442 simu transferensia subsídiu operacional no Suku 201 simu transferensia subsídiu infraestrutura
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu	90	Ema 879 ne'ebé mak hetan treinamentu
1.3 Keixa rezolve ona	80% rezolve	- Rejista keixa 6; - Kontinua halo monitorizasaun ba keixa husi tinan kotuk

Atividade 1.1: Alokasaun Subsídiu Suku

Iha tinan 2019, PNDS hetan alokasaun ba subsídiu Suku ho montante hamutuk **\$9,566,590.00**. Husi alokasaun orsamentu ne'e, Suku 442 mak hetan subsídiu operacional ho montante **\$1,791,195.00** no Subsídiu Infraestrutura ba Suku 201 iha Faze III siklu 2 ho montante **\$7,328,311.00** hodi implementa tuir projetu sira ne'ebé mak defini ona husi Suku. Progresu gastus subsídiu operacional no infraestrutura iha Suku hanesan iha detalhe informasaun tuir mai:
Subsídiu Infraestrutura:

Subsídiu Infraestutura Suku						
Faze/Siklu	Transfer	Osan Restu Tinan	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	%
Faze 3 Siklu II	\$ 7,328,311.00	\$ 813,607.17	\$ 8,141,918.17	\$ 1,922,543.52	\$ 5,405,767.48	26%
Total	\$ 7,328,311.00	\$ 813,607.17	\$ 8,141,918.17	\$ 1,922,543.52	\$ 5,405,767.48	26%

Subsídium Operasional:

Subsídium Operasional Suku						
Faze	Transfer	Osan Restu Tinan Kotuk	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	Ezekusaun
Faze I	\$ 490,250.00	\$ 538,347.70	\$ 1,028,597.70	\$ -	\$ 1,028,597.70	0%
Faze II	\$ 326,237.50	\$ 326,237.50	\$ 652,475.00	\$ -	\$ 652,475.00	0%
Faze III	\$ 974,707.50	\$ 1,044,775.00	\$ 2,019,482.50	\$ 289,281.46	\$ 1,730,201.04	14%
Total	\$ 1,791,195.00	\$ 1,909,360.20	\$ 3,700,555.20	\$ 289,281.46	\$ 3,411,273.74	8%

Haktuir tabela rua iha leten, progresu gastu ezekusaun subsidiu operasional no infraestrutur iha Suku ho porsentu ne'eb'e sei ki'ik. Ho razaun, alende Ekipa Jestaun Suku ne'ebé foin re-eleitu, Ekipa Jestaun Suku sira sei halo preparasaun molok hahú implementaun mak hanesan treinamentu no kapasitasaun husi Fasilitador PNDS hodi nune'e EJS bele maneja orsamentu Suku no garante qualidade serbisu iha implementasaun iha Suku.

Iha parte seluk, subsidiu operasional Suku iha Faze I no II seidaun iha ezekusaun, ho razaun katak Suku seidaun hetan alokasaun subsidiu infraestrutur iha tinan ida ne'e.

Atividade 1.2: Treinamentu

Iha tinan 2019, ekipa Rekursu Humanu–Treinamentu PNDS implementa ona atividade treinamentu ne'ebé finansia husi Governu Timor-Leste (GoTL) liu husi *Fundo Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)*, Governu Australia (GoA) liu husi DFAT nomós Governu Nova-Zelandia (NZMFAT) ba Funsionáriu PNDS nivel Nasionál no Munisípiu. Detalle treinamentu ne'ebé finansia husi FDCH, GoA no GoNZ inklui tipu treinamentu bazeia ba Jéneru mak hatudu iha tabela kraik ne'e:

Tipu Treinamentu ba Funsionáriu PNDS ne'ebé Finansia husi Governu Timor-Leste, Governu Australia no Governu Nova-Zelandia iha fulan Janeiru - Dezembro 2019				
Deskrisaun	GoTL (FDCH)	GoA (DFAT)	GoNZ (NZMFAT)	Total
#Treinamentu ne'ebé kobre	5	4	1	10
#Numeru partisipante	164	455	260	879
#Orsamentu Alokadu	\$ 50,000.00	\$ 19,674.52	\$ 20,073.50	\$ 89,748.02
#Gastus	\$ 47,481.40	\$ 19,674.52	\$ 20,073.50	\$87,229.42
#Ezekusaun (%)	95%	100%	100%	97%

Tabela Tipu Treinamemntu Bazeia ba Jéneru:

Deskrisaun	Jeneru			
	M	%	F	%
# Numeru partisipante				
GoTL (FDCH)	127	77%	37	23%
GoA (DFAT)	316	69%	139	31%
GoNZ (NZMFAT)	184	71%	76	29%
Total	627	73%	252	27%

Husi total númeru partisipante 879, porsentu 73 mane no porsentu 27 feto. Iha rezultadu ne'e porsentu feto menus tamba iha tinan 2019 treinamentu ne'ebé finansia husi GoTL (FDCH), GoA (DFAT), GoNZ (NZMFAT) foka liu ba area treinamentu tékniku. Detalle kona-ba tipu treinamentu nebe'e maka finansia husi GoTL, GoA no GoNZ, bele haree iha tabela kraik:

Relatóriu Anual husi Rezultadu Atividade Treinamentu Fulan Janeiru-Dezemburu 2019							
No.	Dezkrisaun atividade	Grup u Alvu	Jéneru		Total	Data Treinamentu	FatinTreinamentu
			M	F			
Fontes Orsamentu husi Governu Timor-Leste (FDCH)							
1	Treinamentu konstrusaun edifisiu eskola (Uma ba Eskola)	Fasilitador Tékniku Postu Administrativu, Enjineru Munisípiu, kontabilista Munisípiu no Xefe departementu edukasaun munispiu.	62	18	80	4-5 Jullu 2019	SENAI-Bekora, Timor-Leste
2	Treinamentu Monitorizasaun no Avaliasaun ba projetu komunitaria	Xefe Departementu PNDS Enjineru Nasionál, Sosiál Nasionál no repzentante ema ho defisiensia	6	2	8	19-23 Agostu 2019	Smile group, Bali-Indonesia
3	Treinamentu Komunikaun Efetivu no Serbisu ekipa foka ba define prioridade Aldeia no Suku inklui prosesu fasilita ekontru akontabilidade final/FAM tuir siklu PNDS.	Fasilitador Postu Administrativu (Tékniku, Finansa, Sosiál) husi Munisípiu Dili no Liquiça)	16	12	28	Faze I	CNEFP-Tibar, Timor-Leste
						7-11 Outobru 2019	
						Faze II	
						14-18 Outobru 2019	
4	Treinamentu Jeneru no Inklusaun	EJS defisiensia, Pontu fokal JIS Nasionál no Munisípiu, ofisial HR-treinamentu, ofisial lojistika.	11	4	15	14-18 Outobru 2019	Bintang Timur, Kupang-Indonesia
5	Treinamentu Tékniku Espesializa	Enjineru Munisípiu, Enjeñeru Nasionál, FST-Enjeñeru no Ofisial DNSA	32	1	33	21-25 Outobru 2019	CNEFP-Tibar, Timor-Leste
Sub-Total			127	37	164		
Fontes Orsamentu husi Governu Australia (DFAT)							
6	Microsoft SQL server data base	Ekipa ICT PNDS no PNDS-SP	8	0	8	8-11 Abril 2019	Fatuhada, Dili
7	Refresher training Nivel Nasionál (Sosiál, Finansa, Tékniku no MIS)	Funsionáriu PNDS Nasionál, ekipa FST programa apoiu PNDS no asesor sira.	60	12	72	9-12 Abril 2019	Salaun enkontru FDCH, Dili
8	Refresher training Nivel Munisípiu (Sosiál, Finansa, Tékniku no MIS) iha 12 Munisípiu no RAEOA	Ekipa PNDS Munisípiu, Postu Administrativu no inklui treinador sira husi Nasionál	210	99	309	23-26 Abril 2019	Iha Munisípiu idak-idak
9	GSI radio talk show iha Munisípiu Ainaro no Manufahi	Pontu fokal JIS Munisípiu Nasionál, EJS no ema ho defisiensia EJS	5	4	9	12 Juni 2019 no 13 Juni 2019	Munisípiu Ainaro no Manufahi
10	Treinamentu kona-ba ekipamentu (tools) ba teste kualidade bee-mós	Enjeñeru PNDS Nasionál no Enjeñeru FST	14	1	15	31 Jullu 2019	STVJ-Comoro, Dili
11	PAAJIS (Planu Asaun Anual Jéneru Inklusaun Sosiál) workshop	Ema ho defisiensia EJS, EJS feto, pontu fokal JIS Nasionál no Munisípiu no asesor JIS.	19	23	42	5-6 Dezemburu 2019	Timor Plaza, Dili
Sub-Total			316	139	455		
Fontes Orsamentu husi Governu Nova Zelandia (HANDS)							
12	Sosiálizasaun no treinamentu Sosiál kona-ba implementasaun Fatin-Halimar (Playground) faze II ba Funsionáriu PNDS iha nivel Nasionál no Munisípiu 12 no RAEOA	DD 12 Munisípiu inklui RAEOA, FSPA no asesor husi PNDS-SP	29	3	32	01 Jullu 2019	Treinamentu iha Nasionál (SENAI-Becora, Dili)
13	Treinamentu Tékniku kona-ba implementasaun fatin-halimar (Playground) faze II ba pesoal tékniku PNDS	Enjeñeru Munisípiu no FST Enjeñeru	39	5	44	02 - 03 Jullu 2019	Treinamentu iha Nasionál (SENAI-Becora, Dili)
14	Treinamentu finansa kona-ba implementasaun Fatin-Halimar (Playground) faze II ba pesoal finansa PNDS	Kontabilista Nasionál no Kontabilista Munisípiu	19	15	34	02 - 03 Jullu 2019	Treinamentu iha Nasionál (SENAI-Becora, Dili)
15	Treinamentu (Sosial, Finansa, Tékniku) kona-ba implementasaun Fatin-Halimar (Playground) faze II	Funsionáriu PNDS Fasilitador Postu Administrativu (Tékniku, Finansa no Sosiál)	97	53	150	08-12 Jullu 2019	Iha Munisípiu ida-idak
Sub-Total			184	76	260		
Total			627	252	879		



Treinamento Kona-ba Komunikasaun Efetivu no Servisu Ekipa ba Funsionáriu Postu Administrativu.

Atividade 1.3: Rejistu no Rezolve Keixa

Durante 2019 Ekipa Sistema Responde Keixa (SRK) iha Sekretariadu PNDS Nasionál simu no rejista keixa hamutuk 6. Husi keixa hiraq ne'e halo ona verifikasaun tuir Mini Matadalan Sistema Responde Keixa (SRK), iha keixa 5 la os kazu no keixa 1 kontra regras no prosedementu PNDS nian.

Alende ida ne'e, PNDS mós kontinua monitoriza keixa 2 iha Tinan 2015 no 2017 ho kategoria fraude iha Munisípiu Baucau ne'ebé nia prosesu sei lao hela. PNDS mós konklui ona selu fila osan ba fraude ne'ebé akontese iha Suku Ritabou Postu Administrativo Maliana Munisípiu Bobonaro ne'ebé durante ne'e arkiva.

Iha parte seluk, Ekipa Jestaun Keixa serbisu hamutuk hodi kontinua halo monitorizasaun no haree kona-ba sistema rejistu keixa ne'ebé mak estabelese ona.

Sistema Jestaun Informasaun (MIS)


PNDS liu husi kontabilista, enjeñeru no ofisiál MIS iha nivel Nasionál, Munisípiu 12 no RAEOA hamutuk ema nain 60 mak hatama dados iha Sistema Jestaun Informasaun kona-ba progresu fíziku, finansa no partisipasaun Komunitade husi atividade PNDS. PNDS Nasionál halo atualizasaun kona-ba sistema utilizasaun dados no haree kona-ba rezultadu hodi produs relatório.

2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun Komunitade Sira

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu 2019
2.1 # Estrutura EJS no Komunitade partisipa iha treinamentu	4,972	26,195 (Feto = 10,495, Mane = 15,700) mak partisipa iha treinamentu.
2.2 % husi feto sira partisipa iha atividade PNDS	40%	40% (Feto 10,495) partisipa iha atividade PNDS

Atividade 2.1: Kapasitasaun ba Ekipa Jestaun Suku no Komunitade

Durante tinan 2019 fasilitador PNDS fo treinamentu ba membru Ekipa Jestaun Suku no Komunitade iha Faze III Siklu 2. Treinamentu ne'e hala'o atu aumenta kapasidade EJS ninia iha área Planeamentu, Kapasitasaun Feto, Jestaun Finaseira, Konstrusaun Projetu, Monitorizasaun, Operasaun no Manutensaun. Treinamentu ne'e hetan partisipa husi EJS ema 7,973 (Feto = 3,279, Mane = 4,694) no Komunitade ema 18,222 (Feto = 7,216, Mane = 11,006). Tuir mai detalhe informasaun kona-ba EJS, Komunitade no Suku hetan kapasitasaun:

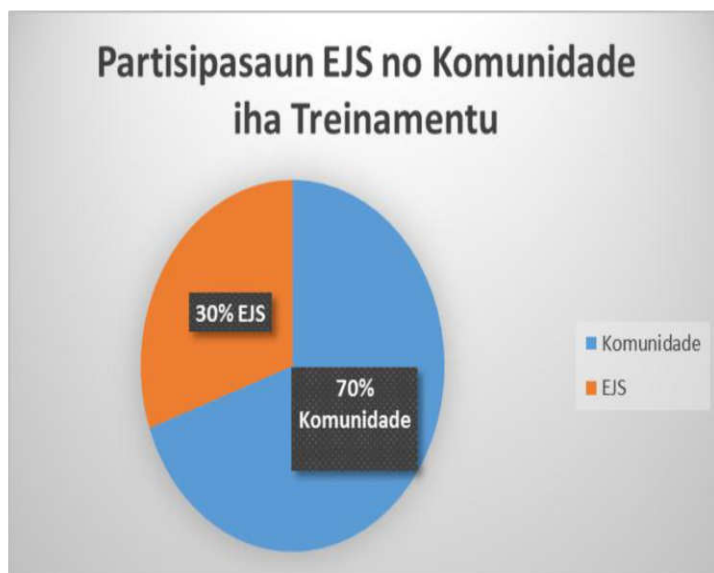

Modul Treinamentu

- A : Introdusaun no Planeamentu; Suku 139
- B : Kapasitasaun Feto 1; Suku 138
- C : Orientasaun ba Fasilitador Suku; Suku 151
- D : Jestaun Finansas 1; Suku 1198
- E : Hakerek Proposta; Suku 191
- F : Kapasitasaun Feto 2; 130
- G : Jestaun Konstrusaun; Suku 173
- H : Jestaun Finansas 2; Suku 184
- I : Monitorizasaun no Akontabilidade; Suku 107
- J : Operasaun no Manutensaun; Suku 12
- K : Jestaun Finansas 3; Suku 12
- L : Monitorizasaun no O&M; Suku 0

Fontes: Sistema Jestaun Informasaun (MIS) PNDS, 7 janeiru 2020.



Ekpa Jestaun Suku no Komunitade iha Suku Beneufe, Banafi, Lelaufe, Suniufe no Usitaco, Postu Administrativu Nitibe RAEOA Hetan Treinamentu ne'ebé Fasilita Husi Kontabilista Munisípiu RAEOA.

2.2 Partisipasaun Feto iha Atividade PNDS

Partisipasaun Komunitade no Ekpa Jestaun Suku hamutuk ema nain 26,195 ne'ebé mak partisipa iha atividade PNDS iha nivel Suku. Feto hamutuk 10,495 ka porsentu haatnulu (40%) mak partisipa iha atividade ne'e liu-liu atividade implementasaun konstrusaun iha Suku.



Feto Partisipa iha Atividade Konstrusaun Loke Estrada Lokal iha Suku Matorec Postu Administrasaun Turiscail Munisípiu Manufahi.

2.3 Infraestrutura ho Kualidade Di'ak, Harii no Mantein ona Husi Komunitade

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu 2019
3.1 Suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	452 Suku	Halo monitorizasaun ba Suku 279
3.2 % husi infraestrutura baziku iha kualidade Tékniku	80%	Lista projetu final Faze III Siklu 2 hamutuk 279 projetu

Atividade 3.1: Monitorizasaun no Supervizaun ba Projetu PNDS

Ekipa PNDS nivel Munisípiu no Nasionál kontinua halo monitorizasaun no mós supervizaun ba Ekipa Jestaun Suku iha Suku 202 iha Faze III siklu 2, Suku 58 ba projetu Fatin Halimar no Suku 9 ba Konstrusaun Infraestrutura Escola Edukativa. Tuir mai rezultadu husi monitorizasaun no supervizaun ne'e hala'o ona iha Suku:

- **Primeira Pedra**



Lansamentu Primeira Pedra Irigasaun Be'e Ne'ebé Oficialmente lansa husi Diretora Nasional ST-PNDS, Dulce Guterres Junior akompañia husi Administrador Postu Nitibe, Maunuel Tolan, Chefe Suku Beneufe, Marco Col, iha Aldeia Citrana, Suku Beneufe, Postu Administrativu Nitibe, Rejiaun Administrativu Ambenu Oecusse/RAEOA.

Lansamentu primeira pedra irigasaun be'e ne'ebé Oficialmente lansa husi Diretora Nasional ST-PNDS, Dulce Guterres Junior akompañia husi Administrador Postu Nitibe, Maunuel Tolan, Chefe Suku Beneufe, iha Aldeia Citrana, Suku Beneufe, Postu Administrativu Nitibe, Rejiaun Administrativu Ambenu Oecusse/RAEOA.

Objetivu husi lansamentu primeira pedra projetu ida ne'ebe propoin husi Komunidade rasik hodi fasilita Komunidade hasa'e rendementu ekonómia ba dezvoltamentu Nasionál iha Suku.

Ho esperansa bo'ot ba konstrusaun irigasaun ne'e bele hamoris ekonomikamente moris Komunidade nia ne'ebé maioria moris ho vida agrikultura ho orsamentu hamutuk US\$ 41,000 ho nia naruk kilometre 1 ne'ebé mak fornese be'e ba natar hamutuk hektares 5 ho total Komunidade ne'ebé hela besik hamutuk 50 resin xefe da familia mak sai benifisiariu ba irigasaun ne'e.

• Suku Vizita

Atividade Suku vizita malu hanesan forum ida atu bele mantein ligasaun entre Suku hodi aprende no kompara esperiênsia implementasaun atividade ne'ebé ligadu ho dezenvolvimentu iha Suku sira iha baze no atividade ne'e nudar pasu importante hodi bele kria lasu amizade.

Atividade Suku vizita ne'ebé hala'o iha Suku Lalawa, Postu Administrativu Tilomar Munisípiu Covalima ho objetivu prinsipál mak atu partisipante sira bele aprende moris agrikola ne'ebé lao ona iha Suku Lalawa Munisípiu Covalima hafoin hetan apoiu irigasaun husi programa PNDS alende ne'e fahe mós esperensia ba malu hodi bele implementa iha ida-ida nia Suku.

Liu husi programa Suku vizita malu ne'e agrikultur sira bele aprende husi prosesu planemeantu oinsá atu harii grupu potenciál agrikultura no merkadória no fahe esperensia ba malu kona-ba saida mak di'ak iha Suku Lalawa no hodi aprende buat ne'ebé di'ak hodi lori ba sira nia Suku hodi bele implementa iha sira nia Suku.

Programa Suku Vizita ba malu ne'e partisipante sira mai husi Munisípiu lima, maka hanesan Munisípiu Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera no Manufahi, representante husi Administrador Munisípiu Covalima, representante Diretora PNDS Nasional, Diretor Delegasaun Munisípiu Lima, Pontu Fokal MAE, Pontu Fokal Munisípiu Lima inklui ekipa PNDS nomós Field Support Team husi Programa PARTISIPA. Atividade ne'e involve representante EJS feto nain rua kada Munisípiu, Pontu Fokal Jéneru Inkluzauin Sosiál.



Representante husi Administrador Munisípiu Covalima, Representante Diretora PNDS Nasional no Pontu Fokal MAE ofisialmente Loke Enkontru ba Atividade Suku Vizita iha Salaun Administrsaun Munisípiu Covalima.




Projeto Irigasaun iha Suku Lalawa Ne'ebé fo Impaktu Ekonomia ba Komunitade Hodi Hasa'e Rendimentu Familia.

Atividade 3.2: Qualidade Técnica Projeto PNDS

Progresso Físico

Atualizasaun informasaun ba implementasaun no progresu liu husi Sistema Jestaun Informasaun (MIS) ne'eb'e hala'o iha Suku iha tinan 2019, hatudu katak Projeto husi Komunitade ba iha implementasaun Faze III siklu 2 hamutuk projetu 279. Projeto 279 ne'e hahú implementa husi Komunitade iha fulan Jullu 2019 iha Suku 202 no progresu fíziku atinji ona porsentu 59.

Tuir mai gráfiku progresu kategória Munisípiu kona-ba progresu fíziku iha Munisípiu 12 no RAEOA:

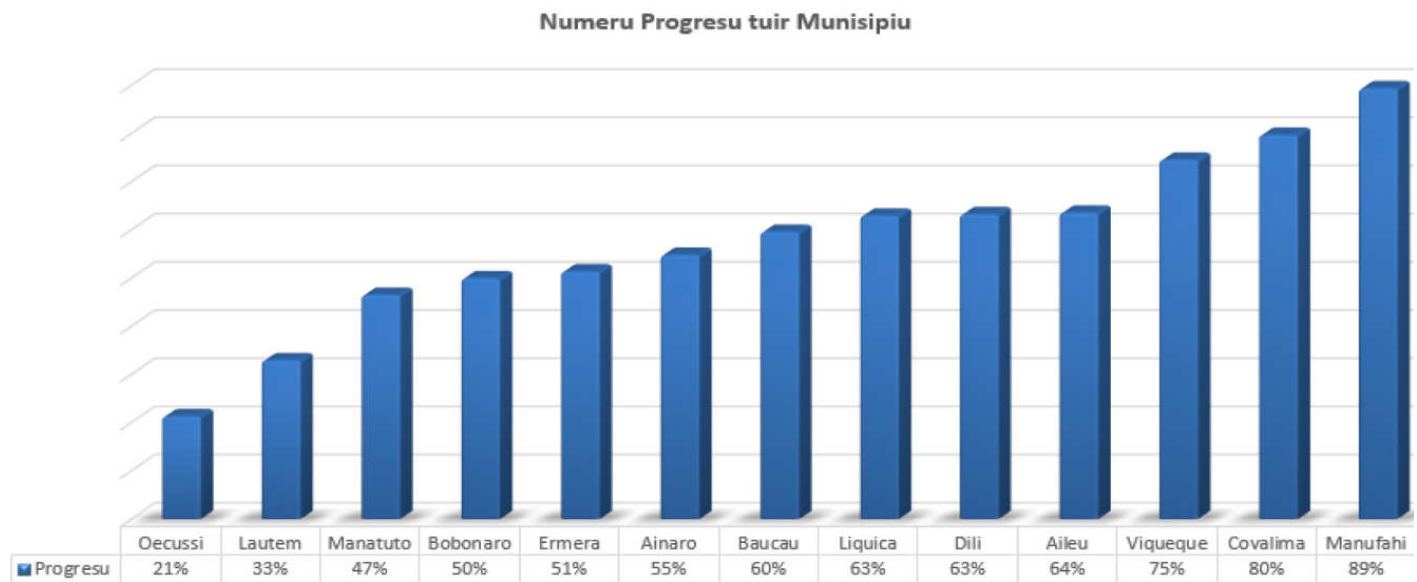

Fontes: Sistema Jestaun Informasaun (MIS) PNDS, 7 Janeiro 2020.

Husi gráfiku ne'e hatudu katak Munisípiu Manufahi mak progresu fíziku konstrusaun atinji ona porsentu 89 no RAEOA mak nia progresu fíziku foin atinji porsentu 21. Munisípiu seluk atinji ona ba 30 ba leten.



Progresu Fiziku ba Projetu Rehabilitasaun Estrada Rabat Beton iha Suku Fahiria, Postu Administrativu Aileu Vila, Munisípiu Aileu.



Progresu Fíziku Konstrusaun Sala Merendar Eskolar iha Suku Aitutu, Postu Administrativu Maubisse Munisípiu Ainaro.

- **Enkontru Akontabilidade Primeiru Ezekusaun husi Komunitade**

Komunitade hahú realiza enkontru akontabilidade dahuluk ba ezekeusaun subsídiu fundu infraestrutura ne'ebé mak Ekipa Jestaun Suku sira maneja hodi realiza implementasaun konstrusaun iha Suku. Ba implementasaun Faze III siklu 2, total Suku 126 mak realiza ona sira nia enkontru akontabilidade ba dahuluk.

Partisipasaun husi Komunitade no EJS masimu tebes no Komunitade sente sai nain ba projektu ne'eb'e mak harii ona iha sira nia Suku. Komunitade no EJS hamutuk 4,888 mak partisipa iha atividade ne'e, feto ema 1,705 no mane ema 3,183.



Kontabilista Nasionál, Kontabilista Munisípiu, Asesor Finansa PARTISIPA, FFPA Halo Sertifikasaun Final iha Parte Finansa iha Suku Hera, Postu Administrativu Cristo Rei, Munisípiu Dili Molok Hala'o Enkontru Akontabilidade Final 100%.

2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun

Atividade / Indikator	Metas Anual	Rezultadu 2019
4.1 # Enkontru kordenasaun External iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 3	2 (Audensia ho Primeiru Ministru, Sekretariu Rejiaun RAE OA)
4.2 # Enkontru kordenasaun Internal iha nivel Nasionál no Munisípiu realizadu	Enkontru realiza dala 4	5 (Enkontru kordenasaun Nasionál no enkontru nivel Munisípiu)

Atividade 4.1:

- **Audensia Primeiru Ministru ho PNDS**

Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior akompaña Vice-Ministru Administrasaun Estatal Abílio José Caetano hala'o sorumutu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, Objetivu husi sorumutu ne'e atu rona no simu orientasaun direita husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak kona-ba inundasaun ahi-han plantasaun inklui uma Komunitade iha Munisípiu hat mak hanesan Munisípiu Liquica, Ermera, Aileu no Bobonaro nune'e mós simu orientasaun hodi prepara nafatin orsamentu ne'ebé tama ona ba planu OJE 2020 nia ho orsamentu husi PNDS ne'ebé maka ejekuta ona durante 2019 ate agora.

Asaun konkreta ne'ebé Ministériu toma atensaun maka orienta ona ekipa hodi foti dados kona-ba insidiu ne'ebé akontese iha Munisípiu hat ne'e. Alende ne'e ko'alia moós kona-ba planu orsamentu tinan fiskal 2020 husi Ministériu nian ne'ebé sei harii uma kbiit la'ek iha teritoriu tomak, planu ba harii uma kbiit la'ek ne'e enkaisa iha orsamentu PNDS nian ba tinan 2020.



Primeiru Ministru RDTL, Rona Apresentasaun Konaba Uma Kbi'it Laek Husi Ekipa MAE Ne'ebé Kompostu Husi Vice-Ministru MAE, Diretor Geral Dezentralizasaun Administrativa, Diretora Nasonal PNDS, Xefe Departamentu PNDS no Asesor sira.

- **Enkontru PNDS ho Sekretáriu Rejiaun RAOEA**

Sekretariado Tékniku PNDS realiza enkontru ho Sr. Regio Servantes da Cruz Salu nudar Sekretariu Regional Agrikultura no Dezenvolvimentu rural, ne'ebé representa Prezidenti Autoridade RAOEA hamutuk ho Xefe Suku 18 husi Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse Ambeno iha Pante Makasar, Ambeno. Objektivu husi Enkontru ne'e atu fahe informasaun ba Autoridade RAOEA no Xefe Suku foun sira hodi apar di'ak metas no programa PNDS ne'ebe implementasaun iha teritoriu Timor-Leste.



Sekretariu Regional no Dezenvolvimentu Rural Hala'o Intervensaun no Loke Avertura iha Enkontru Sosializa Mata Dalan Implementasaun PNDS iha RAOEA, Oecusse/Ambeno.

Atividade 4.2:

- Enkontru Koordenasaun Internal



Vice-Ministru Administrasaun Estatal, Diretora Nasionál PNDS, Chefe Unidade Operasional, Diretores Delegasaun PNDS Munisípiu 12 no RAEOA, Asesores no Funsionáriu PNDS Hala'o Enkontru Kordenasaun PNDS Nivel Nasionál iha Salaun Catedral, Munisípiu Dili.

Atu hametin liu tan liña kordenasaun entre funsionáriu PNDS, Sekretariadu Tékniku Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) realiza enkontru kordenasaun iha salaun Catedral, Munisípiu Dili. Vice-Ministru Administrasaun Estatal Abílio José Caetano oficialmente loke enkontru kordenasaun Nasionál PNDS hodi kongratula funsionariu PNDS tanba hatudu prestasaun serbisu ne'ebé a'as hodi hetan konfiansa husi nasaun doadores. Objetivu husi enkontru koordenasaun ne'e mak atu bele kordena di'ak liu tan serbisu hotu

ne'ebé ligadu ho implementasaun rutina programa PNDS nian liu-liu foka ba implementasaun Faze III siklu 2 ne'ebé sei implementa iha Suku 202 iha territóriu Timor-Leste. Alende diskute kona-ba progresu implementasaun projetu PNDS nian iha enkontru ne'e mós hatu'o progresu implementasaun konstrusaun Eskola Edukativa 9 inklui Fatin Halimar hamutuk 66.

Enkontru ne'e hetan partisipasaun husi representante Diretora Sekretariadu Tékniku PNDS, representante Administrador Postu Hato-Builico, Coordenador PNDS husi Munisípiu 12 no RAOEA, Xefe Unidade, Xefe Departamentu, Funsionáriu PNDS Nasionál, Assessor Nasionál no Internasionál nomós Field Support Team (FST) husi Programa PARTISIPA ne'ebé durante ne'e fo apoiu ba implementasaun Programa PNDS.

2.5 Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosiál (JIS) Integradu iha PNDS

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu 2019
5.1 Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual	100% husi atividade iha Planu Asaun Anual JIS 2018-2019 implementa ona

Atividade 5.1: Planu Asaun Anual Jéneru no Inklusaun Sosial (JIS)

- Workshop JIS**

ST-PNDS realiza Workshop ba Pontu Fokal Jéneru Inklusaun Sosial (JIS) hodi reeve Planu Asaun Anual ba Tinan 2020-2021. Objetivu husi workshop ne'e atu akumula hanoin sira hotu ne'ebé mak pontu fokal JIS sira infrenta atu reeve Planu Asaun Anual JIS nia ne'ebé mak envolve Mane, Feto no Ema ho Defisiensi (EHD) atu sai servidor ba Estadu no Governu ne'ebé di'ak liu husi programa PNDS hodi servi Komunitade iha Suku no Aldeia.

Workshop ba pontu fokal Jéneru Inklusaun Sosial JIS ne'ebé mak participa husi Diretora Nasional ST-PNDS, Team Leader PARTISIPA, Xefe Unidade, Xefe Departamentu, Presidente KPA, Tezoreira EIP, Ema ho Defisiensi, Pontu Fokal JIS (FSPA), Pontu Fokal JIS (MIS), Oficial Sosial Nasional, FST-FC no Assesor Sosiál, realiza iha salaun enkontru Orchid Room Restaurant Timor-Plaza, Dili



Diretora Nacional ST-PNDS, Team Leader PARTISIPA, Xefe Unidade, Xefe Departamentu, Prezidente KPA, Tezoreira EIP, EHD, Pontu Fokal JIS (FSPA), Pontu Fokal JIS (MIS), Oficial Sosiál Nasionál, FST no Assesor Sosiál, Realiza iha Salaun Enkontru Orchid Room Restaurant Timor-Plaza, Dili.

• Treinamentu JIS

Sekretariadu Tékniku PNDS koopera ho Yayasan Bintang Timur Kupang hala'o treinamentu ba EHD ne'ebé hala'o kna'ar nudar EJS iha PNDS. Objetivu prinsipál husi treinamentu ne'e mak atu bele kapasita EHD ne'ebé hala'o kna'ar nudar EJS hodi bele hala'o knar di'ak liu iha implementasaun PNDS, nune'e mós bele fahe esperensia ba maluk deficiente sira kona- ba esperiênsia ne'ebé sira hetan atu bele aplika iha kondisaun moris EHD.

Alende ne'e treinamentu ne'e nudar asaun konkreta hodi bele kompleta aspetu balun ne'ebé EHD sira halo ona iha implementasaun Programa PNDS, espera katak ho treinamentu ne'e sira bele hetan referénsia ruma hodi aplika iha sira nia vida moris nudar humanu. Treinamentu ne'e realiza iha dia 15 – 18 Outubru no partisipa husi EHD nain 6, Diretor Delegasaun (DD) ida, ekipa treinamentu ida, ekipa lojistik ida, Enjineiru ida, PFJIS Munisípiu 3, PFJIS Nasionál 2, FST Sosiál ida no asesor sosiál (hamutuk ema 17: feto 4 mane 13). Iha treinamentu ne'e hetan mos supervizaun husi representante MAE, Ekipa PNDS Nasionál no mós Diretora Nasionál PNDS nian.



Diretora Nasionál PNDS, representante MAE, Diretor Delegasaun Munisípiu, EHD Nain 6, Funsionáriu PNDS, PFJIS, Asesor Sira Hola Parte iha Treinamentu Dezenvolvimentu Inklusivu iha Kupang-Indonesia.

2.6 Atividade Adicional

2.6.1 Soromutu no Sosializasaun Fatin Halimar (Playground)

Iha tinan 2019 liu husi programa “Halimar, Aprende no Deskobre Susesu (HANDS)” ne’ebé foka ba edukasaun pré-eskolár, Sekretariadu Tékniku PNDS hamutuk ho Ministériu Edukasaun Ensinu Pre-Eskolár kontinua implementa no harii Fatin Halimar ba Faze daruak (II). Progresu fiziku atinji ona porsentu 59,87 husi total Fatin Halimar hamutuk 66 ne’ebé implementa iha Suku 58, Postu Administrativu 27 no Munisípiu 13. Tuir mai detalhe informasaun kona-ba progresu kada Munisípiu:

No.	Munisípiu	Postu Administrativu	Suku	Progresu
1	Aileu	1	2	93%
2	Ainaro	3	4	75%
3	Baucau	1	2	71%
4	Bobonaro	3	8	65%
5	Covalima	1	3	99%
6	Dili	1	4	17%
7	Ermera	3	7	72%
8	Lautem	2	3	0%
9	Liquiça	2	4	58%
10	Manufahi	3	10	100%
11	Manatuto	2	2	99%
12	RAEOA	2	5	90%
13	Viqueque	3	4	0%
Total	13	27	58	59,87%

Husi tabela ne’e hatudu katak Munisípiu Manufahi mak atinji ona porsentu 100, Munisípiu Lautem ho Viqueque mak porsentu mamuk no Munisípiu seluk atinji ona porsentu 50 ba leten.



Konstrusaun Fatin Halimar (Playground) iha Suku Selo Vatuboro Postu Maubara Munisipiu Liquiça.

2.6.2 Programa Retornu Ekonómika Baziku (PREB)

Iha tinan 2019, PNDS liu husi Programa Retornu Ekonómika Baziku hala'o estudu análise viabilidade ekonómia ba implementasaun atividade sósiu ekonómika iha tinan oin. Estudu análize ne'e foka liu ba prioridade prinsipal haat (4) mak hanesan Uma Bainaka, Mini Merkadu, Armazen Agrikola no Lutu ba To'os.

Objetivu prinsipal husi atividade ne'e mak atu haree direta viabilidade ekonómia no identifika klean liu tan kona-ba prioridade haat (4) ne'ebé mak relasiona ho infraestrutura bázika ne'ebé PNDS estabelese ona husi Komunidade iha Suku. Atividade ne'e konsentra iha Suku sanulu-resin-sia (19). Rezultadu husi asesmentu viabilidade ekonómia ne'e Suku haat (4) mak tama iha kategoria viabilidade no sei hahú halo pilotu iha tinan 2020 mak hanesan Suku Caemauc ho prioridade uma bainaka, Manumera ho prioridade uma bainaka, Maulau ho prioridade mini merkadu ba produktu agrikola no Suku Souro ho prioridade mini merkadu ba produktu tais.



Diretora PNDS ho Ekipa PREB Halo Enkontru iha Salaun Enkontru PNDS Kona-ba Rezultadu Asesmentu Viabilidade Ekonómia iha Terenu.

2.6.3 Programa Harii Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa (KIEE)

Iha tinan 2019, Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) no Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) asina akordu (MoU) hodi implementa no harii konstrusaun infraestrutura eskola edukativa sia (9) iha Munisípiu hitu (7).

Programa harii Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa ne'e ho objetivu atu harii sala aula foun no rehabilitasaun ba sala sira ne'eb'e mak hetan estragus husi dezastre naturais tuir mekanismu no prosedimentu ne'ebé estabelese ona iha PNDS. Orsamentu ne'ebé alokadu ho montante hamutuk \$588,571.19. Implementasaun Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa ne'e atinji ona porsentu 38,83. Tuir mai detalhe informasaun kona-ba eskola sia (9):

Tabela Progresu implementasaun Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa sia (9) iha Munisípiu hitu (7):

No.	Munisípiu	Postu Administrativu	Suku	Eskola	Progresu
1	Ainaro	Ainaro	Mau-Ulo	EBF Pader	55%
2	Ainaro	Ainaro	Ainaro	EBF Sabago-1 Uma eskola	40%
				EBF Sabago-2 Haris fatin & Sintina	34%
3	Baucau	Laga	Atelari	EBF Daralari	48,14%
4	Baucau	Quelicaí	Maluru	EBF Uaida	66,06%
5	Bobonaro	Bobonaro	Oeleu	EBF Mologen	31%
6	Ermera	Ermera	Poetete	EBF Munisipal Ermera	26%
7	Lautem	Iliomar	Tirilolo	EBF Nautetu	47%
8	Manufahi	Alas	Dotik	EBF Sarin	70,3%
9	Viqueque	Ossu	Ossorua	EBF We Eulaek	35,9%
Total					38,83%



Progresu Harii Konstrusaun Eskola Edukativa iha Suku Oeleu Postu Administrativu Bobonaro Munisípiu Bobonaro.

3. Konkluzan

Tinan 2019 hanesan tinan daneen ba implementasaun PNDS. Ba tinan ida ne'e hanesan periodu kontinuasaun ba implementasaun projetu Faze III Siklu 2 ho total projetu hamutuk 279 liliu iha setor sira mak hanesan Saude, Be'e Mos, Agrikultura, Edukasaun, Ponte no Estrada hodi responde ba nesesidade moris loron-loron Komunitade nian.

Alende ne'e mós PNDS kontinua halo sesmentu no analiza husi rejultadu asesmentu ho parseiru kona-ba Programa Retornu Ekonómiku Báziku, hahú konstrusaun ba Implementasaun Fatin Halimar 66 nomós harii konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa 9 iha Munisípiu 7.

Rezultadu implementasaun PNDS durante periodu ida ne'e konklui katak:

- Gastus Orsamentu Jeral Estadu hamutuk **\$9,964,458.05 (99,91%)**;
- Transferensi subsídiu operacional ba Suku 442 no Suku 201 ba subsídiu infraestrutura;
- Monitorizasaun ba implementasaun projetu PNDS hamutuk 279 iha Suku no progresu fíziku atinji ona porsentu limanulu-resin-sia (59%);
- Fó kapasitasaun ba Funsionáriu PNDS hamutuk 879 feto: 252; Mane: 627. Liu husi Fundo Desenvolvimento Capital Humano (FDCH) hamutuk ema nain 164, Governu Australia (GoA) hamutuk 455 no GoNZ hamutuk ema 260;
- Fó kapasitasaun ba EJS no Komunitade hamutuk 26,195 feto:10,495; Mane: 15,700
- Partisipasaun Feto iha Atividade PNDS hamutuk ema 10,495 mak feto ka porsentu haatnulu-resin-rua (40%);
- Kontinua halo enkontru koordenasaun ho setores relevantes;
- Hala'o enkontru kordenasaun internal no eksternal iha PNDS no parseiru sira;
- Implementasaun Fatin Halimar 66, progresu fíziku atinji porsentu 59,87;
- Hala'o asesmentu viabilidade ekonómia ba implementasaun atividade sosíu ekonómia PNDS iha Programa Retornu Ekonómika Baziku;
- Implementasaun harii Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa sia (9) iha Munisípiu hitu (7) no progresu fíziku atinji ona porsentu 38,83.

Planu 1º Trimestre (Janeiru-Marsu 2020)

Diresaun	Atividade	Janeiru 2020	Fevereiro 2020	Marsu 2020
PNDS	Kontinuasaun Implementasaun konstrusaun projetu PNDS Faze III Siklu 2	X	X	
	Enkontru Akontabilidade Dahuluk	X		
	Sertifikasaun no Enkontru Akontabilidade Final	X	X	X
Fatin Halimar	Implementasaun Projetu Fatin Halimar Fase II ba Unidade 66	X	X	X
	Sertifikasaun no Enkontru Akontabilidade Final	X	X	
Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativu	Implementasaun konstrusaun	X	X	
	Enkontru Akontabilidade Dahuluk	X	X	
	Transferensia Subsidiu Final			
	Sertifikasaun no Enkontru Akontabilidade Final 100%	X	X	
Programa Retornu Ekonómika Baziku (PREB)	Analizasa rezultadu ba atividades asesmentu husi prioridades PREB	X		
	Aprezentasaun rezultadu final ba ST-PNDS Nivel Nasionál	X		
	Prepara planu implementasaun PREB ba ano fiskal 2020	X	X	X

4. Anexu

1. Relatóriu Planu Asaun Anual 2019
2. Lista Projetu PNDS Faze III Siklu 2

Relatório de Desempenho Annual 2019

[illegible]

No.	District	Subdistrict	Suco	Aldeia	Subproject_Name
1	Aileu	Aileu Vila	Fahiria	Sidole	Drenazen - Hada Fatuk
2	Aileu	Aileu Vila	Hoholau	Hatulai	Residencia Pessoal Saude
3	Aileu	Aileu Vila	Hoholau	Saharai	Sintina Públiku ba Sentru Komunitario / Sede Suku
4	Aileu	Aileu Vila	Lausi	Riafusun	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
5	Aileu	Laulara	Cotolau	Lebucucu	Konstrusaun Be'e Mos (Sistema Bomba)
6	Aileu	Laulara	Fatisei	Banro	Estrada Rurais (Estrada Rai)
7	Aileu	Laulara	Madabeno	Desmanhata	Sistema Bee Mos - Bomba
8	Aileu	Laulara	Talitu	Casmantutu	Estrada Rurais (Estrada Rai)
9	Aileu	Laulara	Tohumeta	Acadiro	Estrada Rurais (Estrada Rai)
10	Aileu	Lequidoe	Acubilitoho	Acumata	Estrada Rurais (Estrada Rai)
11	Aileu	Lequidoe	Bereleu	Riamori	Estrada Rurais (Estrada Rai)
12	Aileu	Lequidoe	Betulau	Sarabere	Estrada Rurais (Estrada Rai)
13	Aileu	Lequidoe	Fahiso	Dailorluta	Estrada Rurais (Estrada Rai)
14	Aileu	Lequidoe	Faturilau	Cairema	Residencia Pessoal Saude
15	Aileu	Lequidoe	Faturilau	Lebumeran	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
16	Aileu	Lequidoe	Manucassa	Manutai	Estrada Rurais (Estrada Rai)
17	Aileu	Lequidoe	Namoleso	Aitoin	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
18	Ainara	Maubisse	Aituto	Airaca-Lau	Aula Atendimentu Merenda Eskolar
19	Ainara	Maubisse	Aituto	Lientuto	Aula Atendimentu Merenda Eskolar
20	Ainara	Maubisse	Edi	Talale	Estrada Rurais (Estrada Rai)
21	Ainara	Maubisse	Fatubessi	Rae-Buti-Lau	Estrada Rurais (Estrada Rai)
22	Ainara	Maubisse	Horai-Quic	Gourema	Estrada Rurais (Estrada Rai)
23	Ainara	Maubisse	Manelobas	Hautei	Estrada Rurais (Estrada Rai)
24	Ainara	Maubisse	Manetu	Mau-Lai	Estrada Rurais (Estrada Rai)
25	Ainara	Maubisse	Maubisse	Vila	Sistema Be'e Mos - Gravitasau
26	Ainara	Maubisse	Mau-Lau	Lumo-Luli	Estrada Rurais (Estrada Rai)
27	Ainara	Maubisse	Suco Liurai (Maubisse)	Erbean	Ekstensaun Sala Eskola
28	Baucau	Baguia	Afaloicai	Oqui-Lari	Konstrusaun Bee mos gravitasau
29	Baucau	Baguia	Alaua Craic	Sorucama	Estrada Rai (Estrada Rurais)
30	Baucau	Baguia	Alaua Leten	Ae-Afa	Estrada Rai(Estrada Rurais)
31	Baucau	Baguia	Defauasi	Uarou	Konstrusaun Sistema Bee Mos Gravidade
32	Baucau	Baguia	Defauasi	Defawasi	Bee Mos Sistema Gravidade
33	Baucau	Baguia	Hae Coni	Afalari	Konstrusaun Estrada Rai (Estrada Rurais)
34	Baucau	Baguia	Larisula	Bibidae	Konstrusaun Bee Mos Gravidade
35	Baucau	Baguia	Lavateri	Onortibolari	Estrada Rurais(Estrada Rai)
36	Baucau	Baguia	Oso Huna	Uaicadae	Konstrusaun Estrada Rurais(Estrada Rai)
37	Baucau	Baguia	Samalari (Baguia)	Daralo Craic	Estrada Rai(Estrada Rurais)
38	Baucau	Baguia	Uacala	Baiafa	Estrada Rurais (Estrada Rai)
39	Baucau	Vemassee	Caicua	Caicua	Bee Kanu (Secundaria/kanu distribusaun)Hada Fatuk
40	Baucau	Vemassee	Lolubou	Uaidau	Tanki Bee (Reservatorio)
41	Baucau	Vemassee	Ossouala	Lolinuno	Estrada Rurais(Estrada Rai)
42	Baucau	Vemassee	Ostico	Haunau	Estrada Rurais (Estrada Rai)
43	Baucau	Vemassee	Uaigae	Mota	Moru ba Eskola
44	Baucau	Vemassee	Uato-Lari	Bahalale	Estrada Rurais (Estrada Rai)
45	Baucau	Venilale	Bado-Ho'o	Uatubela Oli	Estrada Rurais (Estrada Rai)
46	Baucau	Venilale	Baha Mori	Uai-Toqui	Sistema Be'e Mos gravitasau
47	Baucau	Venilale	Fatulia	Bahadato	Eskola Infantil/ Pre-Primaria
48	Baucau	Venilale	Uai Oli	Ualae	Sistema Be'e Mos-Bomba (Bomba Submersible)
49	Baucau	Venilale	Uailaha	Caihurulale De Baixo	Sistema Bee Mos Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal
50	Baucau	Venilale	Uatu Haco	Lia Bala	Be'e Kanu (Sekundaria/Kanu Distribusaun)-Hada Fatuk
51	Baucau	Venilale	Uma Ana Ico	Betunau	Sistema Be'e Mos Bomba (Bomba Submersible)
52	Baucau	Venilale	Uma Ana Ulo	Caihula	Sistema Be'e Mos/Bomba (Bomba Submersible)
53	Bobonaro	Atabae	Aidabaleten	Tasi Mean	Estrada Rurais (Estrada Britas)
54	Bobonaro	Atabae	Atabae	Lolocolo	Estrada Rai
55	Bobonaro	Atabae	Hataz	Boloi	Estrada Rurais (Estrada Britas)
56	Bobonaro	Atabae	Rairobo	Faturase	Satan Rai (Bronjong)
57	Bobonaro	Lolotoe	Deudet	Gole	Eskola Infantil/ Pre Primaria
58	Bobonaro	Lolotoe	Gildapil	Gildapil	Estrada Rurais (Estrada Rai)
59	Bobonaro	Lolotoe	Guda	Gudataz	Estrada Rurais (Estrada Rai)
60	Bobonaro	Lolotoe	Lebos	Mapelai	Estrada Rurais (Estrada Rai)
61	Bobonaro	Lolotoe	Lontas	Ozo	Estrada Rurais (Estrada Rai)
62	Bobonaro	Lolotoe	Lupal	Silagolo	Estrada Rurais (Estrada Rai)
63	Bobonaro	Lolotoe	Opa	Mape	Estrada Rurais (Estrada Rai)
64	Bobonaro	Maliana	Holsa	Lolooa	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
65	Bobonaro	Maliana	Lahomea	Guenuha'an	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribusaun) - Hada Fatuk
66	Bobonaro	Maliana	Odomau	Rai Maten	Drenazen (Hada Fatuk)
67	Bobonaro	Maliana	Raifun	Nunutana	Be'e Mos
68	Bobonaro	Maliana	Ritabou	Ritabou	Estrada Rurais (Estrada Rai)
69	Bobonaro	Maliana	Saburai	Tazmasac	Residencia Pessoal Saude
70	Bobonaro	Maliana	Tapo/Memo	Uluatin	(Moru Satan Rai/TPT)-Hada Fatuk
71	Covalima	Fohorem	Dato Rua	Aitos	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
72	Covalima	Fohorem	Dato Tolu	Natardic	Rehabilitasaun Sistema Be'e Mos Gravitasau
73	Covalima	Fohorem	Dato Tolu	Fatuc Cabuar Leten	Aula Atendimentu Merenda Eskolar
74	Covalima	Fohorem	Fohoren	Fatuc Laran	Rehabilitasaun estrada (Estrada Betaun)

No.	District	Subdistrict	Suco	Aldeia	Subproject_Name
75	Covalima	Fohorem	Lactos	Au-Lulic	Konstrusaun Box Culvert
76	Covalima	Fohorem	Lactos	Cacaut	Konstrudasaun Ponte Betaun
77	Covalima	Maucatar	Belecasac	Du'ut	Estrada Rurais (Estrada Britas)
78	Covalima	Maucatar	Holpilat	Lela	Moru ba Eskola
79	Covalima	Maucatar	Matai	Maior/Cunain	Konstrusaun Sistema Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal
80	Covalima	Maucatar	Ogues	Orun	Be'e Mos
81	Covalima	Tilomar	Beiseuc	Maubesi	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
82	Covalima	Tilomar	Beiseuc	Fatuc Metan	Uma ba Profesores
83	Covalima	Tilomar	Casabuac	Tabolo	Sistema Be'e Mos Bomba Submersible / Bomba Sentrifugal
84	Covalima	Tilomar	Casabuac	Coloama	Sistema Be'e Mos Submersible/Bomba Sentrifugal
85	Covalima	Tilomar	Lalaua	Ai Oan	Sistema Be'e Mos Bomba Submersible / Bomba Sentrifugal
86	Covalima	Tilomar	Lalaua	Bitis	Sistema Be'e Mos - Gravitasaun
87	Covalima	Tilomar	Maudemo	Coitau	Sistema Be'e Mos (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)
88	Covalima	Tilomar	Maudemo	Besac Oan	Plat Deker
89	Dili	Cristo Rei	Balibar	Fatu Loda	Rehabilitasaun Sistema Be'e Mos (Grafitasaun)
90	Dili	Cristo Rei	Balibar	Lorico	Konstrusaun Sistema Be'e Mos Grafitasaun
91	Dili	Cristo Rei	Balibar	Fatu Loda	Kostrusaun Moru Satan Rai
92	Dili	Cristo Rei	Balibar	Lacoto	Rehabilitasaun Sistema Be'e Mos (Grafitasaun)
93	Dili	Cristo Rei	Becora	Clac Fuic	Konstrusaun no Rehabilitasaun Valetas
94	Dili	Cristo Rei	Bidau Santana	Manu Mata	Rehabilitasaun Valeta
95	Dili	Cristo Rei	Bidau Santana	Toko Baru	Rehabilitasaun Dalan Betaun
96	Dili	Cristo Rei	Bidau Santana	Toko Baru	Rehabilitasaun Valeta
97	Dili	Cristo Rei	Camea	Caisabe	Konstrusaun Be'e Mos Grafitasaun
98	Dili	Cristo Rei	Camea		Konstrusaun Be'e Mos
99	Dili	Cristo Rei	Culu Hun	Loe Laco	Konstrusaun Dalan Betaun
100	Dili	Cristo Rei	Culu Hun	Loe Laco	Konstrusaun Dalan Betaun
101	Dili	Cristo Rei	Culu Hun	Lao Rai/ Caregatiro	Extesaun Bareira
102	Dili	Cristo Rei	Hera	Acanuno	Konstrusaun Be'e Mos (perfurasaun)
103	Dili	Cristo Rei	Meti Aut	17 De Abril	Kostrusaun Aula Mereda no Dapur
104	Dili	Cristo Rei	Meti Aut	Fatu Cama	Kostrusaun Valeta
105	Dili	Dom Aleixo	Bairo Pite	Rio De Janeiro	Ponte Betaun 1
106	Dili	Dom Aleixo	Bairo Pite	Rio De Janeiro	Ponte Betaun 2
107	Dili	Dom Aleixo	Comoro	4 De Setembro	Konstrusaun Lixu Movei unidade 8
108	Dili	Dom Aleixo	Comoro	Golgota	Konstrusaun Lixu Permanen unidade 8
109	Dili	Dom Aleixo	Fatuhada	Zero II	Konstrusaun sala Klinika Centru Saude
110	Dili	Dom Aleixo	Kampung Alor	Hamahon	Konstrusaun Dalan Paving
111	Dili	Dom Aleixo	Kampung Alor	Anin Fuic (Aitarac La	Rehabilitasaun Drainagen
112	Dili	Dom Aleixo	Kampung Alor	Rai Lacan	Rehabilitasaun Klinik
113	Dili	Metinara	Sabuli	Behoquir	Konstrusaun Sisitema Be'e Mos
114	Dili	Metinara	Sabuli	Sabuli	Konstrusaun no Rehabilitasaun Valeta
115	Dili	Nain Feto	Acadiru Hun	Culuhun De Baixo	Rehabilitasaun Dalan Passeio + Valeta
116	Dili	Nain Feto	Acadiru Hun	Bedic	Konstrusaun Valetas
117	Dili	Nain Feto	Acadiru Hun	Nu'u Badac	Rehabilitasaun Sentina Publiku
118	Dili	Nain Feto	Bemori	Centro	Konstrusaun Fatin Lixu Movei
119	Dili	Nain Feto	Bemori	Baba Liu Rai Leste	Rehabilitasaun Trotoar/ Passeirio
120	Dili	Nain Feto	Bidau Lecidere	Capela	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
121	Dili	Nain Feto	Bidau Lecidere	Lecidere	Konstrusaun Trotoar / Passeio
122	Dili	Nain Feto	Grincenfor	Bairo Formosa	Rehabilitasaun Estrada Betaun
123	Dili	Nain Feto	Grincenfor	Bairo Formosa	Rehabilitasaun Trotoar ou Passeio
124	Dili	Nain Feto	Lahane Oriental	Rai Mean	Sistema Be'e Mos Grafitasaun
125	Dili	Nain Feto	Lahane Oriental	Deposito Penal	Konstrusaun Fatin Lixu unidade 2
126	Dili	Nain Feto	Santa Cruz	7 De Dezembro	Rehabilitasaun Passeio no Konstrusaun Drainazen
127	Dili	Nain Feto	Santa Cruz	Mura	Konstrusaun Sistina Publicu
128	Dili	Nain Feto	Santa Cruz	12 De Novembro	Konstrusaun Dalan Betaun + Valeta
129	Dili	Vera Cruz	Caicoli	De 12 Divino	Rehabilitasaun Estrada Betaun
130	Dili	Vera Cruz	Caicoli	Tahu Laran	Rehabilitasaun Estrada Betaun
131	Dili	Vera Cruz	Colmera	Manu Fuic	Konstrusaun Estrada Betaun
132	Dili	Vera Cruz	Colmera	Rai Nain	Konstrusaun Dalan Betaun
133	Dili	Vera Cruz	Dare	Coalau I	Kostrusaun Be'e Mos Grafitasaun
134	Dili	Vera Cruz	Lahane Ocidental	Paioi	Konstrusaun Fatin Lixu Mobil
135	Dili	Vera Cruz	Lahane Ocidental	Mota Ulun	Konstrusaun Ponte Kiik
136	Dili	Vera Cruz	Mascarenhas	Alto P.M	Konstrusaun Fatin Lixu Mobil
137	Dili	Vera Cruz	Mascarenhas	Baixo Balide	Konstrusaun Drainazen
138	Dili	Vera Cruz	Mascarenhas	Baixo Balide	Konstrusaun Dalan Betaun
139	Dili	Vera Cruz	Motael	Boa Morena	konstrusaun Valeta
140	Dili	Vera Cruz	Motael	Lirio	Konstrusaun Fatin Lixu Mobil
141	Dili	Vera Cruz	Motael	Bee Dalan	Konstrusaun Dalan Paving/ Paseiro
142	Dili	Vera Cruz	Vila Verde	Mate Restu	Kostrusaun Brojong
143	Dili	Vera Cruz	Vila Verde	Lemorai	Kostrusaun Fatin Lixu
144	Dili	Vera Cruz	Vila Verde	1 De Setembro	Konstrusaun Moru Haleu Escola
145	Ermera	Atsabe	Atara	Uabe-Nc	Sistema Bee Mos (Gravitasaun)

No.	District	Subdistrict	Suco	Aldeia	Subproject_Name
146	Ermera	Atsabe	Baboi Craic	Lauabe	Rehabilitasaun no Konstrusaun Eстрада Rurais (Eстрада Rai)
147	Ermera	Atsabe	Baboi Leten	Liabe	Konstrusaun Sistema Be'e Mos (Gravitasaun) - Pakote 1
148	Ermera	Atsabe	Batu Mano	Batu Ero	Konstrusaun Sistema Be'e Mos (Gravitasaun)
149	Ermera	Atsabe	Lacao	Nunumea	Rehabilitasaun Eстрада Rurais (Eстрада betaun)
150	Ermera	Atsabe	Laclo	Aileso	Konstrusaun Sistema Be'e Mos (Gravitasaun)
151	Ermera	Atsabe	Laubono	Sirui / Purogoa	Rehabilitasaun Eстрада Rurais (Eстрада betaun)
152	Ermera	Atsabe	Leimea Leten	Raelia	Konstrusaun Sistema Be'e Mos (Gravitasaun)
153	Ermera	Atsabe	Malabe	Ilal Cora	Konstrusaun Sistema Irigasaun - (Be'e Kanu)
154	Ermera	Atsabe	Obulo	Suriubu	Rehabilitasaun Eстрада Rurais (Eстрада betaun)
155	Ermera	Atsabe	Parami	Asio	Konstrusaun Sistema Be'e Mos (Gravitasaun)
156	Ermera	Atsabe	Tiarlelo	Soilacudu	Konstrusaun Bee Kanu Sekundaria (Kanu distribuissaun) Hada Fatuk
157	Ermera	Ermera	Humboe	Borohei	Eстрада Rurais (Eстрада Betaun)
158	Ermera	Ermera	Ponilala	Sacoco	Eskola Primaria
159	Ermera	Ermera	Talimoro	Nunusua	Eстрада Rurais (Eстрада Betaun)
160	Ermera	Railaco	Deleso	Boeh-Mata	Sintina Publiku ba Eskola
161	Ermera	Railaco	Deleso	Lebubo	Sistema Bee Mos - Gravitasaun
162	Ermera	Railaco	Fatuquero	Caitarahei	Eстрада Rurais (Eстрада Betaun)
163	Ermera	Railaco	Fatuquero	Palimano	(Fatin Lisu Publiku)
164	Ermera	Railaco	Liho	Hi	Ponte Betaun
165	Ermera	Railaco	Liho	Camalraehi	Eстрада Rurais (Eстрада Betaun)
166	Ermera	Railaco	Matata	Colaco	Eстрада Rurais (Eстрада Betaun)
167	Ermera	Railaco	Railaco Craic	Riamori	Eстрада Rurais (Eстрада Betaun)
168	Ermera	Railaco	Railaco Craic	Sobrequeque	Eстрада Rurais (Eстрада Betaun)
169	Ermera	Railaco	Railaco Leten	Colhuinamo	Eстрада Rurais (Eстрада Betaun)
170	Ermera	Railaco	Railaco Leten	Darema	Eстрада Rurais (Eстрада Betaun)
171	Ermera	Railaco	Samalete	Eraulo	Sistema Bee Mos Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal
172	Ermera	Railaco	Samalete	Leborema	Drrenazen - Hada Fatuk
173	Ermera	Railaco	Taraco	Datoleo	Moru ba Eskola
174	Ermera	Railaco	Taraco	Datoleo	Residencia Pessoal Saude
175	Ermera	Railaco	Tocoluli	Tahobote	Eskola Primaria
176	Lautem	Lautem	Baduro	Malailada	Eskola Primaria
177	Lautem	Lautem	Com	Pitileti	Sistema Be'e Mos - Bomba (Submersible)
178	Lautem	Lautem	Daudere	Aelafa	Moru ba Eskola
179	Lautem	Lautem	Euquisi	Barliu	Eskola primaria
180	Lautem	Lautem	Ililai	Titilari	Sistema be'e mos bomba /submersible
181	Lautem	Lautem	Maina 1	Paiahara	Sentru Saude Komunitario
182	Lautem	Lautem	Maina 2	Queduloro	Sistema Bee Mos -gravitasaun
183	Lautem	Lautem	Pairara	Puno	Sentru Saude Komunitario
184	Lautem	Lautem	Parlamento	Laiera	Sistema be'e mos - bomba / submersible
185	Lautem	Lautem	Serelau	Poruvari	Eskola Primaria
186	Lautem	Lospalos	Bauro	Sepelata	Sistema Bee Mos - Gravitasaun
187	Lautem	Lospalos	Bauro	Sepelata	Sistema be'e mos - Bomba
188	Lautem	Lospalos	Bauro	Iralafai	Sistema Bee Mos Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal
189	Lautem	Lospalos	Cacavei	Paihira	Eskola Infantil /Pre-Primaria
190	Lautem	Lospalos	Fuiloro	Lereloho	Ponte Betaun
191	Lautem	Lospalos	Home	Tchenuloro	Sistema Bee Mos Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal
192	Lautem	Lospalos	Leuro	Tcharano	Eстрада Rurais - Eстрада Betaun
193	Lautem	Lospalos	Leuro	Tcharano	Sistema Bee Mos - Gravitasaun
194	Lautem	Lospalos	Lore 1	Otcho-Tchau	Plat Deker
195	Lautem	Lospalos	Lore 1	Otcho-Tchau	Sistema Bee Mos - Bomba (Submersible)
196	Lautem	Lospalos	Lore 2	Nuhalata	Sintina publiku ba sentru komunitario/sede suku
197	Lautem	Lospalos	Lore 2	Haitupuca	Sintina Publiku ba Eskola
198	Lautem	Lospalos	Lore 2	Haitupuca	sala ba Aula
199	Lautem	Lospalos	Muapitine	Malahara	Sistema Bee Mos Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal
200	Lautem	Lospalos	Raça	Raça	Eskola Primaria
201	Lautem	Lospalos	Raça	Raça	Residencia Pessoal Saude
202	Lautem	Lospalos	Souro	Foema'a	Moru ba Eskola
203	Liquica	Bazartete	Fahilebo	Tuhilo Leten	Sistema Bee Moss-Gravitasaun
204	Liquica	Bazartete	Fahilebo	Fatuneso	Sistema Bee Moss-Gravitasaun
205	Liquica	Bazartete	Fatumasi	Bazartete	Escola Primria
206	Liquica	Bazartete	Lauhata	Pissu Leten	sistema Bee Bee mos-Gravitasaun
207	Liquica	Bazartete	Leorema	Baura	Escola Infantil /Pre-Primaria
208	Liquica	Bazartete	Maumeta	Nartutu	Eстрада Rurais(Eстрада Betaun)
209	Liquica	Bazartete	Metagou	Caleulema	Eстрада Rurais(Eстрада Rai)
210	Liquica	Bazartete	Metagou	Metiluli	Eстрада Rurais(Eстрада Rai)
211	Liquica	Bazartete	Motaulun	Mota Icin	Sistema bee mos - Bomba (Bomba Submersible)
212	Liquica	Bazartete	Tibar	Libaulelo	Sistema Bee Moss Gravitasaun
213	Liquica	Bazartete	Ulmera	Neran	Sistema Bee Moss Gravitasaun
214	Liquica	Bazartete	Ulmera	Ermata	Moru ba Eskola
215	Liquica	Liquica	Darulete	Manupatia	Eстрада Rural (Eстрада Betaun)

No.	District	Subdistrict	Suco	Aldeia	Subproject_Name
216	Liquica	Liquiça	Loidahar	Hatululi	Sistema Bee Moss Gravitasaun
217	Liquica	Liquiça	Luculai	Natarae	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
218	Manatuto	Lacló	Hohorai	Hatanaun	Residencia ba Profesores
219	Manatuto	Lacló	Lacumesac	Tahagamu	Eskola Primaria
220	Manatuto	Lacló	Uma Caduac	Ili-Mano	Sistema Beé Mos - Gravitasaun
221	Manatuto	Lacló	Uma Caduac	Condar	Beé Kanu (Secundaria/Kanu Distribuisaun)-Hada Fatuk
222	Manatuto	Lacló	Uma Naruc	Uma Surat	Klinika Maternidade
223	Manatuto	Lacló	Uma Naruc	Bua	Moru ba Eskola
224	Manatuto	Manatuto	Ailili	Belebato	Konstrusaun Bareiras Hada Fatuk
225	Manatuto	Manatuto	Aiteas	Rembor	Drainazen Hada Fatuk
226	Manatuto	Manatuto	Cribas	Athoc	Satan Rai (Bronjong)
227	Manatuto	Manatuto	Cribas	Tuquete	Konstrusaun Drainazen Hada Fatuk
228	Manatuto	Manatuto	Iliheu	I-Un	Drenazen Hada Fatuk
229	Manatuto	Manatuto	Iliheu	I-Un	Drenazen Hada Fatuk
230	Manatuto	Manatuto	Iliheu	Ili-Huli	Satan Rai (Bronjong)
231	Manatuto	Manatuto	Iliheu	I-Un	Drenazen - Hada Fatuk
232	Manatuto	Manatuto	Ma'abat	Soraha	Drenazen - Hada fatuk
233	Manatuto	Manatuto	Ma'abat	Ma'abat	Estrada Rurais (Estrada Britas)
234	Manatuto	Manatuto	Sau	Sau	Denazen - Hada Fatuk
235	Manufahi	Turiscas	Aitemua	Furac Lau	Rehabilitasaun sala eskola (Eskola Primaria)
236	Manufahi	Turiscas	Beremana	Beremana	Konstrusaun sistema Bee moos-Bomba
237	Manufahi	Turiscas	Caimauc	Risso	Rehabilitasaun sistema Bee moos Gravitasaun naruk 928 m
238	Manufahi	Turiscas	Caimauc	Bussacoa	Konstrusaun estrada rurais
239	Manufahi	Turiscas	Fatucalo	Ermori	Sistema bee moos-gravitasaun
240	Manufahi	Turiscas	Fatucalo	Darufu	Sintina publiku
241	Manufahi	Turiscas	Fatucalo	Darufu	Estrada rurais (estrada rai)
242	Manufahi	Turiscas	Foholau	Tarabula	Konstrusaun bareira (tembok penahan)-hada fatuk no plat deker
243	Manufahi	Turiscas	Foholau	Tarabula	Residencia Profesores
244	Manufahi	Turiscas	Lessuata	Ailulimau	sistema bee moos gravitasaun
245	Manufahi	Turiscas	Lessuata	Ailulimau	Konstrusaun estrada rurais (estrada rai)
246	Manufahi	Turiscas	Liurai	Bilimano	sintina publiku ba sentru komunitariu
247	Manufahi	Turiscas	Liurai	Marcoluli	sistema bee moos gravitasaun
248	Manufahi	Turiscas	Manumera	Toilero	estrada lokal (Estrada rai)
249	Manufahi	Turiscas	Manumera	Cotalaulara	moru satan rai (Bronjong)
250	Manufahi	Turiscas	Matorec	Fatu Hei	Estrada lokal
251	Manufahi	Turiscas	Matorec	Orluli	Sintina publiku ba sentru komunitariu
252	Manufahi	Turiscas	Mindelo	Aidila	Reabilitasaun sala eskola
253	Manufahi	Turiscas	Orana	Fatulelo	Reabilitasaun eskola primaria
254	Manufahi	Turiscas	Orana	Fatulelo	konstrusaun bee moos - gravitasaun
255	Oecussi	Nitibe	Banafi	Hautefo	Sistema Be'e Mos - Gravitasaun
256	Oecussi	Nitibe	Beneufe	Manan	Irigasaun (Be'e Kanu Sekundario)
257	Oecussi	Nitibe	Lelaufe	Mahata	Sistema Be'e Mos - Bomba
258	Oecussi	Nitibe	Suniufe	Oelnanoe	Estrada Rurais (Estrada Britas)
259	Oecussi	Nitibe	Usitaco	Fatunababo	Sintina Puliku ba Sede Suku
260	Oecussi	Nitibe	Usitaco	Oamna	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
261	Oecussi	Passabe	Abani	Passabe	Estrada Rai (Estrada Britas)
262	Oecussi	Passabe	Malelat	Malelat	Estrada Rurai (Estrada Rai)
263	Viqueque	Lacluta	Ahic	Ai Lo Oc	Estrada Rurais (Estrada Rai)
264	Viqueque	Lacluta	Dilor	Acadiru Hun	Drainazen - Hada Fatuk
265	Viqueque	Lacluta	Laline	Micradec	Eskola Infantil / Pre Eskolar
266	Viqueque	Lacluta	Uma Tolu	Tali Oan	Residencia Pesoal Saude
267	Viqueque	Lacluta	Uma Tolu	Ai Sucu Nuc	Sistema Beé Mos - Bomba
268	Viqueque	Viqueque	Bahalaraua'in	Caninuc	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
269	Viqueque	Viqueque	Bahalaraua'in	Welaco	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
270	Viqueque	Viqueque	Bibileo	Balideoan	Moru Eskola
271	Viqueque	Viqueque	Caraubalo	Siralari	Sistema Beé Mos - Bomba
272	Viqueque	Viqueque	Caraubalo	Wessa	Sistema Beé Mos - Bomba
273	Viqueque	Viqueque	Caraubalo	Mamulac	Sistema Be'e Mos - Bomba
274	Viqueque	Viqueque	Fatudere	Culale	Moru ba Eskola
275	Viqueque	Viqueque	Luca	Canlor	Estrada Rurais (Estrada Britas)
276	Viqueque	Viqueque	Luca	Uma Boot	Estrada Rurais (Estrada Betaun)
277	Viqueque	Viqueque	Luca	Uma Lor	Posu (Posu Badak)
278	Viqueque	Viqueque	Uai-Mori	Mea-Uai	Sistema Beé Mos - Gravitasaun
279	Viqueque	Viqueque	Uai-Mori	Uatulesu	Sistema Beé Mos - Gravitasaun
280	Viqueque	Viqueque	Uma Quic	Aidac Bein	Rehabilitasaun Escola EBF Tiha-Aitahan - (9 X 23.4)m
281	Viqueque	Viqueque	Uma Uain Craic	Loho	Posu (Posu Badak)
282	Viqueque	Viqueque	Uma Uain Leten	Bahauai	Eskola Infantil / Pre Primaria

