



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)

Ministério da Administração Estatal (MAE)

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS)

Relatório Annual 2015



Rua de : Bedik-Hun
Dili-Timor Leste



PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU

“HAMUTUK ITA DEZENVOLVE NASAUN”

Secretariadu PNDS, Edifício Central do MPIE, Fatuhada Hodi Laran

Dili, Timor Leste. Tel: 331 0980



Hato'o ba :

1. Sua Ex. Cia Ministro Administração Estatal,
2. Sua Ex. Cia Ministro Planeamentu e Investimentu Estratégico,

Ref.No : 52 /PNDS /MPIE/MAE /II/2016

Asunto : Relatoriu annual 2015

Excelencias,

Relasiona ho asuntu mensionadu iha leten,liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio anual 2015 konaba progresu ezekusaun orsamentu no Implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS). Relatoriu ida ne'e hare liu ba progresu gastus subsidiu no implementasaun Faze I, Faze II no Faze III Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku.

Obrigado barak ba iha kolaborasaun no atensaun.

Dili, 2 Fevereiro 2016

Tomas do Rosário Cabral
Vice-Ministro Administração Estatal

Kopia ba :

1. Diretor Jeral Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (DG-ADN),
2. Membrus Grupo Trabalho Tekniku Interministerial
3. Arquivo

Konteudu

Acronimos.....	2
Sumariu Ezekutivu.....	3
Siklus Implementasaun PNDS.....	5
1. Introdusaun.....	6
1.1 Fundu.....	6
1.2 Enkuadrumentu Legais.....	6
1.3 Prinsipius no Objetivu.....	7
1.4 Planu Asaun Anual 2015.....	8
1.5 Rekursu.....	10
1.5.1 Finansa.....	10
1.5.2 Rekursu Humanu.....	11
1.5.3 Kapasitasaun.....	12
2. Rezultadu Implementasaun Programa tuir PAA 2015.....	13
2.1 Orsamentu aprovado ba 442 Suku.....	13
Progresu Ezekusaun Subsidiu Operasional no Infraestrutura (2015).....	13
Progresu Faze II (Suku 91) Gastu Subsidiu Operasional & Infraestrutura (2014).....	14
Progresu Gastus Subsidiu Operasional no Infraestrutura (Faze I orsamentu 2013).....	14
2.2 Estrutura suku komprende sira nia knar no responsabilidade konaba programa.....	15
2.3 Programa implementa bazeia ba matadalan no Infra-estrutura basika konstruidu fo benefisio ba comunidade no iha kualidade tekniku ne'be diak.....	17
Progresu Fiziku.....	18
Kontinuasaun Projeitus Faze I no Faze II.....	18
2.4 Kompleta rekrutamentu no nomeasaun ba pozisaun sira.....	20
2.5 Hametin kordenasaun no komunikasaun iha nivel nasional no sub-nasional	20
2.6 Sistema Jestaun Informasaun no Sistema Jestaun keiza estabelisido.....	21
3. Obstaklus.....	22
4. Konklusaun.....	23
5. Annexos.....	24
Estrutura PNDS.....	25
Lista Projetu.....	26
Infographic.....	35
Planu Asaun Annual 2016.....	41
Planu Global Implementasaun 2016.....	44

Acronimos

MPIE	Ministerio Planeamentu no Investimentu Estratejiku
MAE	Ministerio Administrasaun Estatal
PNDS	Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku
EJS	Ekipa Jestaun Suku
KPA	Komisaun Planeamentu no Akontabilidade
EIP	Ekipa Implementasaun Programa
EOM	Ekipa Operasaun no Manutensaun
FS	Fasilitador Suku
CDD	Community Driven Development
ToT	Traning of Trainer

Sumariu Ezekutivu

Relatoriu ida ne'e hanesan relatóriu anual nebe'e kada tinan PNDS halo hodi submete ba iha Ministeriu MPIE no MAE. Relatoriu ida ne'e esplika konaba rezultadu nebe'e mak atinji durante tinan ida ne'e tuir Planu Asaun Anual 2015.

Partikular husi relatóriu ida ne'e mak atu hatudu rezultadu prinsipál nebe'e mak atinji iha tinan 2015. Rezultadu implementasaun PNDS ba iha relatóriu anual ida ne'e sei kobre rezultadu prinsipál implementasaun jeral (ezekusaun orsamentu no atividades) husi fulan Janeiro – Dezembro 2015 tuir Planu Asaun Anual PNDS. Hanesan tuir mai ne'e:

Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS

Ba tinan ida ne'e Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Planeamentu Investimentu Estratejiku ba tinan 2015 aloka orsamentu ba Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ho montante **\$12,291,000.00** miloens no gastus atinji ona **100%**.

Progresu gastus Subsidiu Operasional no Infraestrutura ba Suku Faze I, II, III no Siklu 2

Faze 1 (149 suku) : Subsidiu operacional gastu ona \$ 449,846.20 ou 50.90% husi total \$ 883,750.00 ba Suco 149 fase I ninia. Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$5,728,485.17** ou **86.39%** husi total **\$6,631,250.00**.

Fase I Siklus 2 (202 suku)

Fase 1 Siklus 2 **\$1,316,758.95** gastu ona **\$478,076.75** ou **36.31%** husi total orsamentu subsidiu operacional neebe mak iha.

Faze 2 (91 suku) : Subsidiu operacional gastu ona **\$436,593.93** ou **81.70%** husi total **\$533,750.00** fundu operacional ba suco 91 iha fase II. Total Subsidiu Infraestrutura ba Suco 91 mak hanesan **\$4,026,250.00** no gastus ona **\$3,520,769.63** ou **87.45%**.

Fase III (202 suku)

Fase 3 Subsidiu husi governu/PNDS hamutuk **\$1,171,000.00** no orsamentu subsidiu nee mak sei restu iha tinan kotuk husi programa Pilotu hamutuk **\$42,768.28**. Total hamutuk orsamentu subsidiu operacional ba fase III **\$1,213,768.28**, iha Fase III subsidiu operacional gastu ona **\$538,749.40** ou **44.39%** husi total **\$1,213,768.28** fundu subsidiu operacional ba suco 202 iha fase III. No Subsidiu infraestrutura **\$8,544,000.00** gasta ona **\$2,759,288.00** ou **31.95%**.

Progressu Fisiku

Progresu fisiku ba faze I husi projeitu hamutuk 335 kompleta ona konstrusaun hamutuk projeitus 335 ho persentagem atinji ona 100%. Projeitu sira ne'e maioria halo ona enkontru akontabilidade final no halo ona inagurasaun no entrega ona ba iha comunidade.


Ba faze II hamutuk 218 projeitu no implementa iha 91 suku nebe'e mak kompletu ona konstrusaun hamutuk projeitus 193 ho persentajem atinji ona 98.39%. Falta projeitus 26 sei iha prosesu konstrusaun. Halo ona enkontru akontabilidade ba 80 Suku.

Faze III hamutuk 386 projeitus no implementa iha 202 Suku. Maioria husi projeitus sira ne'e komesa halo ona konstrusaun no atinji ona 23.75%.

Trainamentu

Ekipa Jestaun Suku no Komunidade kompletu ona modul A-L ba Faze I 149 suku. Faze I partisiapaun EJS : 7884 no komunidade 5233, Faze II kompletu ona mudul A-H ho partisipasaun EJS: 7982 Komunidade : 2306 no Faze III kompletu ona A-H EJS 7056 Komunidade: 6521

Total Partisipasaun Jeneru_Treinamentu_
Modul EJS_no Komunidade_Fazie I-III
2015

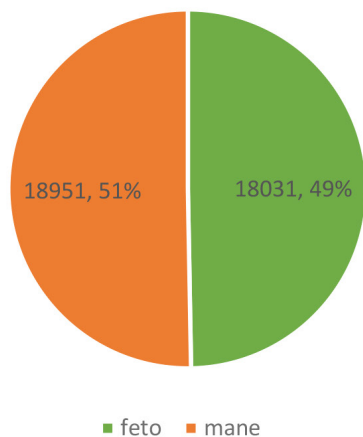


Modul Treinamentu :

- A: Introdusaun no Planeamento
- B: Kapasitasaun Feto 1
- C: Orientasaun ba Fasilitator Suku
- D: Jestaun Finansas 1
- E: Hakerek Proposta
- F: Kapasitasaun Feto 2
- G: Jestaun Konstrusaun
- H: Jestaun Finansas 2
- I : Monitorizasaun no Akontabilidade
- J: Operasaun no Manutensaun
- K: Jestaun Finansas 3
- L: Monitorizasaun no O&M

Funionariu PNDS- tuir formasaun no kapasitasaun hamutuk 214 iha areas mak hanesan englesa, Tekniku, Planeamentu, IT, Komunikasaun nomos halo estudo komparativu ba iha implementasaaun CDD iha Indonesia.

Siklus Implementasaun PNDS

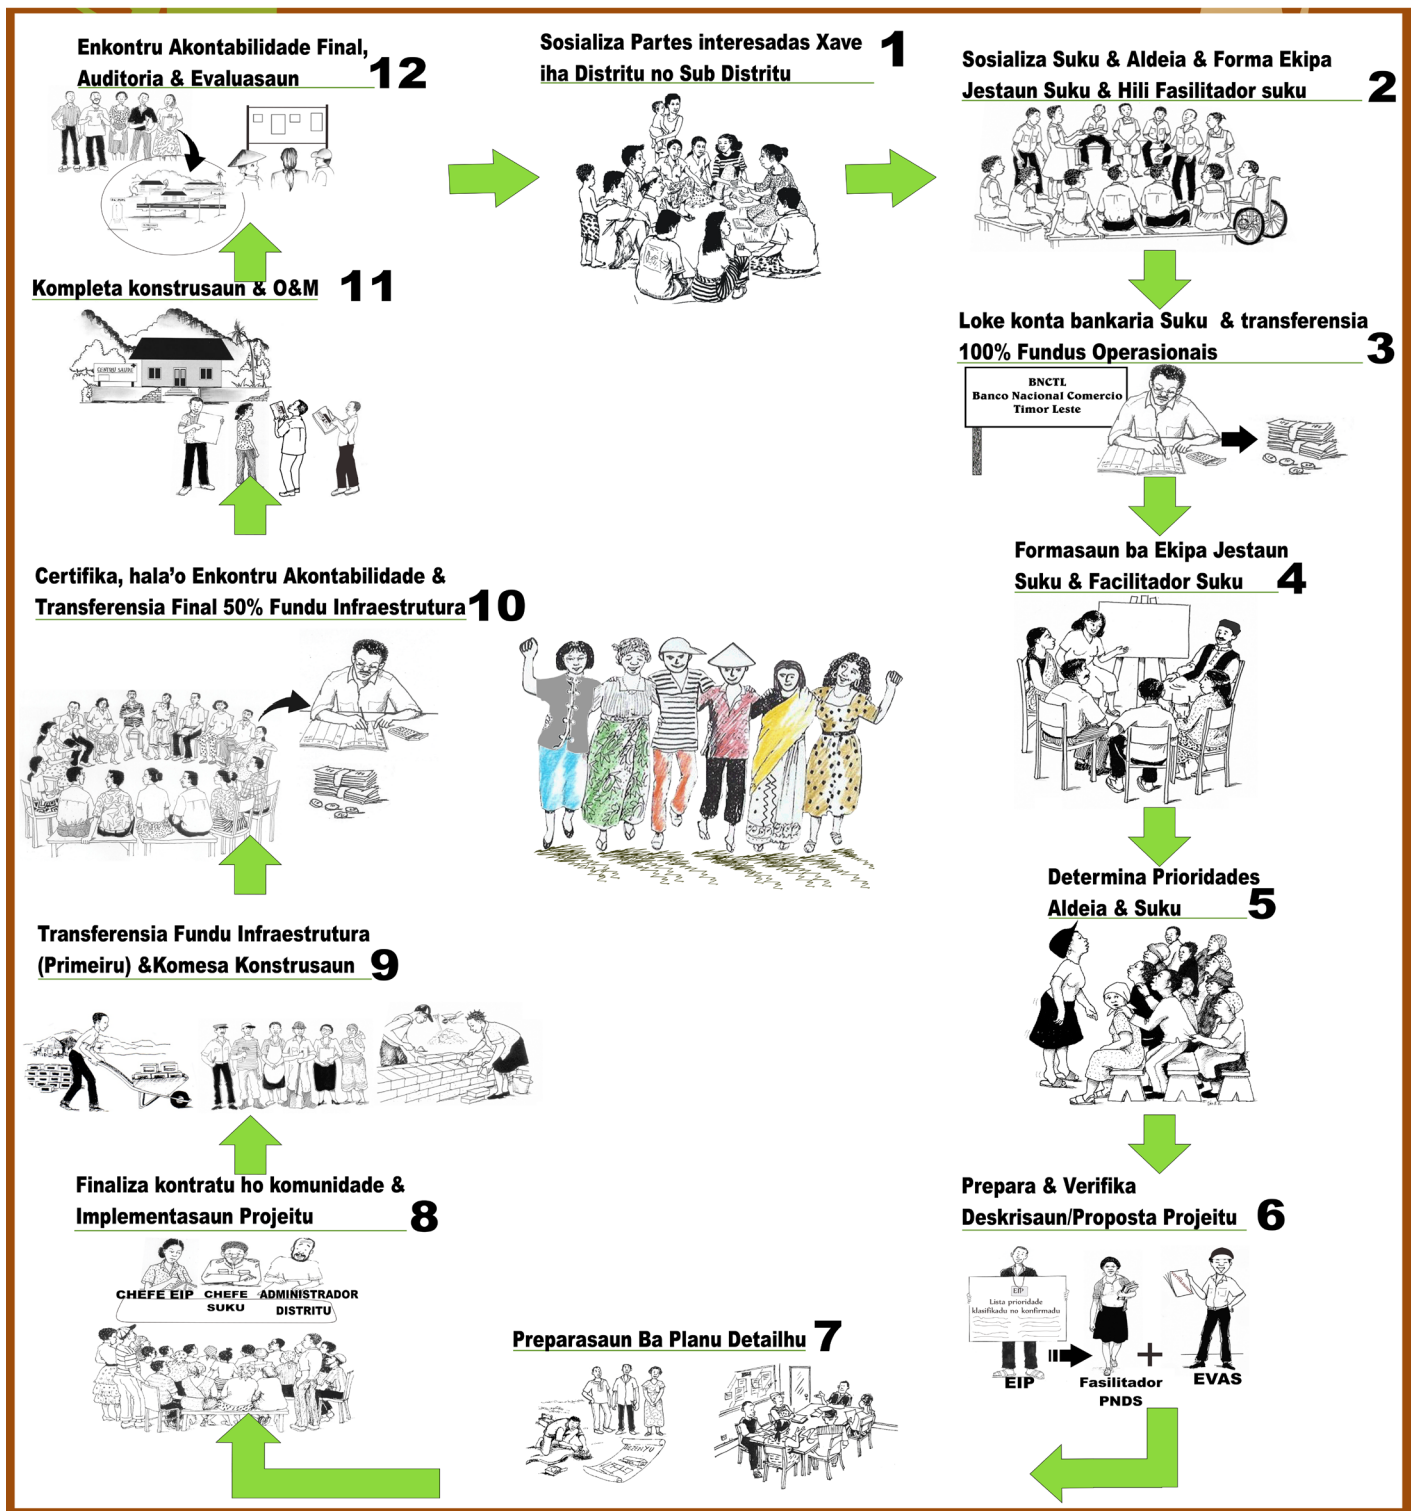

I. Introdusaun

1.1 Fundu

Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (2011-2030) identifika prioridades dezenvolvimentu sosial no ekonomiku nasaun nian. Atu atinji metas planu ida ne'e, governu Timor-Leste dezenvolve ona programas decentralizadu foun nebe'e foka ba dezenvolvimentu lokal iha nivel comunidade iha suku no aldeias. Planu ne'e mos prezisa governu Timor-Leste atu fornese oportunidades atu hasa'e partisipasaun no involvimentu sidaudaun nian iha dezenvolvimentu lokal. Aselera dezenvolvimentu infraestrutura no asesu ba atendementu publiku importante atu atinji metas dezenvolvimentu planu nian, iha tempu hanesan hamosu benefisius sosial no ekonomiku nebe sei kontribui ba dezenvolvimentu nasional nebe diak, sustentavel no justu ba ema hotu.

Atu responde ba iha planu estratéjia ida ne'e Governu Timor Leste estabelese Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) hodi bele aselera dezenvolvimentu husi baze. PNDS hanesan programa nasional ho durasaun ba implementa tinan 8 husi 2013-2021 no kada tinan hetan alokasaun orsamentu husi Governo Timor Leste hodi implementa programa infraestrutura basiko iha suku hotu.

PNDS implementa fazeadamente no ba 2015 PNDS tama iha Faze III nebe'e implementa ona iha 202 suku. Nomos ba tinan ida ne'e prioridade nebe'e mai husi comunidade ka 202 suku hamutuk 386 projetus.

1.2 Enkuadrumentu Legais

PNDS hanesan programa governu nian bazeia ba Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (2011-2030), ne'ebe regula ho rejime regulatoriu tuir mai ne'e :

- Lei Nú. 3/2009, 8 Jullu (Lideransa Tradisional)
- Dekretu Lei Nú. 4/2012, 15 Jullu (Planeamentu Dezenvolvimentu integradu Distritál)
- Rezolusaun Governu Nú. 1/2012, 15 Janéiru (Aselera Dezenvolvimentu Komunitária)
- Diploma Ministeriál Konjuntu Nú. 22/2012, 27 Juñu (Kommisaun Inter-Ministeriál no Grupu Traballu Tekniku Inter-Ministeriál)
- Revizaun ba Dekretu Lei PNDS Nú. 8/2013, Abril 2013 ba fali Dekretu Lei PNDS ho Nu 30/2015
- Manual Jestaun Finanseiru Komunitade/ CFMM (Community Financial Management Manual)
- Manual Operasaun Programa/ Programa Operational Manual (POM)

1.3 Prinsipius no Objetivu

1.3.1 Prinsipiu

Prinsipiu husi PNDS ba implementaun PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

1. Redusaun Pobreza : kria serbisu neb hasa'e rendementu familia no hadia asesu ba atendentu baziku;
2. Demanda mai husi Komunitade: ema sira iha suku determina atividades liuhusi prosesu konsultasaun ida nebe ativamente envolve mane no feto hotu husi aldeia hotu iha suku;
3. Jestaun Komunitade: prosesu foti desizaun halo husi komunitade aliña ho komitmentu Governu Sentral suporta dezvoltamentu no kombate pobreza rural liu husi desentraliza autoridade;
4. Igualdade Jéneru: asegura katak feto no mane sira iha direitu hanesan deit iha foti desizaun kona ba kestaun ba dezvoltamentu komunitade;
5. Transparansia: demokratiza asesu ba informasaun atu asegura komunitade hotu iha asesu ba informasaun;
6. Akontabilidade: Komprensaun klaru ida kona ba diretu no responsabilidade autór hotu atu permite akontabilidade efektivu ba desizaun nebe halo, fundus utilizadu no servisu nebe konstrui ona;
7. Aprendezaen Partisipatoriu: envolvimentu komunitade tomak iha programa monitorizasaun no avaliasaun sei informa dezeńu no implementasaun faze tuir mai, hodi nune kuntinua hadiah nafatin prosesu no haforsa liu tan sentidu nain ba programa husi komunitade no hakbi'it komunitade.

1.3.2 Objetivus

Objetivos no Resultadu ba PNDS

PNDS iha objetivus ba implemensaun programa hanesan tuir mai ne'e :

Meta: Hadi'ak kondisaun sósiu-ekonómiku no governasaun lokál ba mane no feto sira iha suku laran iha Timor-Leste liu husi infraestrutura ne'ebé komunitade mak jere rasik.

Resultado/Outcome1: Hametin PNDS nia sistema, prosesu no prosedimentu hodi fó implementasaun direta ba komunitade

Resultado/Outcome2: Hasa'e Komunitade nia Partisipasaun no Kapasitasaun hodi halo Planeamentu no Jere Infraestrutura Lokál

Resultado/Outcome3: Infraestrutura ho kualidade di'ak ne'ebé harii no mantein ona husi komunitade sira

Resultado/Outcome4: Planeamentu, Koordenasaun no Komunikasaun hamosu implementasaun programa ne'ebé efektivu ho kualidade di'ak

Resultado/Outcome5: Jéneru, Inkluzaan Sosiál, Ambiente no Defisiénsia integradu iha MAE no PNDS nia Estratéjia sira, planu unidade, departamentu no individuál

1.4 Planu Asaun Anual 2015

Programas /Atividades	Indicadores de Desempenho	Meta Anual	Resultado
Outcome 1 : HAMETINPNDSNIA SISTEMA,PROSESUNO PROSEDIMENTU HODI FÓ IMPLEMENTASAUN DIRETA BA KOMUNIDADE			
Act 1 : Planu alokasaun fundos ba 442 suco	Orcamento aprovado ba 442 suku	442	
Act 2 : Dezenvolvimentu plano detalhadu ba execusaun orsamentu anual	Orcamento aprovado ba 442 suku	442	
Act 3 : Finaliza no implementa planu rekrutamentu	Pozisaun hotu hotu prensidu	Kompleta rekrutamentu no nomeasaun ba pozisaun sira ne'be seidauk prensidu	
Act 4 : Dezenvolve politika jestaun avaliasaun dezenpenhu, ne'be inklui prestasaun no sansaun	Diploma hetan aprovasaun husi Ministru	Diploma Ministerial hodi aprova estrutura no mandatu Politika Jestaun Avaliasaun Dezenpenhu aprova husi KFP	
Act 5 : Staf Jestor tenke bazeia ba lei parlamentu no dekretu lei, dezenvolve termus referensia espesifiku, pagamentu subsidu bazeia ba dekretu lei, liuliu dekretu lei kona subsidu ba areas remota			
Act 6 : Dezenvolvimentu Sistema Jestaun Informasaun no halo pilotu ka teste iha nivel nasional no municipiu	Sistema estabesidu no atualizadu	5 municipius no ekipa Nasional (Finansa no Tekniku)	
Act 7: Teste sistema SJI iha nasional no municipiu hodi garante katak sistema funsiona	Sistema estabesidu no atualizadu	13 municipius	
Act 8: Estabelese Sistema Jestaun Keixa	Sistema estabesidu no funsiona 50% keixa husi komuni- dade simu no rezolvidu	Estabesido sistema ba Jestaun Keixa	
Outcome 2 : HASA'E PARTISIPASAUN KOMUNITÁRIA NO KAPASIDADE ATU HALO PLANEAMENTU NO JERE INFRAESTRUTURA LOKÁL			

Act 1: SosIALIZASAUN PNDS iha 13 municipiis	Feto no ema ho defisien- sia partisipa iha procesu no atividade programa	Programa implementa bazeia ba matadalan no Infra-es- trutura basika konstruidu fo benefisio ba comunidade no iha qualidade tekniku ne'ebe diak	
Act 2: Kapasitasaun kontinua ba membrus ekipas suku no komunidade	Estrutura suku nia kom- priende diak konaba sira nia papels no responsab- ilidade	EJS hotu partisipa iha trein- amentu	
Act 3: Dezenvolvimentu materiais treinamentu	Finalizado no utilizado	Aprovado mini-matadalan	
Act 4: Estabelese relasaun no koordenasaun ho insti- tuisaun formasaun relevante hodi fo apoiu ba komuni- dades			
Act 5: Kriasaun planu kapasitasaun espefiko konaba jestaun projetu, konstrusaun, aprovisionamentu ba membrus ekipa suku no ekipa implementasaun projetus			

Outcome 3 :

INFRAESTRUTURA HO KUALIDADE DI'AK HARI NO MANTEIN ONA HUSI KOMUNIDADE SIRA

Act 1: Realiza monitorizasaun no supervisaun regular ba postu administrativu no suku	75% hosi infraestrutura basiku iha qualidade tekniku no funsiona	Programa implementa bazeia ba matadalan no Infra- estrutura basika konstruidu fo benefisio ba comunidade no iha qualidade tekniku ne'ebe diak	
Act 2: Halo visita terenu ba progresu fiziku			
Act 3: Dezenvolve padraun konstrusaun	Finalizado no utilizado	Hetan aprovasaun	

Outcome 4 :

PLANEAMENTU, KORDENASAUN NO KOMUNIKASAUN HODI HAMOSU IMPLEMENTASAUN PROGRAMA NEBE'E EFETIVU NO KUALIDADE DIAK

Act 1: Enkontru kordenasaun trimestral ho membru GTTIM	Hametin lina kordenasaun iha nivel nasiona no municipiu	Enkontru realiza dala 4	
Act 2: Realiza enkontru kordenasaun iha nivel Nasiona	Hametin lina kordenasaun iha nivel nasional no municipiu	Enkontru realiza dala 12	

Act 4: Halo enkontru relugar iha nasional no municipiu ho seitor relevante	Enkontru participa husi representative parseiru no seitor hotu	Enkontru realiza dala 4	
Act 5: Halo enkontru trime-stral regular ho Sosiadade Sivil		Enkontru realiza dala 4	
Outcome 5: JÉNERU, INKLUZAUN SOSIÁL, AMBIENTE NO DEFISIÊNCIA INTEGRADU IHA PNDS NIA ESTRATÉJIA SIRA, PLANU UNIDADE, DEPARTAMENTU NO INDIVIDUÁL			
Act 1: Dezenvolve estratejia jeneru no planu asaun	Finaliza estratejia jeneru	Hetan aproposaun	
Act 2: SosIALIZASAUN estratejia jeneru iha nivel nasional no municipiu		13 municipiu no nasional	
Act 3: Identifika pontu focal ba Jeneru	Kompletu focal poin ba 13 municipiu	13 municipiu	
Act 4: Formasaun ba pontu focal iha area jeneru	Focal point hotu partisi-pa iha treinamentu	13 municipiu	
Act 5: Partisipa iha loron mundial feto rural iha Maubisse	Promove feto liu husi Programa PNDS	Partisipa iha eventu nasional konaba promosaun feto	

1.5 Rekursu

1.5.1 Finansa

Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Planeamentu Estratejiku Investimentu ba tinan 2015 aloka orsamentu ba Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ho montante \$12,291,000.00 miloens. Alokasaun ida ne'e tun ho 23% (\$ 3,647,250.00) kompara ho tinan 2014 tamba iha redusaun ba iha Suku balu. Bele hare esplikasaun detailu hanesan iha tabela tuir mai :

Tabela 1. Komparasaun geral ezekusaun orsamentu PNDS 2014 no 2015

Kategoria	Total Alokasaun(\$) 2014	Ezekusaun (%)	Alokasaun (\$) 2015	Ezekusaun %
Salarius no Vensimentus	\$1,605,000.00	96.2%	\$1,628,000.00	100%
Bens Servisus	\$696,000.00	98.6%	\$923,000.00	99.9%
Transferencias	\$13,637,250.00	100%	\$9,740,000.00	100%
TOTAL	\$12,291,000.00	100%	\$12,291,000.00	100%

Fontes Informasaun husi Sistema Freebalansu / www.budgettransparency.gov.tl data Asesu 30/12/2015

Tuir alokasaun subsidiu ba implementasaun PNDS nebe'e fahe ba iha katerogia 2 hanesan subsidiu operasaun no subsidiu infrastruktura. Subsidiu sira ne'e aloka ba fase sira ho total subsidiu no gastus sira tuir mai ne'e :

Tabela 2. Gastus subsidu Operasional & Infraestrutura Faze I, II & III Janeiro-Dezembro 2015

	Operasional (\$)	Infraestrutura (\$)	Operasional siklus 2 (\$)	Operasional (\$)	Infraestrutura (\$)	Operasional (\$)
Orsamentu PNDS	\$883,750.00	\$6,631,250.00	\$883,750.00	\$533,750.00	\$4,026,250.00	\$1,171,000.00
Transfer ba Konta Bankaria Suku	\$883,750.00	\$6,631,250.00	\$883,500.00	\$533,750.00	\$4,026,250.00	\$1,171,000.00
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Balansiu Tinan Kotuk	0.00	0.00	433,903.80	0.00	0.00	42,768.28
T O T A L	\$883,750.00	\$6,631,250.00	\$1,316,758.95	\$533,750.00	\$4,026,250.00	\$1,213,768.28
Gasta tiha Ona	\$449,846.20	\$5,720,021.77	\$478,076.75	\$421,178.28	\$3,438,413.04	\$538,749.40
Balansiu	\$433,903.80	\$911,228.23	\$839,327.05	\$112,571.72	\$587,836.96	\$675,018.88
% Gasta	50.90%	86.26%	36.31%	78.91%	85.40%	44.39%

Fontes : Relatoriu Finansa PNDS Nasional

1.5.2 Rekursu Humanu

Funsionariu PNDS hanesan mákina ba implementasaun programa iha nivel nasional nomos municipiu hodi asegura ba qualidade implementasaun programa ba iha comunidade iha suku hotu. PNDS nia funsionáriu hamutuk 382 nebe'e estakamentu iha nivel nasional no municipiu.

Funsionariu PNDS

Pozisaun	Grau	Nasional	Munisipiu	Postu Administrativu	Sexu		Total
					Mane	Feto	
Diretor Nasional	B1	X				1	1
Xefe Unidade	B2	X			2		2
Xefe Departementu	B3+C3	X			4	2	6
Koor. Municipiu	B		X		12		12
Enjeneiro	B	X	X		23	3	26
Kontabalista	B27+C1	X	X		16	13	29
Senior Sosial	B1+C2	X	X		3		3
Espesial M&A	B1	X			1		3
Senior IT	B1+C2	X			3		3
Rekursu Humano + Trainer	C	X			1	1	2
Ass.Ezekutivo		X			1		1
Espesial Komunika-saun		X			1		1
Kordenador Keixa	B	X			1		1
Fasilitator Sosial Postu Administrativo	C			X	57	20	77
Fasilitator Tekniku Postu Administrativo	C			X	93	28	121
Fasilitator Finansa Postu Administrativo	C			X	22	54	76
MIS	C1+D	X	X		13	1	14
TOTAL					250	126	376

1.5.3 Kapasitasaun

PNDS kontinua fo kapasitasaun ba funsionarius iha nivel Nasional no Municipius tuir orsamentu FDCH na nesesidade dezvoltamentu kapasitasaun no formasaun ba kargu Xefia sira, funsionáriu sira iha Sekretariadu Nasional nun'e mos funsionáriu PNDS sub-nasional sira inklui membru EJS hodi aumenta sira nia abilidade kunesimentu no kapasidad hodi kontribui ba meta PNDS nian. Ho alokasaun FDCH hamutuk \$ 315,000 ezejuta \$291.180.70 (92.44%). Total benefisiáriu ba tinan ida ne'e hamutuk 214 (F:89 & 125). Treinamentu nebe'e realiza hanesan :

No.	Tipu Treinaamentu	Tarjetu	Jeneru	Data	Fatin
1	Integrated Strategic Finacial and Program Planning (Grupu 1 & II)	Diretora Nasional, Xefe. Dep. Kord. Municipiu no funsionáriu Nasional	25 (F: 7 M:18)	31/07-7/08/2015 & 22/8/9/2015	Yayasan SATU NAMA, Yogyakarta-Indonesia
2	Trainamentu ba Kualidade Infraestrutura	Enjineiru Nasional e Municipiu Dili	7 (F:1 M:6)	10-17-8/2015	IPPMI-Yogyakarta (Indonesia)
3	Estudu Komparativa (CDD iha Indonesia)	DG AND, DG MAE no Direitora PNDS	10 (F:5 M: 5)	12-20/9/2015	Jakarta&Bali Indonesia
4	Trainamentu Tekniku Espesializada ba jestaun konstrusaun	Fasilitator Tekniku PA	33 (F:6M:27)	31/08-11/9/2015	CNEFP-Tibar
5	Kursu lingua Englesa	Funsionariu Nasional	31 (F:5 M:26)	Outobro 2015-Feb 2016	LELI-Dili
6	Trainamentu IT (Configuring windows server)	Funsionariu IT Nasional	7 (M:7)	21/9-2/10/2015	INXINDO (Yogyakarta-Indonesia)
7	Trainamentu ba komunikasaun (Adobe in design)	Funsionariu Komunika-saun Nasional	4 (M:4)	3-11/11/2015	INXINDO (Yogyakarta-Indonesia)
8	Trainamentu ba MIS (Database Administration)	MIS Nasional no MIS Mun. Liquisa	3 (M:3)	9-20/11/2015	INXINDO (Bandung-Indo)
9	Estudu Komparativa Jeneru (Partisipasaun Feto rural iha Dezenvolvimentu Sosio-Ekonomiku)	Ponta fokal Jeneru no Ekipa Jestaun Suku	17 (F:10 M:7)	5-12/12/2015	NTB-Indonesia
10	Trainamentu Fasilitasaun Komunitariu no TOT ba FFPA	Fasilitator Finansa PA	77 F: 55 M:22	30/11-4/12/2015	SDRA,Dili

2. Rezultadu Implementasaun Programa tuir PAA 2015

PNDS iha rezultadu prinsipál 8 nebe'e mak presija atinji liu husi atividade sira nebe'e mak defini husi programa. Atividade sira ne'e iha atividade kontinuasaun husi 2014 no atividade 2015. Tuir mai esplikaun detailu konaba rezultadu implementsaun tuir planu asaun anual nebe'e hahu husi fulan Janeiru-Dezemburu 2015.

2.1 Orsamentu Aprovado ba 442 Sukus

Indicator	Rezultadu
Orcamento ba 442 aprovados	Atinjimentu : Ba tinan 2015 alokasaun orsamentu Operasional ba Faze 2 siklu 2 ba 91 sukus no Orsamentu Infraestrutura : Faze 1 siklu 2 ba 31 no Faze 3 ba 202 sukus

Actividade 1.1 : Halo plano alokasaun fundus ba suku 442

Alokasaun ba tinan ida ne'e governu Timor Leste kontinua aloka orsamentu ba PNDS ho montante hamutuk ba iha \$10.000.000.00. Husi orsamentu ida ne'e 328 sukus mak sei hetan hodi implementa programa tuir prioridade sira nebe'e mak defini ona husi suku sira refere.

Act 1.2: Dezenvolvimentu Plano Detalhadu ba Ezekusaun Orsamentu Anual

Tinan ida ne'e PNDS hetan orsamentu husi governu \$10.000.000.00 hodi aloka ba iha kategoria 2 hanesan Subsidiu operasiolan no subsidiu infraestrutura. Subsidiu operasiona aloka ba iha 91 sukus no Subsidiu infraestrutura ba iha 233 sukus.

Progresu Ezekusaun Subsidiu Operasional no Infraestrutura (2015) Subsidiu Operasional (Faze III 2015)

Relatoriu progresu gastus subsidiu operacional Faze III globalmente iha nivel nasional atinji **47.04%** (\$570,933.65) husi total montante \$1, 213, 768.28 husi dadus global ba 13 Municipio. Orsamentu sira ne'e gastu barak liu ba Insentivo ba ekipa suku ho **58.87%**.

Gastu Operasaun :

No.	Item	Orsamentu (\$)	Kumulativu YTD (\$)	% Gastus
1	Enkontrus Komunitade	\$175,691.65	\$50,264.05	25.37%
2	Treinamentu Komunitade	\$195,737.10	\$84,669.80	39.32%
3	Insentivus ba Ekipa Suku	\$489,204.00	\$320,227.30	58.87%
4	Kustus administrasaun Projetu	\$306,685.05	\$58,850.15	18.97%
5	Kustus levantamentu dadus no dezeniu	\$42,485.33	\$13,325.05	30.00%
Total Gastu Operasaun		\$1,213,691.65	\$570,933.65	47.04%

Progresu Faze II (Suku 91) Gastu Subsidiu Operasional & Infraestrutura (2014)**Subsidiu Operasional**

Relatoriu progresu gastus subsidiu operasional globalmente iha nivel nasional atinji 81.70% (436,593.93) husi total montante \$ 533,750.00 husi dadus global ba 12 Municipio.

Husi total gastus ida ne'e kategoria gastus nebe'e mak boot liu mak ba insentivus ba ekipa suku no atinji ona 100% no gastus kiik liu ba levantamentu dadus no dezeniu ho 34.57%.

Atu detaillu liu bele hare'e progresu gastus subsidiu operasional hanesan grafiku tuir mai ne'e :

Tabela 5: Gastus Subsidiu Operasional Faze II

PNDS RELATORIU NACIONAL - FAZE 2 (SUCO 91)
RELATORIU EZEKUSAUN ORSAMENTO TO'O Jan-Dez 2015

No.	Item	Orsamentu (\$)	Kumulativu YTD (\$)	% Gastus
1	Enkontrus Komunitade	\$ 69,924.00	\$ 46,984.75	67.19%
2	Treinamentu Komunitade	\$ 73,714.00	\$ 38,291.13	51.95%
3	Insentivus ba Ekipa Suku	\$ 222,340.00	\$ 239,463.50	107.70%
4	Kustus administrasaun Projetu	\$ 148,089.00	\$ 89,633.75	60.53%
5	Kustuslevantamentudadus no dezeniu	\$ 19,683.00	\$ 6,805.15	34.57%
Total Gastu Operaun		\$ 533,750.00	\$ 421,178.28	78.91%

Subsidiu Infraestrutura

Progresu gastus subsidiu infraestrutura globalmente iha nivel nasional atinji 87.45% (\$3,520,769.63) husi total montante \$ 4,026,250.00 husi dadus global ba 12 Municipio.

Gastu Subsidiu Infraestrutura Fase I

No.	Item	Orsamentu (\$)	Kumulativu YTD (\$)	% Gastus
1	Materiais	\$ 3,323,023.40	\$2,753,040.59	82.85%
2	Insentivus Trabalho	\$ 703,226.60	\$685,372.45	97.46%
Total Gastus Infraestrutura		\$4,026,250.00	\$3,4520,769.63	87.45%

Progresu Gastus Subsidiu Operasional no Infraestrutura (Faze I orsamentu 2013)

Relatoriu progresu gastus subsidiu operasional globalmente iha nivel nasional atinji 50.90% (\$449,846.20) husi total montante \$ 883,750.00 husi dadus global ba 13 Municipio.

Husi total gastus ida ne'e kategoria gastus nebe'e mak boot liu mak ba insentivus ba ekipa suku ho 72% (265,076.15) no gastus kiik liu ba enkontru komunidadade (29.65%). Atu detaillu liu bele hare'e progresu gastus subsidiu operasional hanesan grafiku tuir mai ne'e :

Tabela 3 : Gastus Subsidiu Operasaun Faze 1

RELATORIU EZEKUSAUN ORSAMENTO TO'O Janeiro-Dezembro 2015			
Gastu Operasaun:	Orsamentu (\$)	Kumulativu YTD (\$)	% Gastu
Enkontrus Komunidadade	124,263.50	36,840.70	29.65%
Treinamentu Komuni-dade	130,034.00	43,753.15	33.65%
Insentivus ba Ekipa Suku	368,160.00	263,396.15	71.54%
Kustus administrasaun Projetu	233,989.00	97,369.10	41.61%
Kustuslevantamentudadus no dezenu	27,303.50	8,487.10	31.08%
Total Gastu Operasaun	883,750.00	449,846.20	50.90%

Subsidiu Infraestrutur

Progresu gastus subsidiu infraestrutur globalmente iha nivel nasional atinji 86.39% (\$ 5,728,485.17) husi total montante \$6,631,250.00 husi dadus global ba 13 Municipio.

Gastu Infraestrutur Fase I	Orsamentu (\$)	Kumulativu YTD (\$)	% Gastu
3000 Materiais	\$5,621,483.80	\$4,454,558.97	78.54%
3001 Insentivustraballu	\$1,009,766.20	\$1,248,645.65	22.02%
Total Gastu Infraestrutur	\$6,631,250.00	\$5,72,485.17	86.39%

2.2 Estrutura suku komprende sira nia knar no responsabilidade konaba programa

Indicator	Rezultadu
Pelomenus 50% hosi estrutura suku nia kompriende diak sira nia papel no responsabilidade	Atinjimentu: 80% membro EJS sira komprende no implementa metode mobilizasaun trabaladres ho diak no Kapasidade EJS jere finansas hetan progresu diak kompara ho tinan kotuk 60% sae ba 80% nivel satisfasaun husi komunidadade.
Pelomenus 20% fetu no ema ho defisiensia partisipa iha procesu no atividade programa"	Atinjimentu: 47% fetu partisipa iha atividade train-amentu.

Actividade 2.1 Kapasitasaun kontinua ba membrus ekipas suku no comunidade

Trainamentu ba ekipa jestaun suku

Formasaun no kapasitasaun ba iha ekipa jestaun suku kontinua halao husi ekipa PNDS ba membru EJS husi 442 suku. Trainamentu ida neê halao hodi aumenta kapasidade EJS iha areas Planumentu, Jestaun, Konstrusaun, Finansa, Operasaun no Manutensaun (modul A-L).


Trainamentu **ba Ekipa Jestaun Suku no Komunitade** kompletu ona modul A-L ba Faze I 149 suku ho parti-siapaun EJS : 7884 no comunidade 5233, Faze II kompletu ona mudul A-H ba Suku 91 ho partisipasaun EJS: 7982 Komunitade : 2306 no Faze III kompletu ona A-H ba suku 202 EJS 7056 Komunitade: 6521.




← EJS Municipio Dili tuir
trainamentu modul F
(kapasitasaun feto) iha Postu
Administrativu Kristu Rei

Esplikasaun konaba partisipasaun husi EJS no comunidade iha atividades ida-ida hanesan tuir mai neê:

Partisipasaun EJS

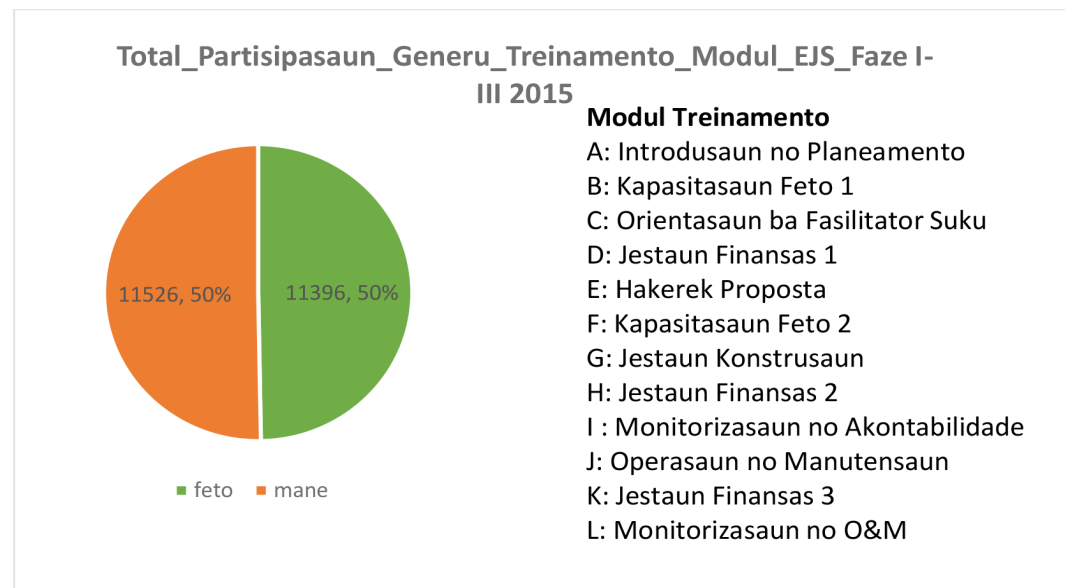

Total Partisipasaun Komunitade (Mane no Feto) husi Faze I-III

Total_Partisipasaun Komunitade Faze I-III _implementasaun
PNDS iha 2015

Grafiku iha leten, total partisipasaun komunitade
hamutuk ema 14060

Act 2.2 Dezenvolvimentu Materiais Treinamentu

Ekipa Sosial serbisu hamutuk ho Asesor Nasional hodi simplefika materias trainamentu durante fulan 3. Materias trainamentu ida ne'e simplefika ba iha Mini-Matadalan 9 ba area tekniku, sosial no finansa. Mini-Matadalan sira ne'e halo ona sosialisasaun no distribuisaun ba iha ekipa Nasional no 13 Munisipius.

Act2.3: Estabelese relasaun no koordenasaun ho instituisaun formasaun relevante hodi fo apoiu ba comunidades Liu husi PNDS-SP halo kontratu ho CNEFP hodi halo treinamentu movel ba ekipa teknik no komunitade iha fatin projetu

Act2.4: Kriasaun planu kapasitasaun espéfiko konaba Jestaun projetu, konstrusaun, aprovisionamentu ba membrus ekipa suku no ekipa implementasaun projetus

Realiza Trainamentu dala rua konaba Jestaun konstrusaun, prosesu aprovisionamentu, mobiliza trabaladores, no monitorizasaun projetu spesifiku liu ba membru Ekipa Jestaun Suku nebee'e participa hamutuk 29 pesoas (Mane 18 no Feto 11).

2.3 Programa implementa bazeia ba matadalan no Infra-estrutura basika konstruidu fo benefisio ba komunitade no iha kualidade tekniku ne'ebe diak.

Indicator	Rezultadu
75% hosi infraestrutur basiku iha kualidade tekniku no funsiona	Kompletu: Rezultadu teknikal Audit ba projeitus PNDS ba Faze 1 mak hanesan : Kualidade Infraestrutur projeitus PNDS atinji 80% no Utilizasaun 92%

Act3.1 Realiza monitorizasaun no Supervisaun Regular ba Sub-Distritus no Sukus

Progresu Fiziku

Iha tinan 2015 iha projeitus hamutuk 386 nebe'e implementa iha 202 suku. Husi total projeitus sira ne'e iha sectoral 5 (Saude, Be'e mos, Estada, Agrikultura no Edukasaun). Seitor be'e mos no estrada sai prioridade liu ho projeitu Be'e mos 173 no estrada 154. Projeitus sira ne'e komesa implementa ona iha 202 suku no atinji ona progresu fisiku 23.75%.



Komesa konstrusaun iha suco Fuiluro postu administrativu Lospalos Municipio Lautem

Kontinuasaun Projeitus Faze I no Faze II

Iha tinan 2015 mos iha projeitus kontinuasaun husi tinan 2013 no tinan 2014. Ba tinan 2013 ho total projeitus 335 nebe'e atinji ona 100% iha fulan Novembro 2015 no projeitus sira ne'e halo ona inagurasaun hodi simbolikamente entrega obra sira ne'e ba iha comunidade hodi halo manutensaun. Projeitu sira ne'e fo benefisiu ba comunidade hamutuk 57681 uma kain.

Inagurasaun Projeitu

Projeitu hamutuk 335 husi faze I maioria kompletu ona konstrusaun no hetan inagurasaun husi parte



Membru governo no estado hodi simbolika projeitu sira ne'e entrega formalmente ba iha comunidade no autoridade lokal hodi bele tau matan ba iha kontinuasaun no manutensaun. Vice Ministru Administrasaun Estatal, Sr. Tomas do Rosario Cabral, simbolikamente inagura projetu programa PNDS 30 iha Suku Betano, Postu Administrativu Same, Munisípiu Baucau Manufahi (30/09/2015).

Projetu konstrusaun be'e mos ho total orsamentu \$29,131.63 no Benefisiariu ba uma kain 115 iha Betano, Same, Municipio Manufahi

Utilizasaun Projeitu PNDS husi comunidade

Projeitus PNDS komesa utiliza husi comunidade hodi responde ba iha nesesidade basiku loron-loron. Be'e mos mos sai hanesan projeitu nebe'e mak hetan prioridade husi comunidade husi suku hotu iha Timor Leste.

Inan Feto husi area rural komesa utiliza be'e mos nebe'e mak PNDS instala iha sira nia Suku hodi utiliza ba iha sira nia nesesidade loron hanesan: Hemu, Haris, tein, nomos uza ba lori rega modo.



Ba faze II tinan 2014 projeitus hamutuk 218 nebe'e implementa iha 91 suku. Projeitus sira ne'e hanesan iha sectoral hanesan (Be'e, Estrada, Edukasaun, Agrikultura no Saude).

Projeitus sira ne'e atinji ona 98% no 193 mak kompletu ona konstrusaun no projeitus 26 iha iha faze finalizasaun projeitus no projeitus sira ne'e sei fo benefisiu ba iha comunidade 39631 uma kain. 91 suku ne'be mak hala'o ona enkontru akontabilidade final hamutuk 70 suku no 21 suku seidauk halo tamba sei prosesu halo konstrusaun fisiku.

Act3.2: Dezenvelope padraun konstrusaun

PNDS ba tinan ida ne'e liu husi ekipa engenariu nasional hamutuk ho asesór dezenvelope ona padraun konstrusaun hodi bele responde ba iha qualidade, orsamentu ba implementasaun projeitus iha comunidade. Padraun konstrusaun ida ne'e iha spesifikasaun iha area hanesan estrada, obra ba ema ho divasensia, drainazen, Irigasaun, moru satan be'e, Sistema be'e no Ponte. Ba iha be'e mos adopta padraun nebe'e mak iha ona husi Ministerio Obras Publiko (DNSAS). No padraun sira ne'e halo ona trainamentu ba iha ekipa PNDS husi Nasional no Munisipiu.

2.4 Kompleta rekrutamentu no nomeasaun ba pozisaun sira

Indicator	Rezultadu
Pozisaun hotu hotu prensidu	La realiza: Ba 2015 la iha prosesu rekrutamentu- Tuir Politika Governu Timor Leste seidauk autoriza ba kada Ministeriu atu halo rekrutamentu ba funsionariu
Diploma hetan aprovasaun husi Ministru”	Kompletu: Estrutura foun hetan ona aprovasaun husi Ministeriu no KFP no halao knar no responsabilidade tuir funsaun sira nebe'e mak defini ona. Kompletu- avaliasaun desempenhu halo ba iha funsionariu 367 iha nivel nasional no municipius Kompletu- Politika Jestaun Avaliasaun finaliza no hetan ona aprovasaun KFP

Act4.1 : Dezenvelope politika jestaun avaliasaun dezempenhu, ne'be inklui prestasaun no sansaun

Ekipa Rekursu Humano PNDS finaliza ona Politika Jestaun Avaliasaun no hetan ona aprovasaun husi Komisaun Funsiaun Publika no halo ona sosializasaun ba iha funsionariu sira iha nivel nasional no municipiu. Avaliasaun desempenhu halo ba iha funsionariu 382 iha nivel nasional no municipius (Muito bom 180,Bom 201 no suficiente 1.

Act4.2: Manutensaun regular ba sistema informasaun Rekursus Humanus

Ekipa Rekursu Humano PNDS dezenvelope ona sistema database uza programa excel no database acces hodi aktualiza konaba progresu funsionariu tuir dezenpenu serbisu no estakamentu funsionariu ba iha Ministeriu no ba iha Municipiu.

2.5 Hametin kordenasaun no komunikasaun iha nivel nasional no sub-nasional

Act 8: Realiza kordenasaun no komunikasaun iha iha nivel nasional no Sub-Nasional

Indicator	Rezultadu
Realiza enkontru kordenasaun iha nivel hotu	Atinjimentu: Realiza enkontru regular mensal ba dala 10 no partisipa husi 13 Direitores Municipius no parseiru. Atinjimentu: Enkontru regular ho siosidade sivil halo dala 1 iha tinan ne'e no partisipa husi siosidade sivil no membru hotu

Act 5.2: Halo enkontru mensal regular ho Parseiru M&E

Enkontru regular kada fulan 2 no halo dala 2 no hetan partisipasaun husi parseiru M&E sira hanesan TAF, FONGTIL, Belun, Luta Hamutuk, PNDS-SP no DFAT.

Act 5.3: Halo enkontru relugar iha nasional no municipiu ho seitor relevante

Estabelese **Grupo Koordenasaun Tekniku Seitoral (GKTS)** no halo enkontru dala 1. Membru maka staf tekniku iha nivel nasional husi lina ministerias (Ministeriu Obras Publiku, Ministeriu de Saude, Ministeriu Agrikultura, Ministeriu de Edukasaun).

Act5.4: Halo enkontru trimestral regular ho Sosiadade Sivil

PNDS serbisu hamutuk ho FongTil hodi organiza enkontru loron ida hodi fahe no aktualizada progresu no rezultadu implementasaun PNDS ba iha sosiadade sivil. Enkontru ida ne'e rasik partisipa husi DG Ministeriu Estatal, Diretora PNDS, Xefe Dep, Diretor FongTil no membru

2.6 Sistema Jestaun Informasaun no Sistema Jestaun keiza estabelisido

Indicator	Rezultadu
Sistema Jestaun Informasaun no Keiza estabelisidu no funsiona	Kompletu: Finalizado no halo ona instalasaun ba 13 municipius. Kompletu: Sistema MIS utiliza ona iha nasional no 13 municipius Atinjimentu- dezenvolve ona matadalan no politika ba sistema keiza hodi kria matriks ba rejistu keiza sira nebe'e mai husi suku hotu. Matriks halo ona sosializasaun iha nivel nasional.

3. Obstaklus

Tinan ida ne'e hanesan tinan ba dalatolu ba implementasaun PNDS. Durante implementasaun atividade ba iha tinan ida ne'e iha obstaklu no dezafius nebe'e mak infrenta mak hanesan tuir mai ne'e :

- Mudansa politika no dekretu lei no. 8/2013 hodi implika ba Prosesu transferensia fundus infraestrutura ba faze III tarde no fo impaktu ba iha implementasaun programa.
- Linas seitoral iha Nasional no Munisipio seidak iha kolaborasaun no kordenasaun diak
- Iha suku balun membru ekipa jestaun suku ladun halao sira nia funsaun ho diak ho kestaun insentivu ba ekipa jestaun suku ki'ik.
- Lider comunidade iha suku balun seidak iha kolaborasaun diak hodi partisipa iha implementasaun programa.
- Komunitade seidak senti sai nain ba programa hanesan PNDS iha sira nian suku laran
- Iha suku balun comunidade defini prioridade ne'be mak kontrariu ho menu indikativu bazeia ba indikator dezempenu PNDS

4. Konklusaun

Relatóriu ida neê koalia liu ba rezultadu implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) nebeê implementa fazeadamente husi Faze I-Faze III. Tinan 2015 hanesan tinan implementasaun programa ba iha Faze III nebeê implementa ba iha 202 suku ho total orsamentu hamutuk \$ 10.000.000.00.

Ba tinan ida neê total hamutuk 386 projeitus mai husi seitor 5 hanesan (Saude, Beê moss, Edukasaun, Agrikultur, no Dalan) no seitor Beê mos hetan percentagem boo't liu ho 45% no Dalan no Ponte iha parte segundo ho 40%. Progresu atividade fisiku foin atinji 23.75%, atinjimentu ida neê kiik tamba prosesu transferensia orsamentu ba iha konta bankaria suku nebeê mak foin halo iha fulan Novembro 2015. Ida neê sai hanesan obstaklu bo'ot tebes ba iha implementasaun programa ba iha tinan ida neê. Maibe ezekusaun orsamentu ba tinan ida neê atinji ona 100% tuir ezekusaun portal Orsamentu Estado Dezembru 2015 tamba halo ona transferensia ba konta bankaria ida-idak.

Tinan ida neê mos hanesan tinan ba dala tolu ba implementasaun PNDS ba 442 sukus ho total 939 projeitus la inklui Pilotu no 553 projeitus mak kompletu ona konstrusaun no comunidade komesa utiliza hodi responde ba nesesidade moris loron-loron nia. 2015 mos iha projeitus kontinuasaun nebeê mak seidauk kompletu husi tinan 2013 (Faze I) ho total projeitus hamutuk 335 nebeê mak foin kompletu konstrusaun iha fulan Outubro tinan ida neê. Ba faze II orsamemtu tinan 2014 nebeê implementa iha 91 sukus ho 218 projeitus atinji ona 98.38% no sei kompletu konstrusaun iha fulan Febreiru 2016.

Rezultadu implementasaun Programa PNDS durante tinan tolu husi 2013-2015 implementa ona iha 442 sukus. Husi rezultadu implementasaun husi Faze I-III hatudu katak :

- Hetan partisipasaun nebeê diak tebes husi comunidade liu-liu parte feto hetan 45% iha atividade PNDS tomak
- Autoridade lokal komesa hola parte no suporta ba iha atividade sira nebeê mak implementa iha suku loron
- PNDS implementa ona iha 442 sukus ho kualidade infraestrutura nebeê diak no Programa PNDS fo ona benefisu ba iha comunidade hodi asesu ba estrada, beê mos, klinika, irigasaun, no eskola.
- Komunitade balu komesa iha konsensia hodi kontribui (material) ba projeitus sira nebeê implementa iha sira nia suku laran.

PNDS kontinua hadia kualidade implementasaun programa hodi bele responde ba nesesidade báziku comunidade hodi bele aselera dezvoltamentu comunidade iha 442 suku.

Annexos

1. *Estrutura PNDS*
2. *Lista Projeitus III*
3. *Infographic (Faze I, II no III)*
4. *Planu Asaun Anual 2016*
5. *Planu Global implementasaun 2016*




PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU
“HAMUTUK ITA DEZENVOLVE NASAU”
 Sekretariadu PNDS, Edifício Central do MPE, Fatuhada Hudi Laran
 Dili, Timor Leste. Tel: 331 0980



Programa Nasiona Dezenvolvimentu Suku

Estrutura Organizasional Sekretariadu PNDS



Dili, Setembro 2015
 Arpova Husi

Dulce Guterres Junior

Koordenadora Jeral e Diretora PNDS

PROJEITUS PNDS FAZE III

Município (District_name)	Posto Administrativo (Subdistrict_name)	Suku (Suco_Name)	Naran Projeto (Subproject_Name / Project Output)	Total Infrastructure Fund Total Fundus Infraestrutura
Aileu	Aileu Villa	Hoholau	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Aileu	Aileu Villa	Lausi	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Aileu	Aileu Villa	Lausi	Drenazen - Hada Fatuk	
Aileu	AileuVilla	Fahiria	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 35,000.00
Aileu	Liquidoe	Betulau	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Aileu	Liquidoe	Faturilau	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Aileu	Liquidoe	Manucassa	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 35,000.00
Aileu	Liquidoe	Manucassa	Estrada Rurais (Estrada Rai)	
Aileu	Liquidoe	Asubilitoho	Postu Saude	\$ 35,000.00
Aileu	Liquidoe	Asubilitoho	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Aileu	Liquidoe	Bereleu	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Aileu	Liquidoe	Bereleu	Ponte - Betaun	
Aileu	Liquidoe	Fahisoi	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 35,000.00
Aileu	Liquidoe	Fahisoi	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Aileu	Liquidoe	Namolesso	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 35,000.00
Aileu	Laulara	Cotolau	Klinika Maternidade	\$ 44,000.00
Aileu	Laulara	Cotolau	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Aileu	Laulara	Fatise	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,000.00
Aileu	Laulara	Fatise	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Aileu	Laulara	Madabeno	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 39,500.00
Aileu	Laulara	Madabeno	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	
Aileu	Laulara	Talitu	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 44,250.00
Aileu	Laulara	Talitu	Drenazen - Hada Fatuk	
Aileu	Laulara	Tohumeta	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Aileu	Laulara	Tohumeta	Estrada Rurais (Estrada Rai)	
			25	\$ 583,750.00
Ainaro	Maubisse	Aitutu	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 49,000.00
Ainaro	Maubisse	Edy	Eskola Primaria	\$ 44,000.00
Ainaro	Maubisse	Fatubesi	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 44,000.00
Ainaro	Maubisse	Horai Quic	Ponte - Betaun	\$ 39,500.00
Ainaro	Maubisse	Liurai	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,000.00
Ainaro	Maubisse	Liurai	Estrada Rurais (Estrada Rai)	
Ainaro	Maubisse	Manelobas	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,500.00
Ainaro	Maubisse	Manelobas	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ainaro	Maubisse	Manetu	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 53,250.00
Ainaro	Maubisse	Maubisse	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 53,500.00
Ainaro	Maubisse	Maubisse	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ainaro	Maubisse	Maubisse	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ainaro	Maubisse	Mau Lau	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 48,750.00
			13	\$ 424,500.00
Baucau	Venilale	Baha-Mori	Eskola Infantil	\$ 44,250.00
Baucau	Venilale	Baha-Mori	Eskola Primaria	
Baucau	Venilale	Uai-Oli	Eskola Primaria	\$ 44,000.00
Baucau	Venilale	Uai-Oli	Drenazen - Hada Fatuk	



Baucau	Venilale	Bado-Ho'o	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 44,000.00
Baucau	Venilale	Fatulia	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 48,750.00
Baucau	Venilale	Fatulia	Mini Merkadu	
Baucau	Venilale	Uai-Laha	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Ha	\$ 48,750.00
Baucau	Venilale	Uatu-Haco	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,750.00
Baucau	Venilale	Uma-Ana Ico	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Ha	\$ 44,000.00
Baucau	Venilale	Uma-Ana Ulo	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 44,250.00
Baucau	Baguia	Alua kraik	Eskola Primaria	\$ 48,500.00
Baucau	Baguia	Larisula	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,500.00
Baucau	Baguia	Haeconi	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,500.00
Baucau	Baguia	Defa Uasi	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Baucau	Baguia	Defa Uasi	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Baucau	Baguia	Lavateri	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,000.00
Baucau	Baguia	Lavateri	Drenazen - Hada Fatuk	
Baucau	Baguia	Osso-Huna	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,500.00
Baucau	Baguia	Samalari (Baguia)	Eskola Primaria	\$ 44,000.00
Baucau	Baguia	Alau Leten	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Baucau	Baguia	Alau Leten	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Baucau	Baguia	Uacala	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,000.00
Baucau	Baguia	Afaloicai	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Baucau	Baguia	Afaloicai	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Baucau	Vemasse	Cai-Cua	Eskola Primaria	\$ 44,000.00
Baucau	Vemasse	Ostico	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Baucau	Vemasse	Ostico	Residencia Pessoal Saude	
Baucau	Vemasse	Uatulari	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Baucau	Vemasse	Osso-Alla	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Baucau	Vemasse	Uaigae	Residencia Pessoal Saude	\$ 44,000.00
Baucau	Vemasse	Uaigae	Drenazen - Hada Fatuk	
Baucau	Vemasse	Vemasse Tasi	Mini Merkadu	\$ 53,500.00
Baucau	Vemasse	Vemasse Tasi	Eskola Secundaria	
Baucau	Vemasse	Loi-Lubo	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Baucau	Vemasse	Loi-Lubo	Estrada Rurais (Estrada Britas)	
			36	\$ 1,137,750.00
Bobonaro	Maliana	Holsa	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,500.00
Bobonaro	Maliana	Holsa	Drenazen - Hada Fatuk	
Bobonaro	Maliana	Lahomea	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	\$ 39,750.00
Bobonaro	Maliana	Lahomea	Drenazen - Hada Fatuk	
Bobonaro	Maliana	Odomau	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,750.00
Bobonaro	Maliana	Odomau	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Bobonaro	Maliana	Raifun	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 39,750.00
Bobonaro	Maliana	Ritabou	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	\$ 44,500.00
Bobonaro	Maliana	Ritabou	Estrada Rurais (Estrada Britas)	
Bobonaro	Maliana	Saburai	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 39,500.00
Bobonaro	Maliana	Tapo Memo	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 39,750.00
Bobonaro	Lolotoe	Deudet	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 48,500.00
Bobonaro	Lolotoe	Deudet	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	
Bobonaro	Lolotoe	Gildapil	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 48,500.00
Bobonaro	Lolotoe	Guda	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 48,500.00
Bobonaro	Lolotoe	Lebos	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Bobonaro	Lolotoe	Lebos	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Bobonaro	Lolotoe	Lontas	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 48,500.00
Bobonaro	Lolotoe	Lupal	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00

Bobonaro	Lolotoe	Lupal	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Bobonaro	Lolotoe	Opa	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 48,500.00
Bobonaro	Atabae	Hataz	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 39,500.00
Bobonaro	Atabae	Atabae	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Bobonaro	Atabae	Atabae	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Bobonaro	Atabae	Raerobo	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 48,500.00
Bobonaro	Atabae	Raerobo	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Bobonaro	Atabae	Aidabaleten	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 53,500.00
			27	\$ 808,000.00
Covalima	Fohorem	Dato Rua	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,000.00
Covalima	Fohorem	Dato Rua	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Covalima	Fohorem	Dato Rua	Drenazen - Hada Fatuk	
Covalima	Fohorem	Fohorem	Estrada Rurais (Estrada Telford)	\$ 44,000.00
Covalima	Fohorem	Fohorem	Sistema Bee Mos - Gravitasaun+Satan Rai (B)	
Covalima	Fohorem	Lactos	Plat Deker	\$ 44,000.00
Covalima	Fohorem	Lactos	Drenazen - Hada Fatuk	
Covalima	Fohorem	Lactos	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Covalima	Fohorem	Dato tolu	Estrada Rurais (Estrada Telford)	\$ 44,000.00
Covalima	Tilomar	Maudemo	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 44,250.00
Covalima	Tilomar	Lalawa	Posu (Posu Badak)	\$ 44,250.00
Covalima	Tilomar	Lalawa	Sintina Publiku ba Eskola	
Covalima	Tilomar	Lalawa	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk	
Covalima	Tilomar	Casabauc	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 39,500.00
Covalima	Tilomar	Casabauc	Estrada Rurais (Estrada Britas)	
Covalima	Tilomar	Biseuc/Raihun	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Klinika	\$ 39,500.00
Covalima	Tilomar	Biseuc/Raihun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Covalima	Tilomar	Biseuc/Raihun	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk	
Covalima	Tilomar	Biseuc/Raihun	Tanke Bee	
Covalima	Maucatar	Matai	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 39,750.00
Covalima	Maucatar	Holpilat	Posu (Posu Badak)	\$ 39,500.00
zas	Maucatar	Holpilat	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Covalima	Maucatar	Holpilat	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Covalima	Maucatar	Holpilat	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Covalima	Maucatar	Ogues	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 35,000.00
Covalima	Maucatar	Ogues	Estrada Rurais (Estrada Britas)	
Covalima	Maucatar	Ogues	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Covalima	Maucatar	BeleCasac	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Covalima	Maucatar	BeleCasac	Drenazen - Hada Fatuk	
Covalima	Maucatar	BeleCasac	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	
			30	\$ 497,250.00
Dili	Vera_Cruz	Colmera	Trotoar / Passeio	\$ 34,750.00
Dili	Vera_Cruz	Colmera	Galeria Kanu (Pipe Culvert)	
Dili	Vera_Cruz	Vila-Verde	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 34,250.00
Dili	Vera_Cruz	Vila-Verde	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Vera_Cruz	Vila-Verde	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Vera_Cruz	Motael	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 34,750.00
Dili	Vera_Cruz	Motael	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Vera_Cruz	Motael	Fatin Lixu Publiku	
Dili	Vera_Cruz	Caicoli	Fatin Lixu Publiku	\$ 34,750.00

Dili	Vera_Cruz	Caicoli	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Vera_Cruz	Caicoli	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Vera_Cruz	Caicoli	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Vera_Cruz	Dare	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 35,000.00
Dili	Vera_Cruz	Dare	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Dili	Vera_Cruz	Dare	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Dili	Vera_Cruz	Lahane Ocidental	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 34,500.00
Dili	Vera_Cruz	Mascarenhas	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 34,500.00
Dili	Vera_Cruz	Mascarenhas	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Cristu Rei	Metiaut	Eskola Primaria	\$ 35,000.00
Dili	Cristu Rei	Metiaut	Fatin Lixu Publiku	
Dili	Cristu Rei	Culuhun	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 34,250.00
Dili	Cristu Rei	Culuhun	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Cristu Rei	Becora	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 34,250.00
Dili	Cristu Rei	Becora	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Cristu Rei	Balibar	Sintina Publiku ba Sentru Komunitario	\$ 34,500.00
Dili	Cristu Rei	Balibar	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	
Dili	Cristu Rei	Balibar	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Dili	Cristu Rei	Bidau Santana	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 33,750.00
Dili	Cristu Rei	Bidau Santana	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	
Dili	Cristu Rei	Bidau Santana	Fatin Lixu Publiku	
Dili	Cristu Rei	Hera	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 34,000.00
Dili	Cristu Rei	Hera	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	
Dili	Cristu Rei	Camea	Postu Saude	\$ 34,250.00
Dili	Cristu Rei	Camea	Postu Saude	
Dili	Metinaro	Sabuli	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 39,500.00
Dili	Metinaro	Sabuli	Plat Deker	
Dili	Dom Aleixo	Bairo Pite	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 34,250.00
Dili	Dom Aleixo	Bairo Pite	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	
Dili	Dom Aleixo	Fatuhada	Ponte - Betaun	\$ 34,500.00
Dili	Dom Aleixo	Fatuhada	Fatin Lixu Publiku	
Dili	Dom Aleixo	Campo Alor	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 34,500.00
Dili	Dom Aleixo	Campo Alor	Fatin Lixu Publiku	
Dili	Dom Aleixo	Campo Alor	Fatin Lixu Publiku	
Dili	Dom Aleixo	Campo Alor	Drenazen - Hada Fatuk	
Dili	Dom Aleixo	Comoro	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 34,250.00
Dili	Dom Aleixo	Comoro	Postu Saude	
Dili	Nain Feto	Lahane Oriental	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 34,250.00
Dili	Nain Feto	Lahane Oriental	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Dili	Nain Feto	Bemori	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 34,500.00
Dili	Nain Feto	Bemori	Fatin Lixu Publiku	
Dili	Nain Feto	Santa Cruz	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 34,500.00
Dili	Nain Feto	Bidau Lcidere	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 35,000.00
Dili	Nain Feto	Bidau Lcidere	Trotoar / Passeio	
Dili	Nain Feto	Bidau Lcidere	Fatin Lixu Publiku	
Dili	Nain Feto	Akadiru-Hun	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 34,750.00

Dili	Nain Feto	Akadiru-Hun	Fatin Lixu Publiku	
Dili	Nain Feto	Akadiru-Hun	Trotoar / Passeio	
Dili	Nain Feto	Gricenfor	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 35,000.00
Dili	Nain Feto	Gricenfor	Ponte - Betaun	
Dili	Nain Feto	Gricenfor	Trotoar / Passeio	
			60	\$ 867,500.00
Ermera	Railaco	Railaco Leten	Eskola Primaria	\$ 39,500.00
Ermera	Railaco	Railaco Leten	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Railaco	Matata	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Ermera	Railaco	Matata	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	
Ermera	Railaco	Tokoluli	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 35,000.00
Ermera	Railaco	Tokoluli	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Railaco	Fatukeru	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 35,000.00
Ermera	Railaco	Fatukeru	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	
Ermera	Railaco	Deleco	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	\$ 39,500.00
Ermera	Railaco	Deleco	Estrada Rurais (Estrada Rai)	
Ermera	Railaco	Railaco Kraik	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Ermera	Railaco	Railaco Kraik	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Railaco	Lihu	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Ermera	Railaco	Lihu	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Railaco	Taraco	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Ermera	Railaco	Taraco	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	
Ermera	Railaco	Samalete	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	\$ 39,500.00
Ermera	Railaco	Samalete	Sala klinika	
Ermera	Railaco	Samalete	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Ermera	Humboe	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,750.00
Ermera	Ermera	Humboe	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Ermera	Talimoru	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 35,000.00
Ermera	Ermera	Ponilala	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,250.00
Ermera	Ermera	Ponilala	Postu Saude	
Ermera	Ermera	Ponilala	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Atsabe	Atara	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 53,250.00
Ermera	Atsabe	Atara	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Atsabe	Atara	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Atsabe	Lasau	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Ermera	Atsabe	Lasau	Estrada Rurais (Estrada Rai)	
Ermera	Atsabe	Baboe Leten	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 44,000.00
Ermera	Atsabe	Baboe Leten	Residencia ba Professores	
Ermera	Atsabe	Laubonu	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk	\$ 48,500.00
Ermera	Atsabe	Laubonu	Residencia ba Professores	
Ermera	Atsabe	Batumanu	Ponte - Betaun	\$ 48,500.00
Ermera	Atsabe	Batumanu	Ponte - Betaun	
Ermera	Atsabe	Tiarlelo	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Ermera	Atsabe	Tiarlelo	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk	
Ermera	Atsabe	Laclo	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Ermera	Atsabe	Laclo	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk	
Ermera	Atsabe	Malabe	Galeria Kuadradu (Box Culvert)	\$ 48,500.00
Ermera	Atsabe	Malabe	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Atsabe	Leimea Leten	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Ermera	Atsabe	Leimea Leten	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Atsabe	Paramin	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00

Ermera	Atsabe	Paramin	Drenazen - Hada Fatuk	
Ermera	Atsabe	Baboe Kraik	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,000.00
Ermera	Atsabe	Baboe Kraik	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Ermera	Atsabe	Obulo	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	\$ 48,500.00
Ermera	Atsabe	Obulo	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
			50	\$ 1,043,250.00
Lautem	Lospalos	Fuiloro	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 49,250.00
Lautem	Lospalos	Home	Posu (Posu Badak)	\$ 35,000.00
Lautem	Lospalos	Home	Ponte - Betaun	
Lautem	Lospalos	Home	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	
Lautem	Lospalos	Rasa	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Lautem	Lospalos	Rasa	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Lautem	Lospalos	Bauro	Posu (Posu Badak)	\$ 44,250.00
Lautem	Lospalos	Bauro	Posu (Posu Badak)	
Lautem	Lospalos	Bauro	Posu (Posu Badak)	
Lautem	Lospalos	Bauro	Eskola Primaria	
Lautem	Lospalos	Souro	Eskola Infantil	\$ 35,000.00
Lautem	Lospalos	Souro	Posu (Posu Badak)	
Lautem	Lospalos	Muapitine	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Lautem	Lospalos	Muapitine	Drenazen - Hada Fatuk	
Lautem	Lospalos	Muapitine	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sentru Komunitario	
Lautem	Lospalos	Muapitine	Posu (Posu Badak)	
Lautem	Lospalos	Lore I	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 39,500.00
Lautem	Lospalos	Lorell	Eskola Primaria	\$ 35,000.00
Lautem	Lospalos	Leuro	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 39,500.00
Lautem	Lospalos	Leuro	Drenazen - Hada Fatuk	
Lautem	Lospalos	Leuro	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sentru Komunitario	
Lautem	Lospalos	Cacaven	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Lautem	Lospalos	Cacaven	Drenazen - Hada Fatuk	
Lautem	Lospalos	Cacaven	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	
Lautem	Lautem	Maina I	Postu Saude	\$ 39,500.00
Lautem	Lautem	Maina II	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	\$ 48,500.00
Lautem	Lautem	Maina II	Eskola Infantil	
Lautem	Lautem	Ililai	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 48,500.00
Lautem	Lautem	Ililai	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	
Lautem	Lautem	Pairara	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Lautem	Lautem	Pairara	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	
Lautem	Lautem	Euquisi	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 44,000.00
Lautem	Lautem	Euquisi	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Betaun	
Lautem	Lautem	Daudere	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 44,000.00
Lautem	Lautem	Daudere	Eskola Primaria	
Lautem	Lautem	Baduro	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	\$ 44,000.00
Lautem	Lautem	Baduro	Estrada Rurais (Estrada Britas)	
Lautem	Lautem	Serelau	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,000.00
Lautem	Lautem	Com	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 44,000.00
Lautem	Lautem	Parlamento	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	\$ 44,000.00

Lautem	Lautem	Parlamento	Eskola Primaria	
			41	\$ 836,000.00
Liquica	Bazartete	Fahilebu	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Liquica	Bazartete	Fahilebu	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Liquica	Bazartete	Lauhata	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,750.00
Liquica	Bazartete	Lauhata	Posu (Posu Badak)	
Liquica	Bazartete	Leorema	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 49,000.00
Liquica	Bazartete	Leorema	Eskola Infantil	
Liquica	Bazartete	Maumeta	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,750.00
Liquica	Bazartete	Maumeta	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Liquica	Bazartete	Metagou	Galeria Kuadrado (Box Culvert)	\$ 39,500.00
Liquica	Bazartete	Metagou	Residencia ba Professores	
Liquica	Bazartete	Ulmera	Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal)	\$ 44,250.00
Liquica	Bazartete	Ulmera	Eskola Infantil	
Liquica	Bazartete	MotaUlun	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
Liquica	Bazartete	MotaUlun	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Liquica	Bazartete	Tibar	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 44,250.00
Liquica	Bazartete	Tibar	Eskola Primaria	
Liquica	Bazartete	Fatumasi	Ponte - Betaun	\$ 39,500.00
Liquica	Bazartete	Fatumasi	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Liquica	Liquica	Loidahar	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,750.00
Liquica	Liquica	Loidahar	Estrada Rurais (Estrada Rai)	
Liquica	Liquica	Darulete	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
Liquica	Liquica	Darulete	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Liquica	Liquica	Luculai	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 39,500.00
			23	\$ 493,750.00
Manatuto	Manatuto Villa	Cribas	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 44,250.00
			Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sentru Komunitario	
Manatuto	Manatuto Villa	Cribas		
Manatuto	Manatuto Villa	Iliheu	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 39,500.00
			Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sentru Komunitario	
Manatuto	Manatuto Villa	Iliheu		
Manatuto	Manatuto Villa	Iliheu	Eskola Primaria	
Manatuto	Manatuto Villa	Aiteas	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 35,000.00
Manatuto	Manatuto Villa	Aiteas	Estrada Rurais (Estrada Britas)	
Manatuto	Manatuto Villa	Ailili	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 35,000.00
Manatuto	Manatuto Villa	Ailili	Drenazen - Hada Fatuk	
Manatuto	Manatuto Villa	Sau	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 44,500.00
Manatuto	Manatuto Villa	Sau	Drenazen - Hada Fatuk	
Manatuto	Manatuto Villa	Ma'abat	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 35,000.00
Manatuto	Manatuto Villa	Ma'abat	Fatin Lixu Publiku	
Manatuto	Manatuto Villa	Ma'abat	Fatin Lixu Publiku	
Manatuto	Manatuto Villa	Ma'abat	Drenazen - Hada Fatuk	
Manatuto	Manatuto Villa	Ma'abat	Drenazen - Hada Fatuk	
Manatuto	Laclo	Uma Naruk	Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk	\$ 39,500.00
Manatuto	Laclo	Hohorai	Klinika Maternidade	\$ 44,000.00
Manatuto	Laclo	Hohorai	Estrada Rurais (Estrada Rai)	
Manatuto	Laclo	Uma Caduac	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,250.00
Manatuto	Laclo	Uma Caduac	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Manatuto	Laclo	Uma Caduac	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Manatuto	Laclo	Uma Caduac	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk	

Manatuto	Laclo	Laku Mesak	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 44,250.00
Manatuto	Laclo	Laku Mesak	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
			25	\$ 405,250.00
Manufahi	Turiscail	Matorec	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Orana	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Beremana	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Caimauk	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Caimauk	Ponte - Betaun	
Manufahi	Turiscail	Liurai	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Foholau	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Foholau	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	
Manufahi	Turiscail	Manumera	Ponte - Betaun	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Manumera	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Manufahi	Turiscail	Manumera	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	
Manufahi	Turiscail	Fatucalo	Estrada Rurais (Estrada Rai)	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Lesuata	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Lesuata	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	
Manufahi	Turiscail	Lesuata	Estrada Rurais (Estrada Rai)	
Manufahi	Turiscail	Aitemua	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Aitemua	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	
Manufahi	Turiscail	Mindelo	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 48,500.00
Manufahi	Turiscail	Mindelo	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	
			19	\$ 533,500.00
Oecusse	Passabe	Abani	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 53,500.00
Oecusse	Passabe	Malelat	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 48,500.00
Oecusse	Nitibe	Suni-Ufe	Estrada Rurais (Estrada Telford)	\$ 39,500.00
Oecusse	Nitibe	Usi-Taco	Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuissau) - Ha	\$ 44,250.00
Oecusse	Nitibe	Lela-Ufe	Mini Merkadu	\$ 44,250.00
Oecusse	Nitibe	Lela-Ufe	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Oecusse	Nitibe	Lela-Ufe	Residencia ba Professores	
Oecusse	Nitibe	Ban-Afi	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,000.00
Oecusse	Nitibe	Ban-Afi	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Oecusse	Nitibe	Bene-Ufe	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 48,750.00
			10	\$ 322,750.00
Viqueque	Viqueque Villa	Uai-mori	Residencia ba Professores	\$ 35,000.00
Viqueque	Viqueque Villa	Uai-mori	Ponte - Betaun	
Viqueque	Viqueque Villa	Luca	Eskola Primaria	\$ 44,250.00
Viqueque	Viqueque Villa	Uma Quic	Estrada Rurais (Estrada Betaun)	\$ 35,000.00
Viqueque	Viqueque Villa	Uma Quic	Posu (Posu Badak)	
Viqueque	Viqueque Villa	Bahalarau-Ain	Eskola Primaria	\$ 44,250.00
Viqueque	Viqueque Villa	Bahalarau-Ain	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Viqueque	Viqueque Villa	Uma Uain Leten	Eskola Primaria	\$ 44,000.00
Viqueque	Viqueque Villa	Uma Uain kraik	Posu (Posu Badak)	\$ 44,250.00
Viqueque	Viqueque Villa	Uma Uain kraik	Estrada Rurais (Estrada Britas)	
Viqueque	Viqueque Villa	Fatu Dere	Eskola Primaria	\$ 39,500.00
Viqueque	Viqueque Villa	Maluro	Mini Merkadu	\$ 39,500.00
Viqueque	Viqueque Villa	Maluro	Posu (Posu Badak)	
Viqueque	Viqueque Villa	Bibileo	Eskola Infantil	\$ 44,250.00

Viqueque	Viqueque Villa	Bibileo	Posu (Posu Badak)	
Viqueque	Viqueque Villa	Bibileo	Residencia ba Professores	
Viqueque	Viqueque Villa	Carau balu	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	\$ 44,500.00
Viqueque	Viqueque Villa	Carau balu	Estrada Rurais (Estrada Britas)	
Viqueque	Lacluta	Laline	Residencia Pessoal Saude	\$ 48,750.00
Viqueque	Lacluta	Laline	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Eskola	
Viqueque	Lacluta	Ahick	Estrada Rurais (Estrada Britas)	\$ 44,000.00
Viqueque	Lacluta	Ahick	Sistema Bee Mos - Gravitasaun	
Viqueque	Lacluta	Ahick	Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sede Suco	
Viqueque	Lacluta	Ahick	Galeria Kuadrado (Box Culvert)	
Viqueque	Lacluta	Dilor	Perfurasaun ba Posu (Drilling Well)	\$ 44,000.00
Viqueque	Lacluta	Dilor	Drenazen - Hada Fatuk	
Viqueque	Lacluta	Uma Tolu	Drenazen - Hada Fatuk	\$ 39,500.00
27				\$ 590,750.00
Total Projetu				\$ 8,544,000.00


Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

Hamutuk ita dezenvolve nasaun

Dezemburu 2015

Orsamento PNDS neebe aloka ba iha faze 1 ho Montante \$7,515,000.00

Progresu implementasaun Faze I

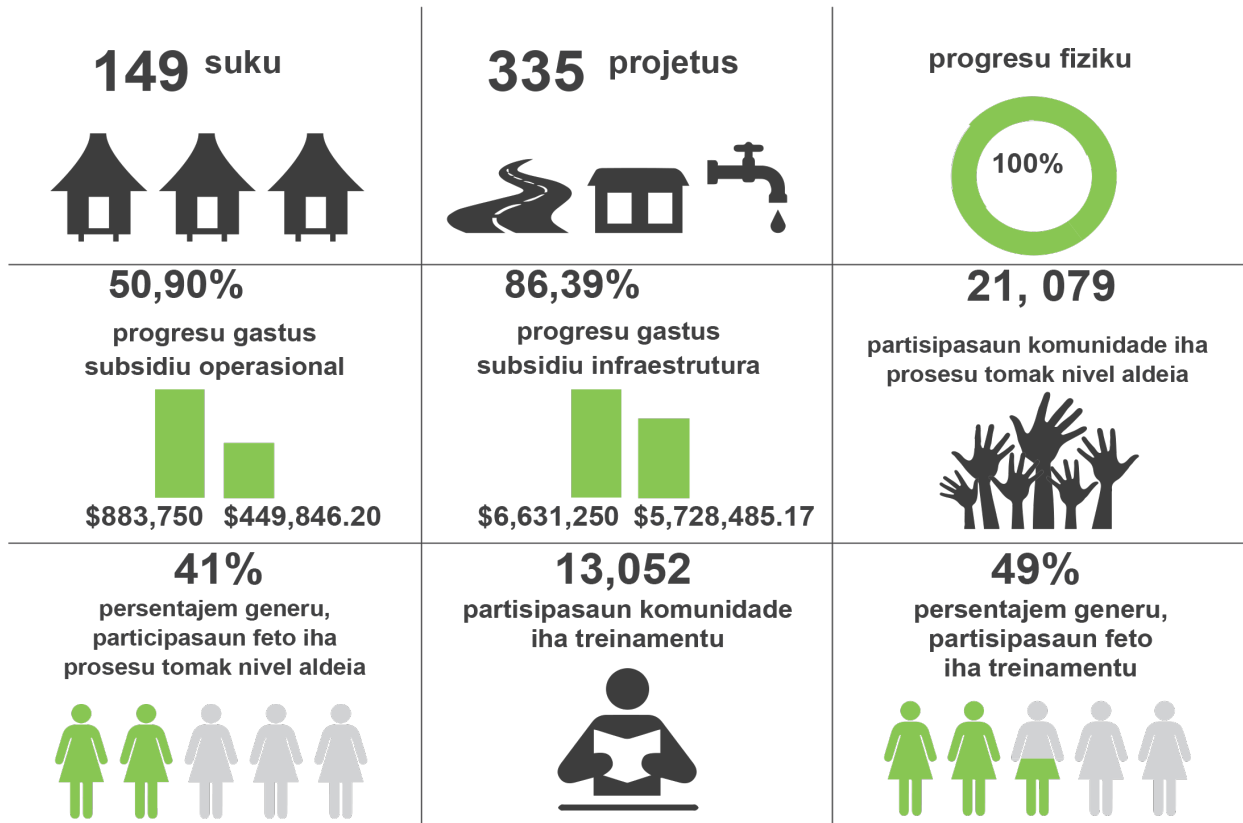

Total alokasaun kada sektoral

\$2, 014, 144 =  120 Be'e mós no saneamento

\$351, 150 =  18 Edukasaun, kultura no desportu

\$172, 452 =  10 Saúde

\$1, 358, 082 =  54 Dalan, ponte, no kontrolo de cheias

\$288, 251 =  14 Agrikultura, siguransa alimentar no buka moris

\$2, 447,168 =  119 Sektor seluk

Rezultado xave ba dezempeñu 2020

1 Hametin sistema sira GTL nian hodi aselera PNDS nia implementasaun direta.

2 Hasa'e komunitade nia partisipasaun no kapasidade hodi halo planeamentu no jere infrastrutura lokál.

3 Infraestrutura ho kualidade di'ak harii no mantein ona husi komunitade sira.

*projesau Dezemburu 2015




www.pnds.gov.tl

Aileu

Ainaro

Baucau

Bobonaro




Covalima

Dili

Ermera

Lautem




Liquiça


Manatuto

Manufahi

Oecusse



Viqueque




*atual Dezembro 2015

Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

Hamutuk ita dezenvolve nasaun

Dezemburu 2015

Orsamento PNDS neebe Aloka ba iha Faze 2 ho Montante \$4,560,000.00
Progresu implementasaun Faze 2

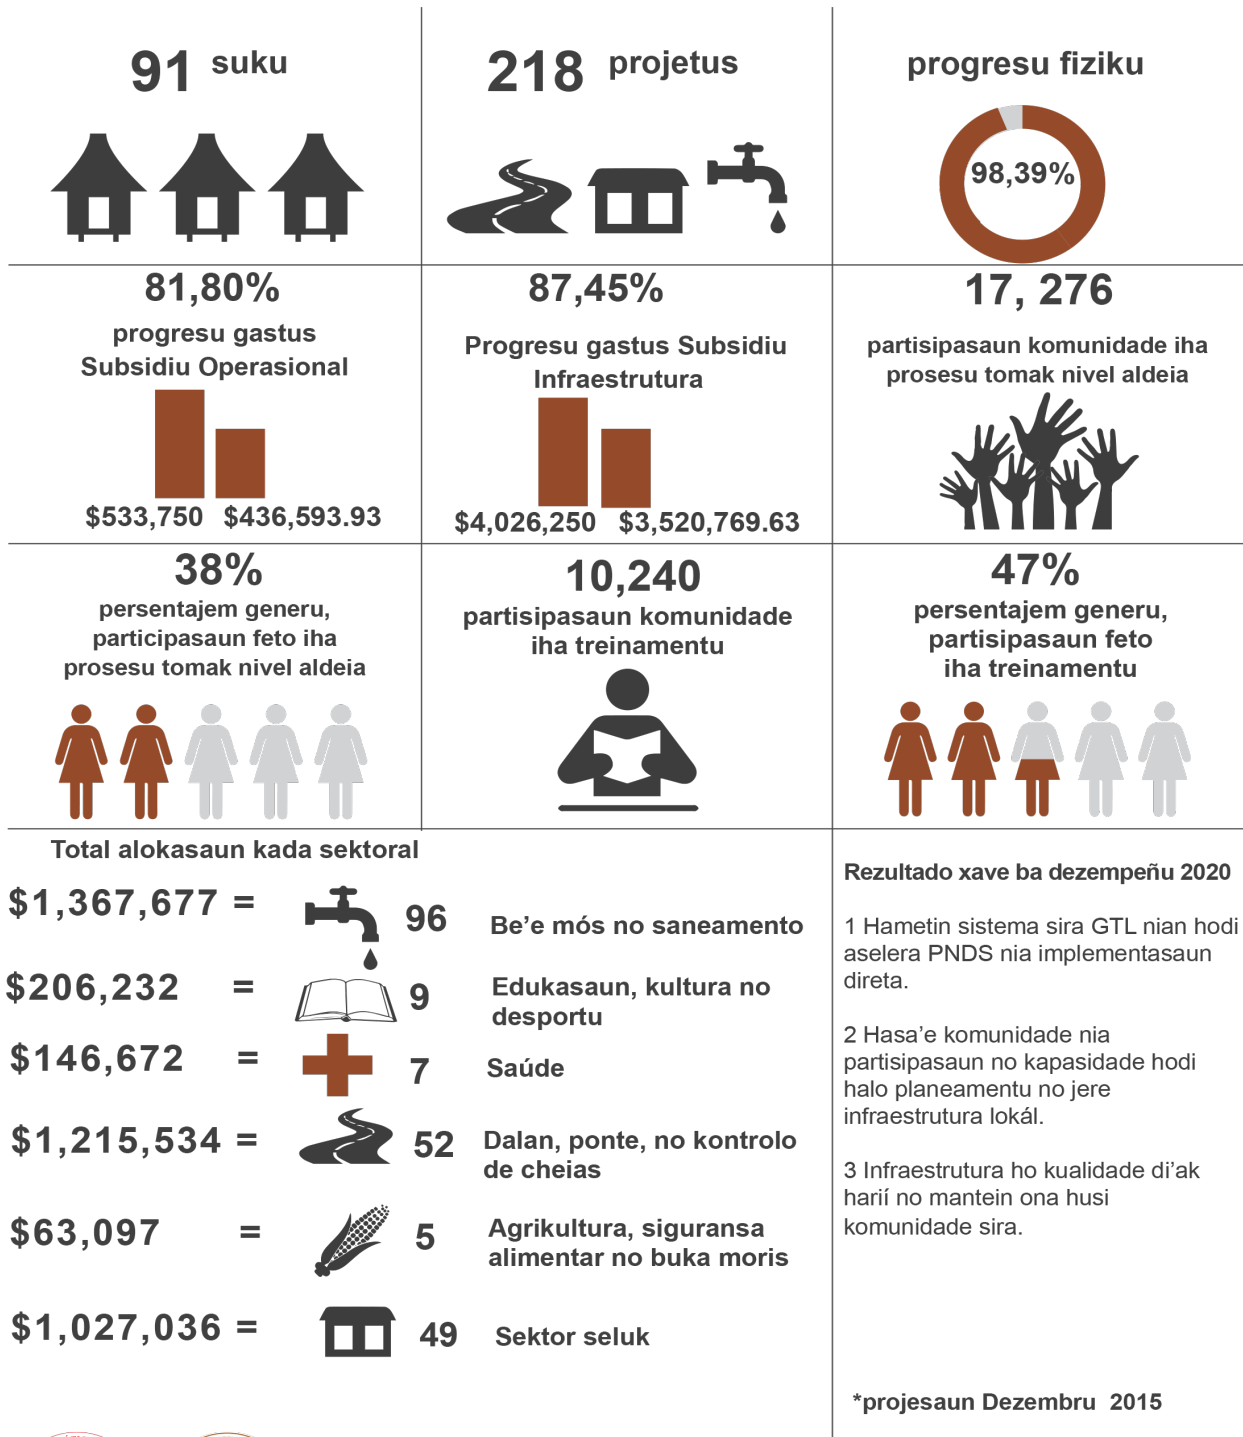

www.pnds.gov.tl

Aileu

Ainaro

Baucau

Bobonaro




Covalima

Dili

Ermera

Lautem



Liquiça


Manatuto

Manufahi

Oecusse



Viqueque



*atual Dezembro 2015


Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

Hamutuk ita dezenvolve nasaun

Dezembu 2015

Orsamento PNDS neebe aloka ba iha Faze 3 ho Montante \$9,740,000.00

Progresu implementasaun Faze 3

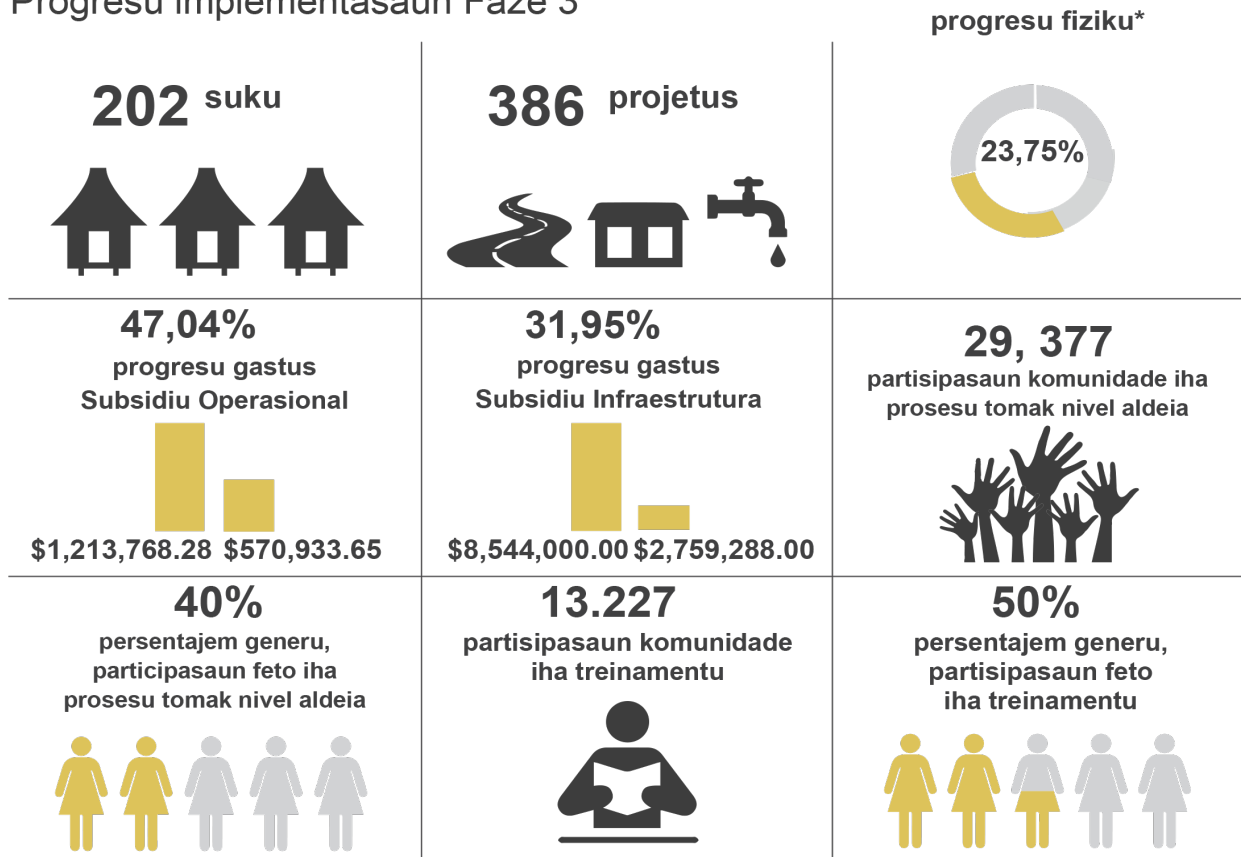

\$2,847,546 =  173 Be'e mós no saneamento

\$1,203,718 =  32 Edukasaun, kultura no desportu

\$272,667 =  12 Saúde

\$3,585,244 =  157 Dalan, ponte, no kontrolo de cheias

\$414,009 =  15 Agrikultura, siguransa alimentar no buka moris

\$228,887 =  0 Sektor seluk

Indikadór xave ba dezempeñu 2020

1 Hametin sistema sira GTL nian hodi aselera PNDS nia implementasaun direta.

2 Hasa'e komidade nia partisipasaun no kapasidade hodi halo planeamentu no jere infraestrutura lokál.

3 Infraestrutura ho kualidade di'ak harii no mantein ona husi komidade sira.

*projesaun Dezembu 2015




www.pnds.gov.tl

Aileu

Ainaro

Baucau

Bobonaro




Covalima

Dili

Ermera

Lautem




Liquiça


Manatuto

Manufahi

Oecusse



Viqueque



*atual Dezembru 2015



República democrática De Timor Leste
Ministerio Planeamentu e Investimentu Estratégico
Ministerio Administração Estatal



PLANU ASAUN ANUAL BA IMPLEMENTASAUUN PROGRAMA PNDS 2016

Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meta Anual	Departementu
Outcome 1: HAMETIN PNDS NIA SISTEMA, PROSESU NO PROSEDIMENTU HODI FÓ IMPLEMENTASAUUN DIRETA BA KOMUNIDADE			
Subsidiu Infraestrutura no Operacionais transfere ba 442 suku	Osan Infraestrutura no Operasional transferidu ba 442 suku	442	Implementasaun
Planu detail ba orsamentu ba 442 suku	Alokadu orsamentu tuir katégoria	442	Implementasaun/Finansa
Halo rekrutamentu ba funsionarius foun	Preense vaga hotu	30	RU
Halo formasaun ba funsionariu PNDS iha area tekniku, fasilitasaun komunidadade, tecnologia da Informasaun, lingua ingles no portugûês iha nível nacional no município.	Fungsionários PNDS (90 pessoas) hetan kapasitasaun iha area tekniku, fasilitasaun komunidadade, tecnologia da Informasaun, lingua ingles no portugûês iha nível nacional no município.	90 iha nivel nasional no município	RU

Outcome 2: HASA'E PARTISIPASAUN KOMUNITÁRIA NO KAPASIDADE ATU HALO PLANEAMENTU NO JERE INFRAESTRUTURA LOKÁL NO EZIJE GOVERNUN ATU RESPONSABILIZA BA NIA ASAUN.				
Funshonariu PND5 fô apoio tekniko (Treinamentu no Formasaun) ba Ekipa Jestaun Suku (EJS) atu implementa PND5 tuir siklu no regulamentu PND5 nian	EJS hetan formasaun iha areas de planeamento, finanças, liderança, operação e Manutenção. 4862 pesoas husi membru EJS hetan treinamentu refleksaun	4862	Implementasaun	
Halo Sosiaizasaun Progrma iha nivel nasional no sub-Nasional	Kompletu iha nivel nasional no sub-nasional	13 Municipiu no 65 PA	Implementasaun	
Outcome 3: INFRAESTRUTURA HO KUALIDADE DI'AK HARIÍ NO MANTEIN ONA HUSI KOMUNIDADE SIRA.				
Monitorizasaun ba aktividade PND5 atu asegura atividade teknika no finanseira kumpre ho politika PND5 nian	Progresu ba projeitus hotu husi comunidade hetan monitorizasaun husi PND5	442	Imple & M&A	
	Halo monitorizasaun ba 442 sukus			
Outcome 4: PLANEAMENTU, KORDENASAUN NO KOMUNIKASAUN HODI HAMOSU IMPLEMENTASAUN PROGRAMA NEBE'E EFETIVU NO KUALIDADE DIAK				
Realiza kordenasaun no komunikasaun entre PND5 nasional no municipiu, no ho	Realiza enkontru kordenasaun iha nivel nasional no municipiu	80 iha nivel nacional	Implementasaun, M&E, Komunikasaun	

seitor relevante hotu ba implementsaun PNDS	80 pessoas participa iha enkontru kordenasaun iha nivel nasional	120 iha nivel municipiu	
	120 pessoas participa iha enkontru kordenasaun iha municípios.		
Outcome 5: JÉNERU, INKLUZAUN SOSIÁL, AMBIENTE NO DEFISIÉNSIA INTEGRADU IHA PNDS NIA ESTRATÉJIA SIRA, PLANU UNIDADE, DEPARTAMENTU NO INDIVIDUÁL			
Dezenvolve estratejia ba inklusaun sosial (inklui defisiensia) no planu asaun	Finaliza estratejia inklusaun sosial	Hetan aprovasaun	Implementasaun
Reve no hadia (update) planu aksaun anual jeneru nian ba 2016	Planu aksaun jeneru ba 2016	Hetan aprovasaun	Implementasaun



FAZE I	FAZE II	FAZE III
149	91	149

PLANU SERVISU GLOBAL PNDS (2016)

Etapas Siklu PNDS	Atividades	2016											
		Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Set	Out	Nov	Dez
1	Socializasaun iha Nivel Municipio no Postu Administrativu	Faz.1s2 Faz.2s2							Faz.3s2				
2	Socializasaun iha Aldeia no Suku												
2	Formasaun (EJS) Re-estruturasaun no Avaliasaun	Faz.1s2 Faz.2s2								Faz.3s2	Faz.3s2		
3	Assina Akordu Subsidiu Annual							Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2	Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2				
3	Loke Konta Bankaria Suku												
3	Transfere 100% Fundus Operasional ba Suku							Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2					
4	Treinamentu EJS: Modul D (Jestaun Finansa Parte 1)										Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	
4	Treinamentu EJS: Modul C (Orientasaun ba Fasilitador Suku)										Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	
4	Treinamentu EJS: Modul A (Introduasaun no Planeamentu)										Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	
4	Treinamentu EJS: Modul B (Kapasitasaun Feto Parte 1)										Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	
4	Treinamentu EJS: Modul F (Kapasitasaun Feto parte 2)										Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	
5	Desizaun Prioridades Aldeia no Suku (Inklui Mapamentu no Analiza)							Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2	Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2				
4	Treinamentu EJS: Modul E (Hakerek Proposta)	Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1										Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	
6	Prepara no Verifika Proposta Projeitu (KRT)	Faz.1s2 Faz.2s2								Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2			
7	Survey no Dezeno (Geografika, material, Lista Traballadores & Insentivu Traballadores)	Faz.1s2 Faz.2s2								Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2	Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2		
7	Prepara planu Detaillu (BOQ, Orariu, & O&M)	Faz.1s2 Faz.2s2								Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2	Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2		
8	Finaliza Proposta & Aprovasaun Distritus	Faz.1s2 Faz.2s2									Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2	Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2	
8	Assina Akordu Implementasaun Projeitu	Faz.1s2 Faz.2s2										Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2	
8	Hatama Rekizisaun Pagamentu ba Fundus Infraestrutura	Faz.1s2 Faz.2s2										Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2	
4	Treinamentu EJS: Modul G (Jestaun Konstrusaun)				Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1							
4	Treinamentu EJS: Modul H (Jestaun Finansas Parte 2)				Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1							
9	Planu Aprovizionamentu	Faz.1s2 Faz.2s2										Faz.1s3 Faz.2s3 Faz.3s2	
4	Treinamentu EJS: Modul I (Monitorizasaun no Akontabilidade)				Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1	Faz.1s2 Faz.2s2 Faz.3s1							
	Transfere Fundus Infraestrutura ba Konta Bankaria Suku			Faz.1s2	Faz.1s2								



9				Faz.2s2	Faz.2s2														
9	Aprovizionamentu: Pedido Kotasaun no Loke Kotasaun				Faz.1s2														
					Faz.2s2														
9	Konstrusaun: Mobiliza Traballadores & Material				Faz.1s2	Faz.1s2													
					Faz.2s2	Faz.2s2													
10	Sertifikasaun Premeiro no Akontabilidade					Faz.1s2	Faz.1s2												
						Faz.2s2	Faz.2s2												
4	Treinamentu EJS: Modul J (Operasaun no Manutensaun)										Faz.1s2	Faz.1s2							
											Faz.2s2	Faz.2s2							
4	Treinamentu EJS: Modul K (Jestaun Finansa Parte 3)										Faz.3s1	Faz.3s1							
											Faz.1s2	Faz.1s2							
4	Training CMT: Modul L (Monitoring and OM)										Faz.2s2	Faz.2s2							
											Faz.3s1	Faz.3s1							
11	Kompleto Konstrusaun Projeitu					Faz.1s2	Faz.1s2												
						Faz.2s2	Faz.2s2												
12	Sertifikasaun & Enkontru Akontabilidade Final					Faz.3s1	Faz.3s1												
						Faz.1s2	Faz.1s2												
12	Auditoria Final					Faz.2s2	Faz.2s2												
						Faz.3s1	Faz.3s1												
12	Transferensia Asset ba O&M					Faz.1s2	Faz.1s2												
						Faz.2s2	Faz.2s2												
						Faz.3s1	Faz.3s1												

