



Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku
National Programa for Village Development

Relatóriu Mensal
Abril 2016



Rua de : Bedik-Hun
Dili- Timor Leste

Programa Nacional de Desenvolvimento Sucos PNDS



OFFÍCIO

No: ____/PNDS.MPIE-MAE/VI/2016

Hato'o ba :

: Sua Ex. Cia Ministro Planeamentu e Investimentu Estratéjico,

: Sua Ex. Cia Ministro Administração Estatal,

: Sua Ex. Cia Vicê Ministro Administração Estatal,

Asuntos :


: Relatoriu Progresu Implementasaun PNDS – Abril 2016

Excelencias,

Relasiona ho asunto nebe mensionado iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio mensal ba fulan Abril 2016 konaba progresu ezekusaun Faze , II, III no Faze I siklu 2 no progresu global implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) bazeia ba relatóriu husi Komunidade.

Ida ne'e mak relatorio mensal PNDS, ba sua. Excêlências sira nian konsiderasaun, Obrigada

Dili, 07 Junho 2016


Dulce Guterres Junior
Diretora PNDS

CC ba :

- EX.^{mo} Diretor Jeral Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (DG-ADN),
- EX.^{mo} Diretor Jeral Desentralizasaun Administrativa (DG-DA),
- EX.^{mo} Diretor Jeral Servicos Cooperativos (DG-SC),
- Arquivo



Sekretariadu PNDS:
Ministério do Planeamento e
Investimento Estratégico
Rua de : Bedik-Hun, Fatuhada-Timor Leste
E-mail : info@pn.ds.gov.tl
www.pn.ds.gov.tl

KONTEUDU

1. Progresu gastu subsidiu husi relatorio komunidadade	2
2. Progresu actividades faze II, III & faze I siklus 2	4
3. Dezafius	11
4. Rekomendasaun	11


1. PROGRESU GASTUS NO FISIKU HUSI KOMUNIDADE

Esplikasaun konaba progresu gastu ezeekusaun orsamentu PNDS ba Faze II & Faze III No Faze I Siklus 2, fulan Abril 2016 mak hanesan tuir mai ne'e :


» FAZE II

Progresu ezeekusaun iha nivel comunidade ba iha 91 suku iha fulan Abril. Subsidiu Operasional gastu ona **\$442,105.72** ou **82.83%** husi total **\$533,750.00** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$3,598,572.41** ou **89.38%** husi total Orsamentu **\$4,026,250.00**. Atu hatene percentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e:

Progresu Fisiku No Gastu Subsidiu Infraestrutura Kada Municipio -Faze II,
Abril 2016

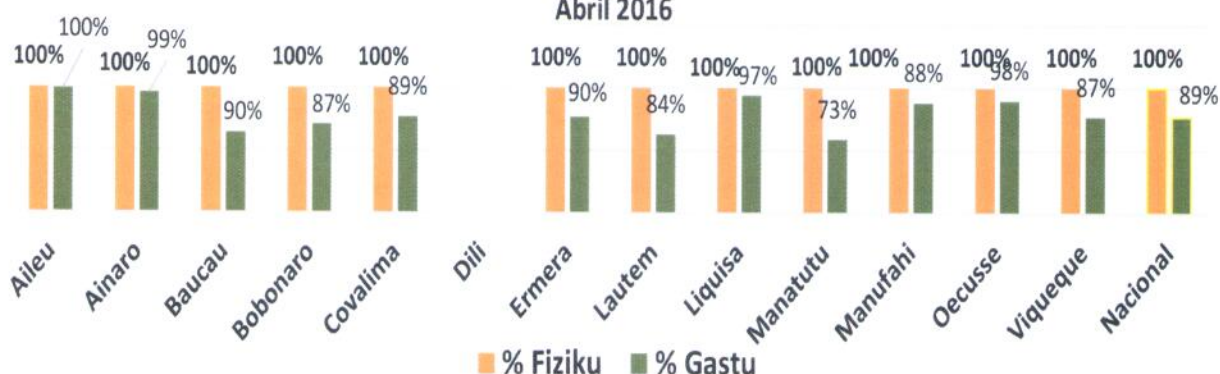


Osan Subsidu Infraestrutura gastu kada kategoria -
Faze 2 To'o Abril 2016

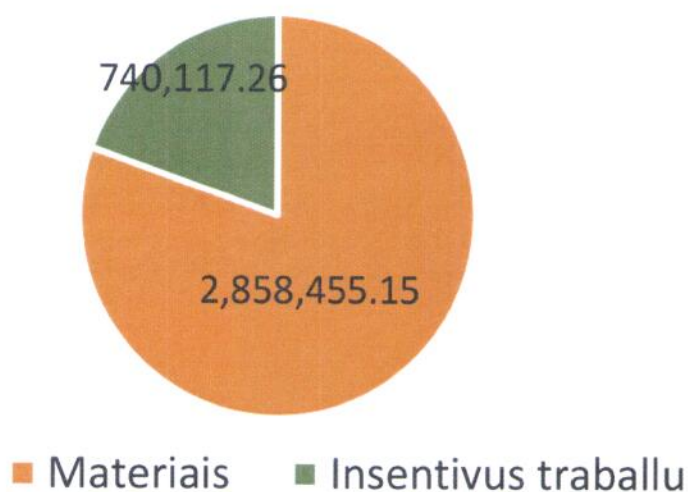

» FAZE III

Progresu ezekusaun iha nivel comunidade ba iha 202 suku iha fulan Abril, Subsídium Operasional gastu ona **\$596,318.40** ou **49.13%** husi total **\$1,213,768.28** no Subsídium Infraestrutura gastu ona **\$5,801,607.88** ou **67.18%** husi total Orsamentu **\$8,635,605.42**. Atu hatene percentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :


Progresu Fisiku no Gastus Fundus Infraestrutura Kada Municipio - Faze III

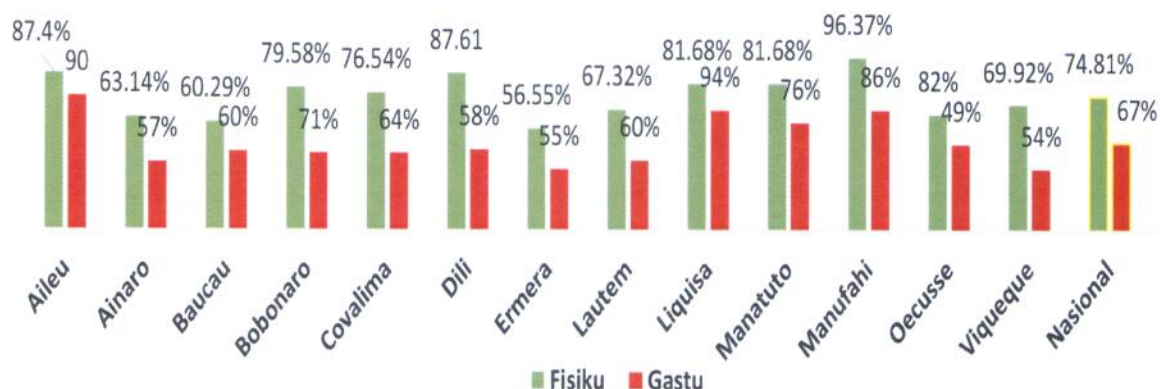

» FAZE I SIKLU 2

Orsamentu ba Faze I Siklus 2 hamutuk **\$1,316,758.95** no gastu ona **\$524,403.55** ou **39.83%**. Orsamentu restu husi Faze I siklus 1 ne'ebe mak atu suporta ba aktividade & progresu Faze I Siklus 2 hamutuk **\$433,903.80**. Atu hatene percentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

Gasta Subsídium Operasional Suku iha Municipiu no Rata-rata Nasional -Faze I Siklus 2, Abril 2016

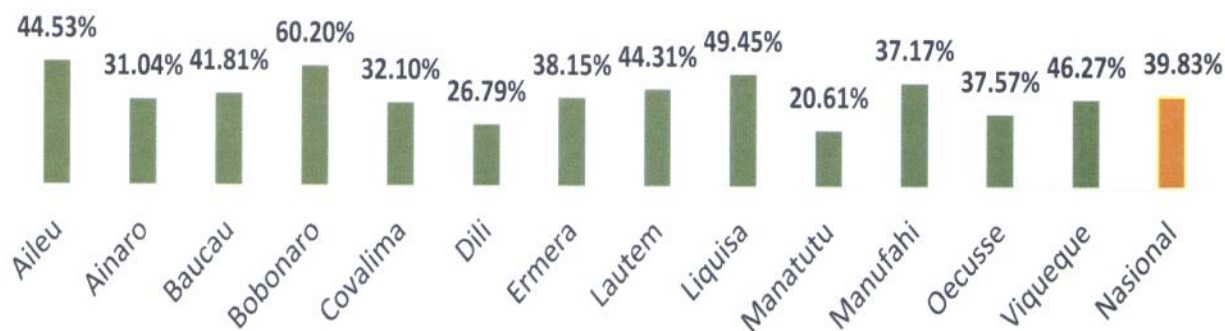


2. PROGRESU AKTIVIDADES

Iha fulan Abril 2016, progresu implementasaun PNDS ne'ebe mak elabora kona ba progresu atividades no Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir Siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne'e :

» FAZE II


91 Suku ho 218 projetus kompleta hotu ona konstrusaun. Projetu sira ne komesa utiliza husi comunidade. Atu hatene grafiku numeru benefisiarius ba iha Faze II Hare grafiku tuir mai ne'e :

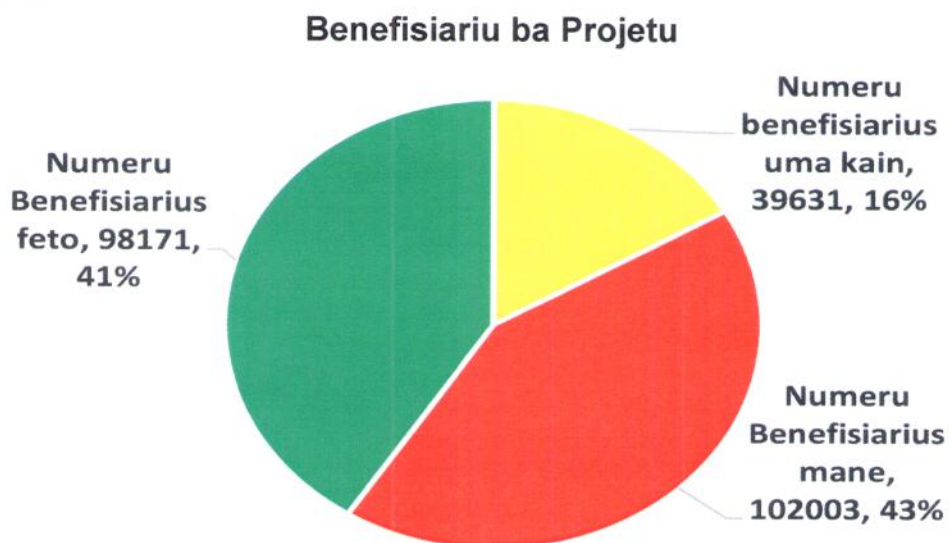

» FAZE III

Progresu implementasaun ba iha suku 202 no progresu atividades tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 10 (sertifikasaun primeiru no enkontru akontabilidade 50%). Esplikasaun detailu mak hanesan tuir mai ne'e :

Projetu Final Faze III

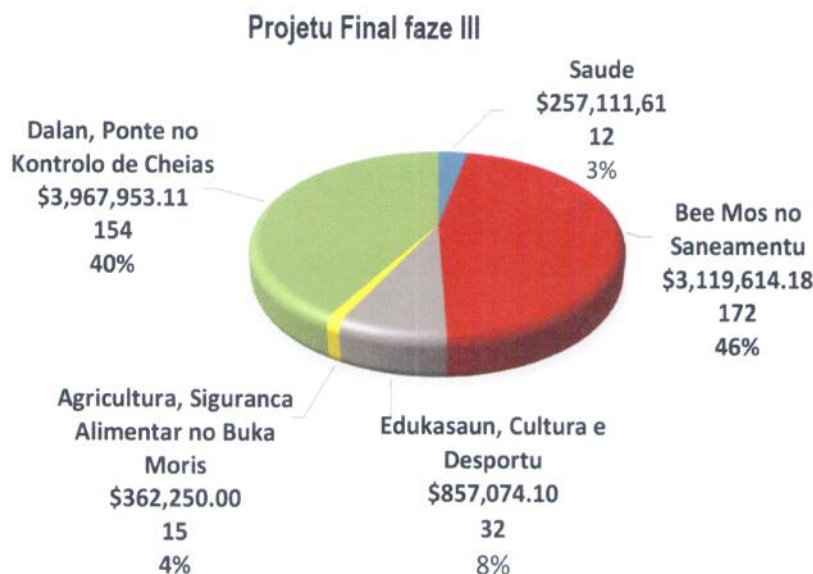

Hare ba grafiku projetu Final faze III iha sorin, ita hare katak sektor Be'e mo'os no Saneamento hetan porsentu bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.


△ Treinamentu ba modul **A** kompleta ona iha **suku 201**, no sukus nebe mak halao tiha ona Treinamentu modul hanesan : (**B**= suku 198, **C**= suku 188, **D**= suku 192, **E**= suku 165, **F**= suku 165, **G**= suku 153, **H**= suku 140, no **I**= 109, **J**= suku 52, **K**= suku 48, **L**= suku 30).

Total_Partisipasaun_Generu_Treinamento EJS_Modul

Faze III

Modul Treinamento

- A: Introdusaun no Planeamento
- B: Kapasitasaun Feto 1
- C: Orientasaun ba Fasilitator Suku
- D: Jestaun Finansas 1
- E: Hakerek Proposta
- F: Kapasitasaun Feto 2
- G: Jestaun Konstrusaun
- H: Jestaun Finansas 2
- I : Monitorizasaun no Akontabilidade
- J: Operasaun no Manutensaun
- K: Jestaun Finansas 3
- L: Monitorizasaun no O&M

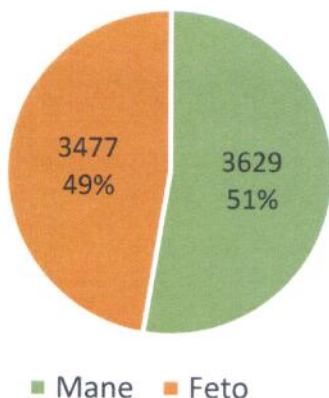

Grafiku iha sorin, representa dadus participante generu iha treinamentu ba modul A-L faze III. Grafiku iha sorin hatudu katak persentajen mane bo'ot liu kompara ho persentajen feto.

Konstrusaun Estrada Rurais, Implementa liu husi Programa PNDS



Komunidade hala'o
hela servisu ba iha projetu
konstrusaun estrada rurais,
iha Suku Deudet, Postu
Administrativu Lolotoe,
Munisipiu Bobonaro


- 385 Projetus implementa hotu ona iha 202 suco no Progresu rata-rata atinji ona 74.81%.
- Iha 202 Suku, Suku 145 mak halo ona Enkontru Akountabilidade primeiru no 57 Suku sei prosesu konstrusaun

» FAZE I Siklu 2

Faze I siklu 2 Suku sira nebe mak finaliza ona sira nian siklu 1, no agora dadaun, progresu atividade tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 8 (hatama Rekizisaun pagamentu ba fundo infraestrutura) . Esplikasaun klaru kona ba progresu implementasaun actividades Faze I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Abril 2016 maka hanesan tuir mai ne'e:

o Prioridade final Faze I Siklu 2


Prioridades_Final Faze I Siklu 2

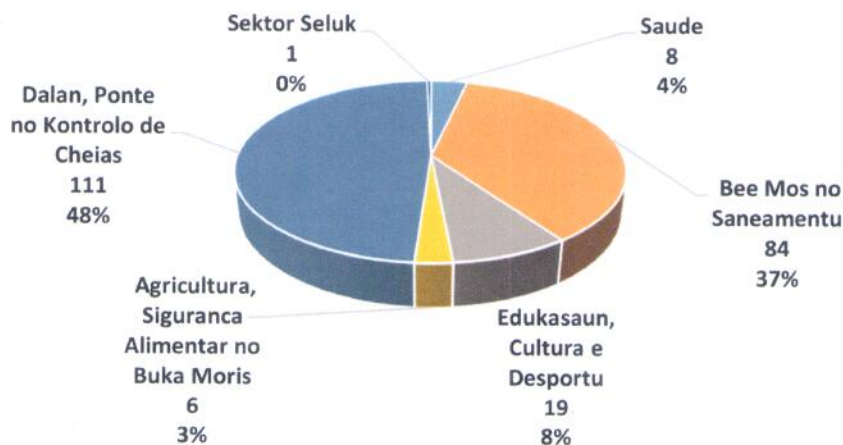

Hare ba grafiku determina Prioridade Final faze I Siklu II iha sorin, ita hare katak sektor dalan, ponte no kontrola cheias hetan porsentu boot liu kompara ho sektor sira seluk

- Treinamentu ba modul A kompleta ona iha **Suku 73**, no total suku nebe mak halao ona treinamentu ba modul **B= suku 73, C= suku 59, D= suku 49, E= suku 50, F= suku 51, G= suku 48), H= suku 48, I= suku 23, J= suku 14, K= suku 14, L= suku 18)**

Total Partisipante EJS ba Modul Treinamentu Faze 1 siklu 2



■ Feto ■ Mane

Grafiku iha sorin reprezenta total partisipasaun EJS modul treinamentu A-L ba Faze I siklu II. Se ita hare ba grafiku iha sorin katak, percentajen Mane bo'ot liu kompara ho percentajen Feto

Treinamentu ba Ekipa Jestaun Suku (EJS)



Treinamentu modul J, K, L, ba ekipa jestaun suku Postu Administrativu Turiscaí Manufahi.

- Transferensia fundu 50% ba iha konta bankaria 31 sucus halao ona
- Ba 118 suku agora dadaun prepara ona Rekizisaun pagamentu ba fundo infraestrutura.

» ATIVIDADE GERAL SECRETARIADO TECNICO PNDS (ST. PNDS)

Iha fulan Abril 2016, progresu Atividades PNDS ne'ebe mak elabora kona ba atividades no Atividades prinsipal husi ST. PNDS mak hanesan tuir mai ne'e :

Kapasitasaun/ Formasaun ba Funsionario PNDS

- Fromasaun ba Diretor Munisipiu, Xefe Departementu no Funsionario Nasional konaba Integrated Strategic Finance and Program Planning (ISFPP Etapa III) iha SATUNAMA (Jogja- Indonesia). Total formandos hamutuk 8;



Treinamentu ISFPP iha Jogjakarta-Indonesia

- Kursu Lian Portuguesa ba Diretora, Xefe Departementu no Diretor Munisipiu 25 Desember 2016 iha LELI. Total Partisipante hamutuk 9;
- Treinamentu ba Kontabilista Munisipiu iha area Aprovisionamentu no ToT durante loron 8 iha ETDA. Total Partisipante hamutuk 26;
- Treinamentu ba Fasilitator Teknika Postu Administrativu (FTP) iha area formatu Tekniku no konstrusaun durante loron 17 iha Tibar. Total Partisipante hamutuk 121;
- Treinamentu ba Fasilitador Finansa Postu Administrativu (FFPA) konaba prosesu aprovisionamentu durante loron 4 iha Munisipiu Aileu, Ermera, Lautem, Manufahi, Bobonaro no Manatuto. Total Formandos hamutuk 75.



Treinamentu Tekniku ba Fasilitador Tekniku Postu Administrativu 65 iha Sentru Formasaun Tibar

Atividade Suku Vizita Malu (Suku Cross Visit Activity)

Atividade Suku Vizita malu, nia objetivu atu troka ideias ba malu husi suku ida ho suku seluk kona-ba suksesu implementasaun programa PNDS. Lisaun positivu ne'ebe hetan husi atividade ne'e bele sai hanesan referensia ida ba suku sira atu nune'e bele hadi'ak liu tan implementasaun programa PNDS. Suku visita malu; Munisipiu Aileu, Ermera no Manatuto partisipa husi Administrador Postu, Chefe Suco no EJS durante loron 2 iha Munisipiu Aileu. Total Partisipante 40 Partisipantes ne'ebe partisipa iha atividade ne'e mak : Administrador Postu Administrativu, Lider Komunitariu nomos Ekipa Jestaun Suku (EJS).



Autoridade Lokal, Lider Komunitariu ho Ekipa Jestaun Suku (EJS), partisipa iha atividade Suku Visita malu

Enkontru Kordenasaun



Enkontru kordenasaun hanesan atividade regular ne'ebe sempre akontese iha fulan-fulan, objetivu husi atividade ne'e mak atu hametin liu tan lina kordenasaun servisu entre funsionario hotu, tantu iha nivel nasional, munisipiu nomos postu administrativu.

- Enkontru koordenasaun Distrito ba Fulan Maio nian nebe halao iha dia 28 Abril 2016 iha ETDA nebe'e partisipa husi Diretora PNDS, Diretor Delegasaun 12 Municipio inklui mos Diretur REAO, Xefi Unidade Operasional no Xefi Unidade Administrasaun Finansa, Xefi Departementus, Asesores, parseiro FST/ Cardno no funsionario nasional. Total partisipante hamutuk 55 partisipante.

Atividade Komunikasaun

1. Kria publikasaun (Aktualiza informasaun ka notisia iha website PNDS);
2. Produs out line ba Relatóriu mensal fulan marsu nomos Trimestre I programa PNDS;
3. Design Brochure PNDS ba 2016;
4. Design Cover ba : MIS guide line, Manual Jestaun ba Finansas, Formatu PNDS, 2016, Mini Mata Dalan ba Pratika-A12 (Tratamentu Keixas);
5. Media Monitoring (Iha TVTL ho Jornal) no up date iha media Sumáriu kobertura iha shared folder komunikasaun;
6. Kordena ho DNPCS, kona-ba programa iha TVTL (Atualizasaun enkontru konsultativu iha MAE sei fo sai iha loron 13/05/2015);
7. Orgniza seminario konaba Progresu Implementasaun PNDS iha Faculdade Siénsia Sosisiais, Departamentu Dezenvolvimentu iha UNTL. Total Partisipante Hamutuk 223.

Estudante UNTL partisipa hela Seminario konaba Implementasaun Programa PNDS



3. DEZAFIUS

- Projeitu balu nebe'e implementa iha Suku seidauk tuir padraun tékniku PNDS.
- Komunidade iha suku balu ladun partisipa iha atividade enkontru akontabilidade
- Kestaun insentivu kontinua sai hanesan obstaklu ba iha suku balun.
- Lider komunidade iha suku balun seidauk iha kolaborasaun diak hodi partisipa iha implementasaun programa.
- Komunidade iha suku balun seidauk senti sai nain ba programa hanesan PNDS iha sira nian suku laran.
- Projeitu balun lao tarde tamba material konstrusaun tarde.

4. REKOMENDASIAUN

- Persija kontinua halo treinamentu ba EJS
- Ekipa PNDS sei halo sosialisasaun ka deziminasau program ba iha entidade hotu.
- Ekipa PNDS nasional no Municipiu kontinua haforsa halo monitoring ba iha suku hodi bele fo suporta ba Implementasaun.

