



Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

National Program for Village Development

Relatóriu Mensal Fevereiro 2016



Rua de : Bedik-Hun
Dili, Timor-Leste

Programa Nacional de Desenvolvimento Sucos PNDS



OFFÍCIO

No: 188/PNDS.MPIE-MAE/III/2016

Hato'o ba :

- : Sua Ex. cia Ministro Planeamentu e Investimentu Estratégico,
- : Sua Ex. cia Ministro Administração Estatal,
- : Sua Ex. Cia Vicê Ministro Administração Estatal,

Assuntos : Relatoriu Mensal Progresu Implementasaun PNDS – Fevereiro 2016


Excelencias,

Relasiona ho assunto nebe mensionado iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio mensal ba fulan Fevereiro 2016 konaba progresu ezelesaun Faze II, III no Faze I siklu 2 no implementasaun Programa Nasional Desenvolvementu Suku (PNDS) bazeia ba relatóriu husi Comunidade.

Ida ne'e mak relatorio mensal PNDS, ba sua. Excêlências sira nian konsiderasaun, Obrigada



Dili, 31. Marsu 2016


Dulce Guterres Junior
Diretora PNDS

CC ba :

- Ex.^{mo} Diretor Jeral Ajensia Desenvolvementu Nasional (DG-ADN),
- EX.^{mo} Diretor Jeral Desentralizasaun Administrativa (DG-DA),
- EX.^{mo} Diretor Jeral Servicos Cooperativos (DG-SC),
- Arquivo



Ministério do Planeamento e
Investimento Estratégico
Hudi Iaran, Fatuhada,
Dili, Timor-Leste
info@pn.ds.gov.tl

KONTEUDU


1. Progresu gastu subsidiu husi relatorio komunidad.....	2
2. Progresu aktividades faze II, III & faze I siklus 2.....	4
3. Dezafius.....	11
4. Rekomendasaun.....	11

1. PROGRESU GASTUS NO FISIKU HUSI KOMUNIDADE


Esplikasaun konaba progresu gastu ezelesaun orsamentu PNDS ba Faze II & Faze III No Faze I Siklus 2, fulan Febreiru 2016 mak hanesan tuir mai ne'e :

» FAZE II

Progresu ezelesaun iha nivel comunidade ba iha 91 suku iha fulan Febreiru. Subsidiu Operasional gastu ona \$ 436,069.53 ou 87.97% husi total \$ 533,750.00 no Subsidiu Infraestrutura gastu ona \$ 3,542,068.12 ou 87.97% husi total Orsamentu \$4,026,250.00. Atu hatene percentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

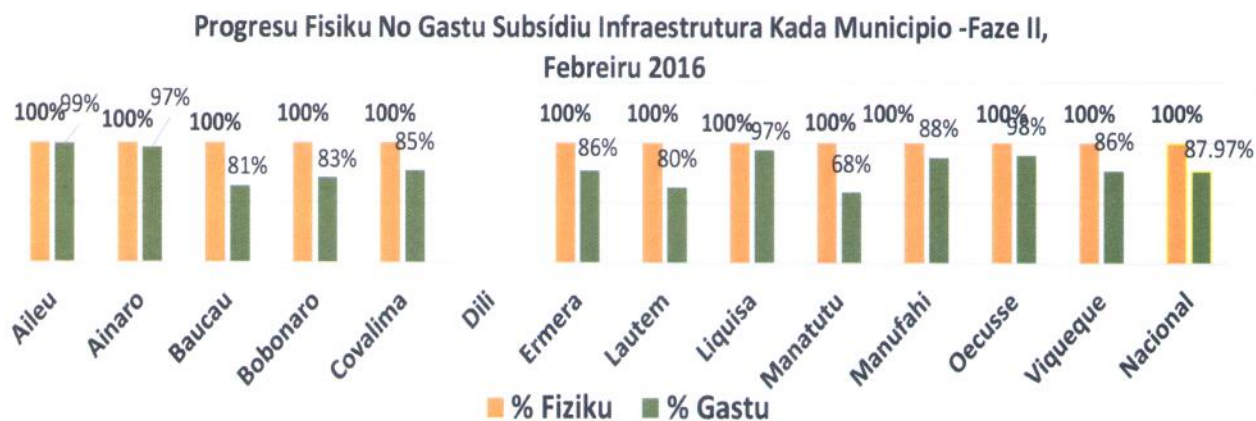


Osan Subsidiu Infraestrutura gastu kada kategoria - Faze 2 To'o Febreiru 2016

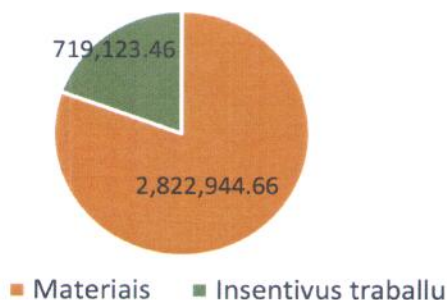

» FAZE III

Progresu ezekusaun iha nivel comunidade ba iha 202 suku iha fulan Febreiru, Subsídium Operasional gastu ona \$596,004.61 ou 49.10% husi total \$ 1,213,768.28 no Subsídium Infraestrutura gastu ona \$ 4,074,116.59 ou 47.18% husi total Orsamentu \$ 8,635,605.42. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai neê :


Progresu Fisiku No Gasta Fundus Infraestrutura Kada Municipio -Faze III Febreiru 2016

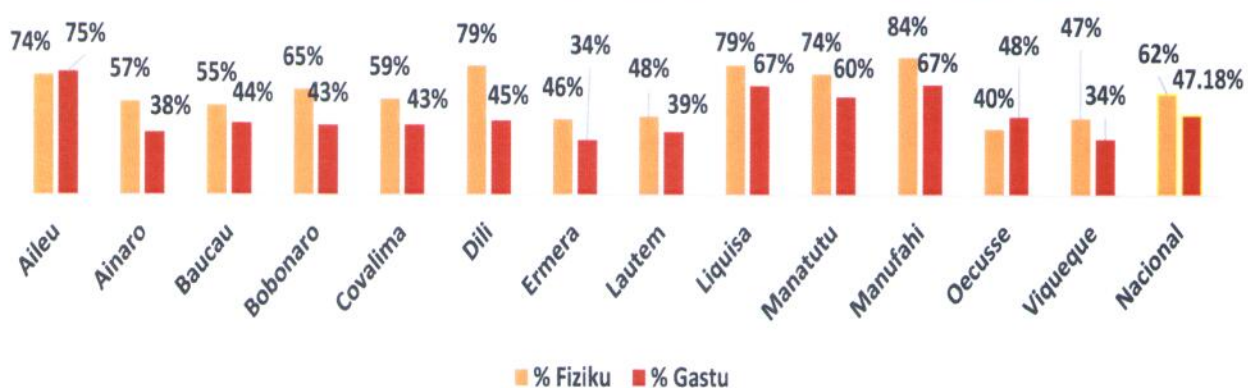

» FAZE I SIKLU 2

Orsamentu ba Faze I Siklus 2 hamutuk \$ 1,316,758.95 no gastu ona \$ 478,076.75 ou 36.31%. Orsamentu restu husi Faze I siklus 1 neêbe mak atu suporta ba aktividade & progresu Faze I Siklus 2 hamutuk \$433,903.80. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai neê :

Gasta Subsídium Operasional Suku iha Municipiu no Rata-rata Nasional -Faze I Siklus 2, Febreiru 2016

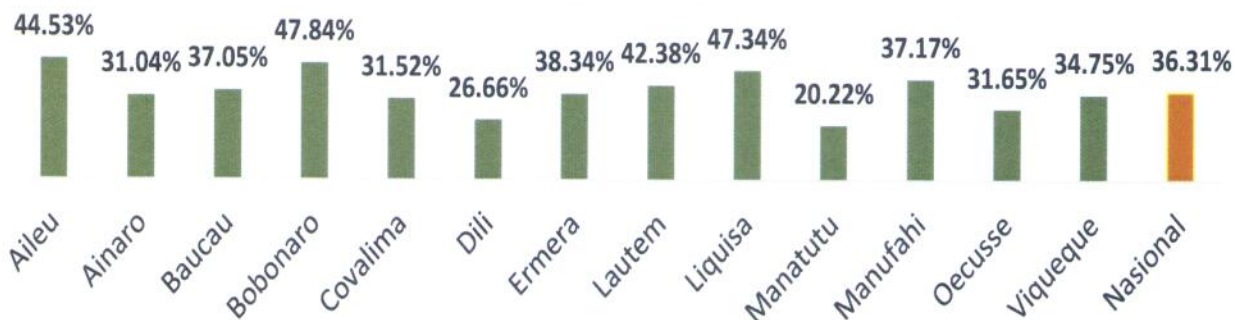


2. PROGRESU AKTIVIDADES

Iha fulan Febreiru 2016, progresu implementasaun PNDS ne'be mak elabora kona ba progresu atividades no Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir Siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne'e :

» FAZE II

Faze II implementa ba iha 91 suku ho total projetus hamutuk 218 projetus . Progresu atividade tuir siklu implementasaun, tama ona ba etapa 11 no 12 (kompleta konstrusaun no enkontru akontabilidade final). Esplikasaun detailu kona ba Progresu implementasaun atividades Faze II hanesan tuir mai ne'e :

o Projetu Final Faze II

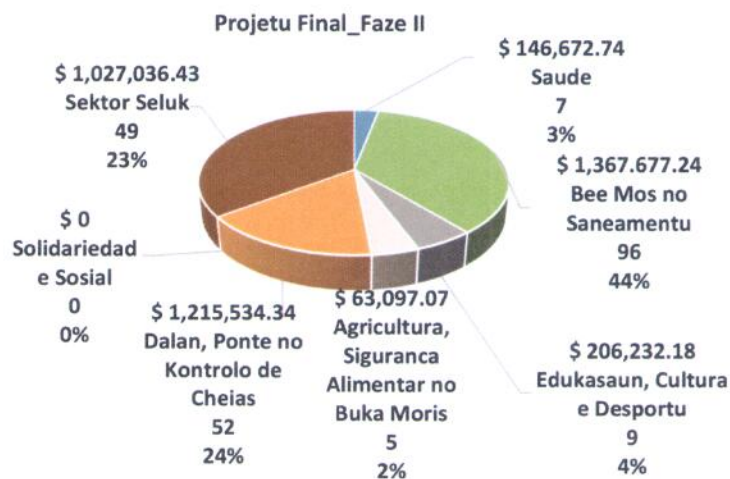

Hare ba grafiku projetu Final Faze II iha sorin, ita hare katak sektor Be'e mo'os no Saneamento hetan porsentu maka'as liu kompara ho sektor sira seluk.




- Progresu fisiku rata-rata nivel nasional 100%
- Enkontru akontabilidade final completa ona iha 91 suco.

» FAZE III

Progresu implementasaun ba iha suku 202 no progresu atividades tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 10 (sertifikasaun primeiru no enkontru akontabilidade 50%) . Esplikasaun detailu mak hanesan tuir mai ne'e :

o Projeto Final Faze III

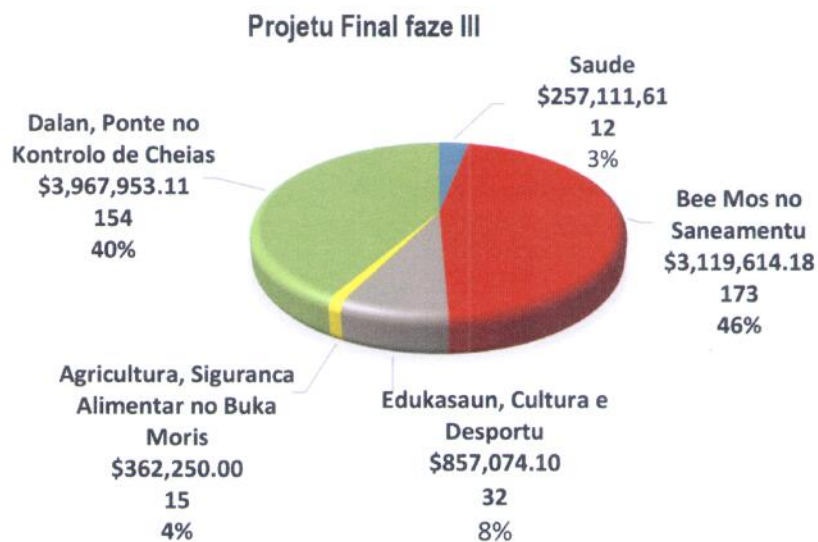

Hare ba grafiku projektu Final faze III iha sorin, ita hare katak sektor Be'e mo'os no Saneamento hetan porsentu bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.


Treinamentu ba modul A kompleta ona iha suku 201, no sukus nebe mak halao tiha ona Treinamentu modul hanesan : (B= suku 198, C= suku 188, D= suku 192, E= suku 165, F= suku 161, G= suku 153, H= suku 140, no I= 105, J= suku 17, K= suku 17, L= suku 11).

Total_Partisipasaun_Generu_Treinamento_EJS_Modul

Faze III


Modul Treinamento

- A: Introdusaun no Planeamento
- B: Kapasitasaun Feto 1
- C: Orientasaun ba Fasilitator Suku
- D: Jestaun Finansas 1
- E: Hakerek Proposta
- F: Kapasitasaun Feto 2
- G: Jestaun Konstrusaun
- H: Jestaun Finansas 2
- I : Monitorizasaun no Akontabilidade
- J: Operasaun no Manutensaun
- K: Jestaun Finansas 3
- L: Monitorizasaun no O&M

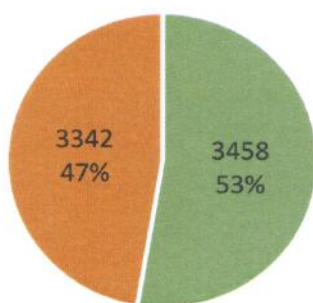

■ Mane ■ Feto

Grafiku iha sorin, reprezenta dadus partisipante generu iha treinamentu ba modul A-L faze III. Grafiku iha sorin hatudu katak percentajen mane bo'ot liu kompara ho percentajen feto.

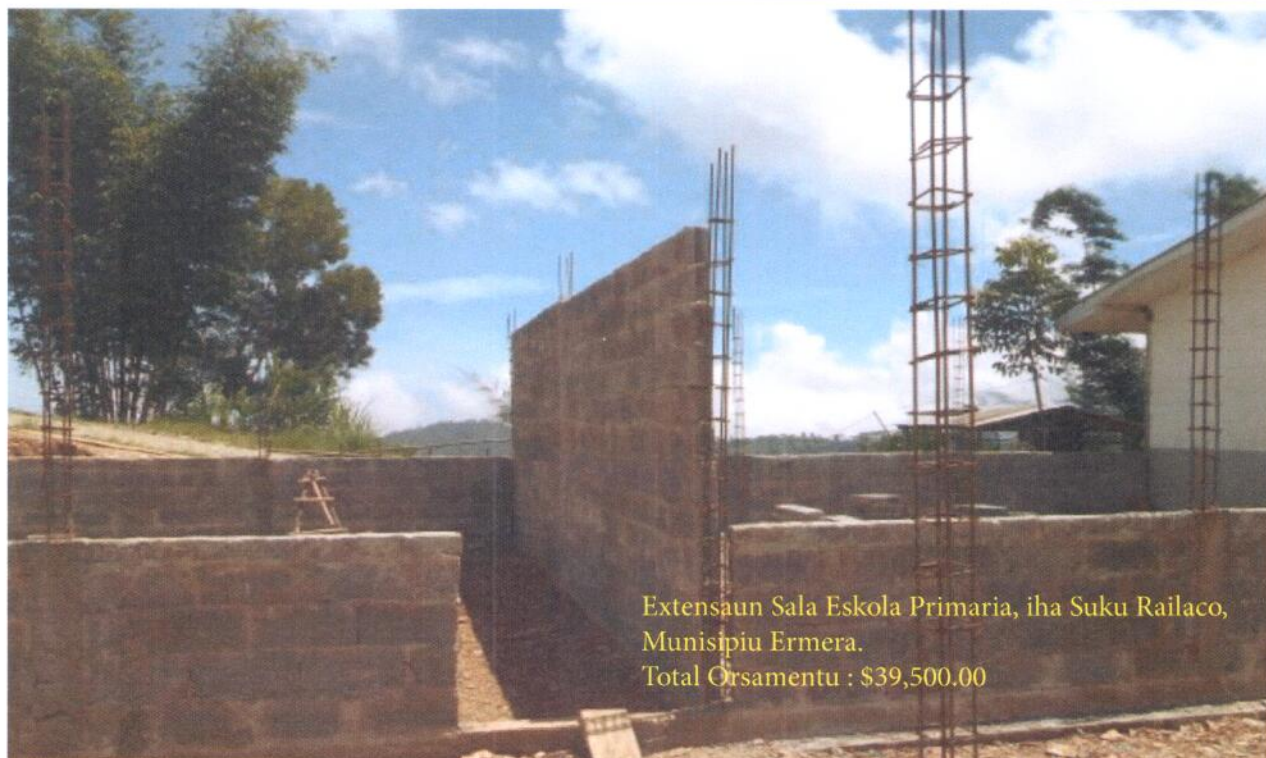


- 385 Projetus implementa hotu ona iha 202 suco no Progresu rata-rata atinji ona 62.10%.
- Iha 202 Suku, Suku 86 mak halo ona Enkontru Akountabilidade primeiru no 116 Suku sei prosesu konstrusaun

» FAZE I SIKLU 2

Faze I siklu 2 Suku sira nebe mak finaliza ona sira nian siklu 1, no agora dadaun, progresu atividade tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 8 (hatama Rekizisaun pagamentu ba fundo infraestrutura) . Esplikasaun klaru kona ba progresu implementasaun actividades FAZE I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Febreiru 2016 maka hanesan tuir mai ne'e :


o Prioridades Final Faze I Siklu II

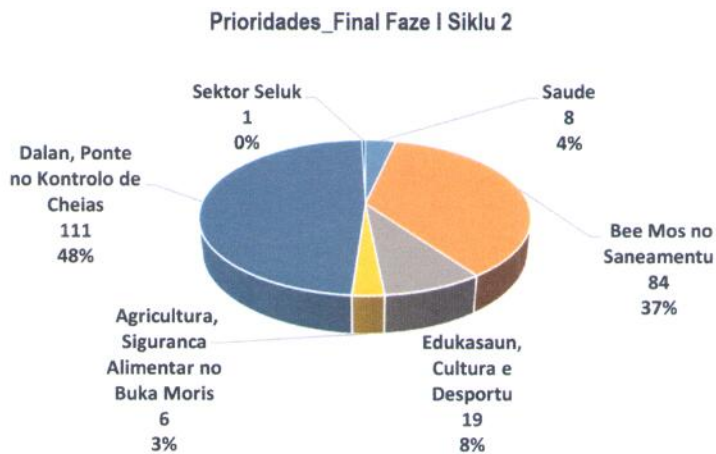

Harre ba grafiku determina Prioridade Final faze I Siklu II iha sorin, ita hare katak sektor dalan, ponte no kontrola cheias hetan porsentu bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.

- Treinamentu ba modul A kompleta ona iha Suku 69, no total suku nebe mak halao ona treinamentu ba modul B= suku 69, C= suku 59, D= suku 49, E= suku 50, F= suku 47, G= suku 40), H= suku 40, I= suku 19, J= suku 14, K= suku 14, L= suku 14)

Total Partisipante EJS ba Modul Treinamentu Faze 1 siklu 2

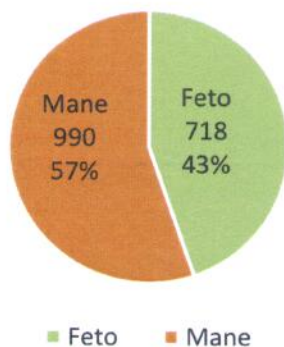

Grafiku iha sorin representa total partisipasaun EJS modul treinamentu A-H ba Faze I siklu II. Se ita hare ba grafiku iha sorin katak, persentajen Mane bo'ot liu kompara ho persentajen Feto.



Ekipa sira komesa prepara ba planu detallu

- Transferensia fundu 50% ba iha konta bankaria 31 sucus halao ona infraestrutura.
- Ba 118 suku agora dadaun prepara ona Rekizisaun pagamentu ba fundo

» ATIVIDADE GERAL SECRETARIADO TECNICO PNDS (ST. PNDS)

Iha fulan Febreiru 2016, progresu Atividades PNDS ne'êbe mak elabora kona ba atividades no Atividades prinsipal husi ST. PNDS mak hanesan tuir mai ne'e :

Kapasitasaun/ Formasaun

- Formasaun ba fasilitador finansa durante loron 4 iha SENAI konaba Enkontru Akontabilidade Final. Total Formandos hamutuk 77

Enkontru

- Enkontru koordenasaun Distrito ba Fulan Febreiru nian nebe halao iha dia 26 Febreiru 2016 iha ETDA nebe'e partisipa husi Diretora PNDS, Diretor Delegasaun 12 Municipio inklui mos Diretor REAO, Xefi Unidade Operasional no Xefi Unidade Administrasaun Finansa, Xefi Departementus, Asesores, parseiro FST/Cardno no funsionario nasional. Total partisipante hamutuk 52 partisipante.
- Enkontru regular ho parseiru M&E iha TAF (The Asia Fondation) nebe partisipa husi TAF, MDI, DFAT, ho total partisipante hamutuk 10 partisipante.

Keixa Husi Komunidade

Ekipa Jestaun Keixa halo ona Investigasaun ba kazu implementasaun PNDS iha :

1. Suco Hoholau iha, Municipio Aileu,
2. Mal Gestaun iha Suco Ritabou, Municipio Bobonaro.

Rejultadu investigasaun kazu iha :

1. Suco Hoholau, Municipio Aileu la detekta alegasaun ruma projetu estrada tuir duni processo PNDS nian maibe rekomenda nafatin ba GIGAI atu halo investigasaun klean liu tan karik persija.
2. Suco Ritabou Municipio Bobonaro sei iha prosesu investigasaun nia laran.

Monitorizasaun

1. Enjeneiru Nasional halo monitorizasaun ba projetu be'e mos no estrada iha Municipio Lautem. Monitorizasaun be'e mos no drainajen iha Municipio Manatuto no be'e mos iha Municipio Baucau.
2. Ekipa Kontabilista Nasional, Municipiu, Postu Administrativu hamutuk ho Field Supprt Team, Asesor halo monitoring conjunta ba iha Municipiu Manatuto hodi hare progresu gastus subsidiu.

Sosializasaun

ST. PNDS Nasional halao sosializasaun iha nivel Municipio konaba politika no mata dalan PNDS iha 12 Municipio no Zona Especial Oecusse. Partisipa husi Administrador 13 Municipios, Administrador PA, representante husi linas ministeriais, Xefi do Suco, Ekipa Jestaun Suco, no Sosiadade Sivil.

3. DEZAFIUS

- Projeitu balu nebe'e implementa iha Suku seidauk tuir padraun tékniku PNDS.
- Komunidade iha suku balu ladun partisipa iha atividade enkontru akontabilidade
- Kestaun insentivu kontinua sai hanesan obstaklu ba Iha suku balun.
- Lider komunidade iha suku balun seidauk iha kolaborasaun diak hodi partisipa iha implementasaun programa.
- Komunidade iha suku balun seidauk senti sai nain ba programa hanesan PNDS iha sira nian suku laran.
- Projetu balun lao tarde tamba material konstrusaun tarde.

4. REKOMENDASAUN

- Persija kontinua halo treinamentu ba EJS
- Ekipa PNDS sei halo sosialisasaun ka deziminasan program ba iha entidade hotu.
- Ekipa PNDS nasional no Municipiu kontinua haforsa halo monitoring ba iha suku hodi bele fo suporta ba Implementasaun.

