



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku **PNDS**

Relatóriu Mensal Fulan : Febreiru 2017



Programa Nacional de Desenvolvimento Sucos PNDS



OFFÍCIO

No: 135/PNDS.MPIE-MAE/III/2017

Hato'o ba :
: Sua Ex. Cia Ministro Planeamentu e Investimentu Estratéxico,
: Sua Ex. Cia Ministro Administração Estatal,
: Sua Ex. Cia Vicê Ministro Administração Estatal,
Asuntos : Relatoriu Progresu Implementasaun PNDS – Fevereiro 2017

Excelencias,

Relasiona ho assunto nebe mensiona iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatoriu mensal ba fulan Fevereiro 2017, relatoriu ne sei kobre progresu ezelesaun faze III, Faze I siklu 2, Faze II siklu 2 no progresu global implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) bazeia ba relatoriu husi Komunitade.

Ida ne'e mak relatoriu mensal PNDS, ba sua. Excêlências sira nian konsiderasaun, Obrigada

Dili, 12 Marsu 2017

Dulce Guterres Junior
Diretora PNDS

CC ba :

- EX.^{mo} Diretor Jeral Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (DG-ADN),
- EX.^{mo} Diretor Jeral Desentralizasaun Administrativa (DG-DA),
- EX.^{mo} Diretor Jeral Servicos Cooperativos (DG-SC),
- Arquivo



Sekretariadu PNDS:
Ministério do Planeamento e
Investimento Estratégico
Rua de : Bedik-Hun, Fatuhada-Timor Leste
E-mail : info@pnnds.gov.tl
www.pnnds.gov.tl

KONTEUDU


1.Progresu gastu subsídiu husi relatorio komunidade	2
2.Progresu atividades faze III & faze I siklus 2 no Faze II Siklu 2	4
3.Dezafius	12
4.Rekomendasaun.....	12

1. PROGRESU GASTUS NO FISIKU HUSI KOMUNIDADE

Esplikasaun konaba progresu gastu ezekeusaun orsamentu PNDS ba Faze III, Faze I Siklus 2 no Faze II Siklu 2, fulan Febreiru 2017 mak hanesan tuir mai ne'e:


FAZE III

Progresu ezekeusaun iha nivel comunidade ba iha 202 suku iha fulan Febreiru, Subsídium Infraestrutura gastu ona \$ 7,761,731.88 ou 89.88% husi total Orsamentu \$ 8,635,605.38. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e:

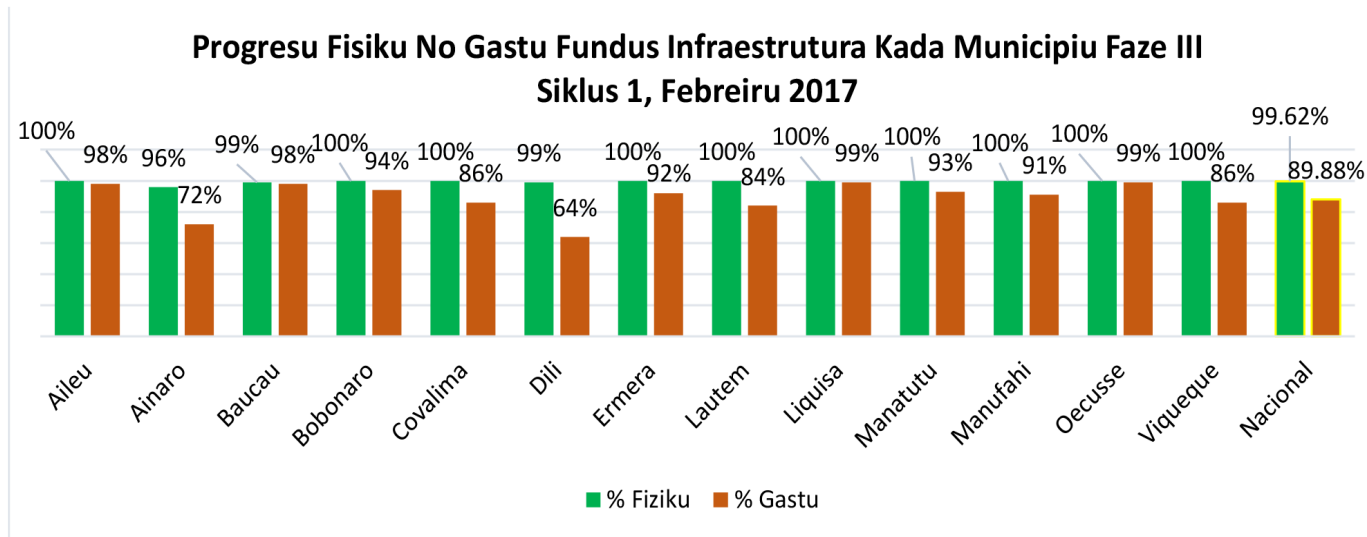

FAZE I SIKLU 2


Progresu ezekeusaun iha nivel comunidade ba iha 149 suku iha fulan Febreiru. Subsídium Infraestrutura gastu ona \$ 4,102,271.15 ou 61.86% husi total Orsamentu \$6,631,250.00. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e:

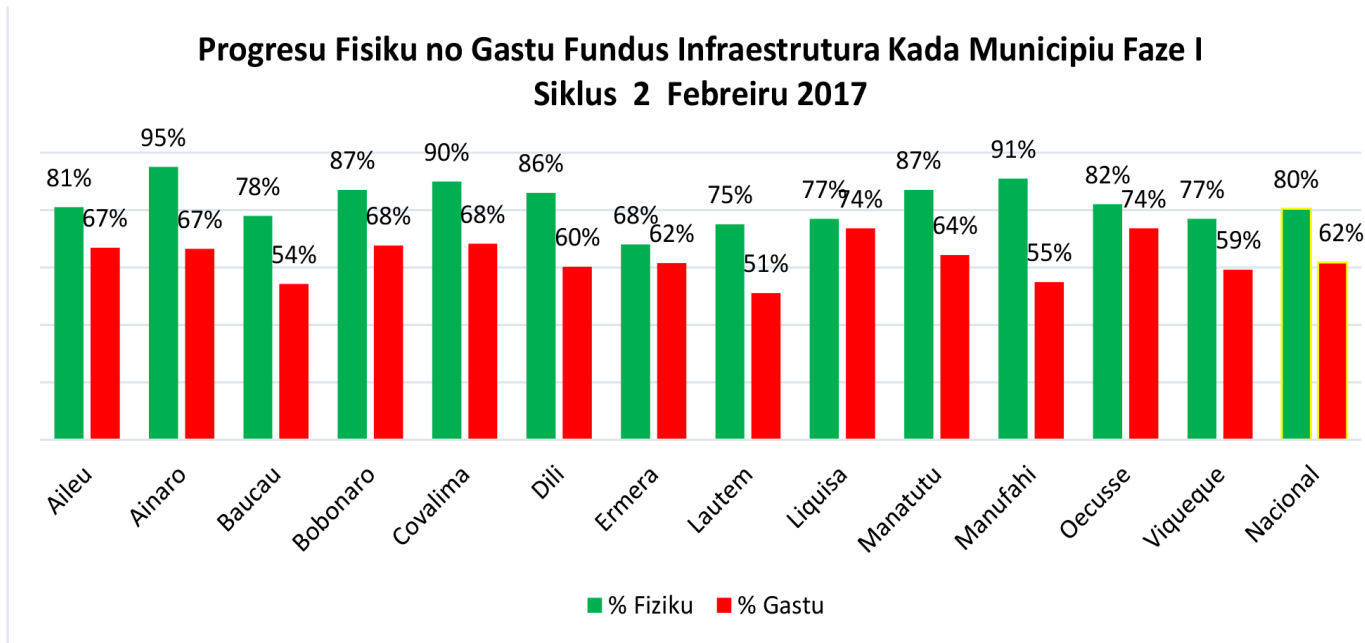

FAZE II SIKLU 2

Progresu ezelesaun iha nivel comunidade ba iha 91 suku ba Subsídium Operasional gastu ona \$ 198,205.02 ou 31.55% husi total \$ 628,274.47 no Subsídium Infraestrutura gastu ona \$ 2,078,036.47 ou 51.61% husi total Orsamentu \$ 4,026,250.00. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e:

**Progresu Fisiku no Gastu Fundus Infraestrutura Kada Municipiu Faze II
Siklus 2 Febreiru 2017**

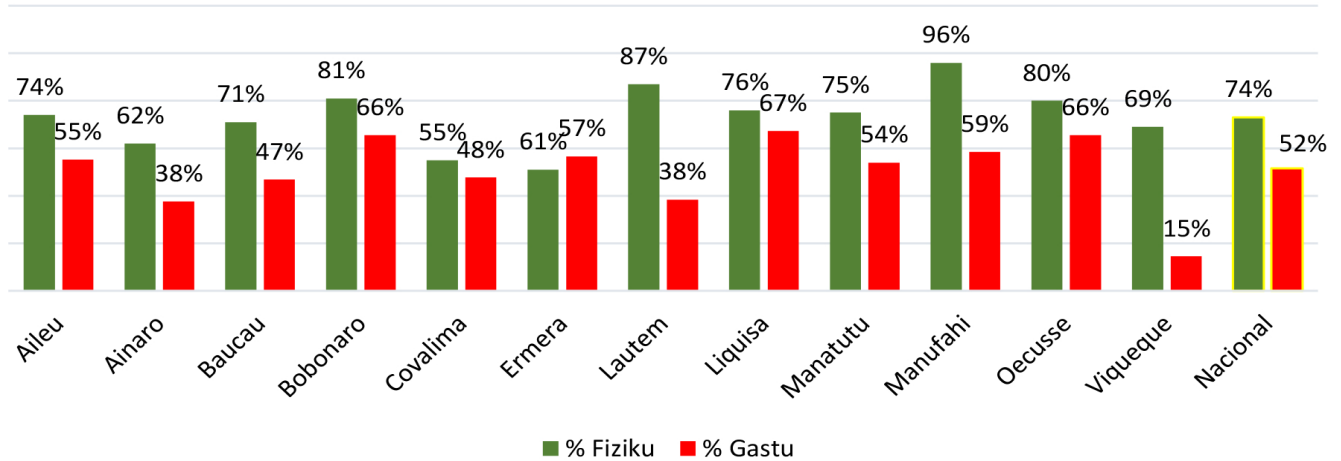


2. PROGRESU ATIVIDADES

Progresu implementasaun atividade PNDS ne'ebe mak realiza ba fulan ida ne'e kona ba progresu atividades no atividades prinsipal husi planu implementasaun PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

FAZE III

Progresu implementasaun ba iha suku 202 no progresu atividades tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 11 no 12 (Kompleta Konstrusaun no Enkontru akontabilidade Final) . Esplikasaun detailu mak hanesan tuir mai ne'e:

• Projeto Final Faze III

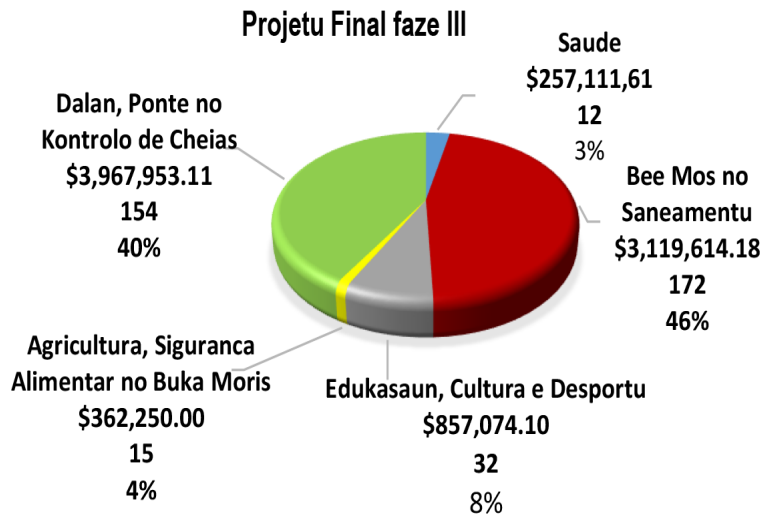

Hare ba grafiku projetu Final faze III iha sorin, nota katak sektor Be'e mo'os no Saneamento nudar projeitu ne'ebe persentazen bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.

- Husi 385 Projetus 371 projetus mak kompleta ona konstrusaun ou atinji ona 100%. No Projeto 10 mak sei prosesu kompleta konstrusaun. Projetus 4 mak kanseladu tamba mudansa klima-tika.
- Iha 202 Suku, Suku 143 mak halo ona Enkontru Akountabilidade final no 59 Suku sei prosesu organiza enkontru no prosesu finalizasaun konstrusaun.
- Progresu rata-rata atinji ona 99.62%.




Kompleta Konstrusaun beé mos iha Suco Tiarlelo, Postu Administrativu Atsabe-Ermera. Ho total Orsamentu \$ 29,866.32

FAZE I SIKLU 2

Faze I siklu 2 Suku sira nebe mak finaliza ona sira nian siklu 1, no agora dadaun, progresu atividade tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 9 (Implementasaun Projetu). Esplikasaun klaru kona ba progresu implementasaun atividades Faze I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Febreiru 2017 maka hanesan tuir mai ne'e:


PRIORIDADE FINAL FAZE I SIKLU II

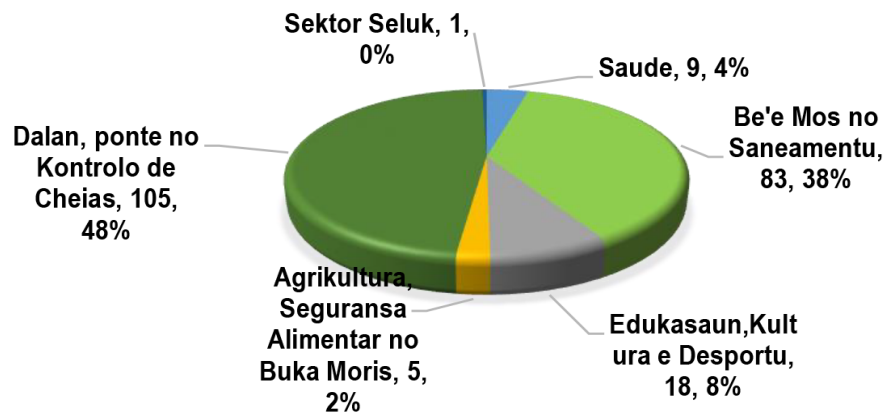

Hare ba grafiku determina Prioridade Final faze I Siklu 2 iha sorin, ita hare katak sektor dalan, ponte no kontrola cheias hetan porsentu bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.

• Total Partisipasaun Komunitade Modul Treinamentu ba EJS Faze I Siklu 2 to,o fulan Febreiru

Total Partisipasaun Komunitade Treinamentu ba EJS Modul ba Faze I Siklu II



Grafiku iha sorin total partisipasaun Komunitade Treinamentu ba EJS iha Modul Treinamentu J-L ba Faze I siklu 2. Se ita hare ba grafiku iha sorin katak, persentajen Feto bo'ot liu kompara ho persentajen Mane.

- Iha faze ida ne'e total projetu hamutuk 216 projetu no projetu nebe'e kompletu ona kostrusaun hamutuk 49 projetus, falta 167 projetu mak sei prosesu kompleta kostrusaun.
- Husi 149 suku, 82 suku mak halo ona enkontru akontabilidade primeiru
- Progresu rata-rata atinji ona **80.49%**




Rehabilitasaun Estrada Lokal iha suku Nipane Postu Administrativo Pantemacasar-Oecusse ho total orsamentu \$ 44,250.00

• FAZE II SIKLU 2

Faze II siklu 2, Suku sira nebe mak finaliza ona sira nian siklu 1, no agora dadaun, progresu atividade tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 9 (Implementasaun Projetu). Esplikasaun klaru kona ba progresu implementasaun atividades Faze II Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Febreiru 2017 maka hanesan tuir mai ne'e:

• Projetu final Faze II siklu 2


PRIORIDADE FINAL FAZE II SIKLU 2

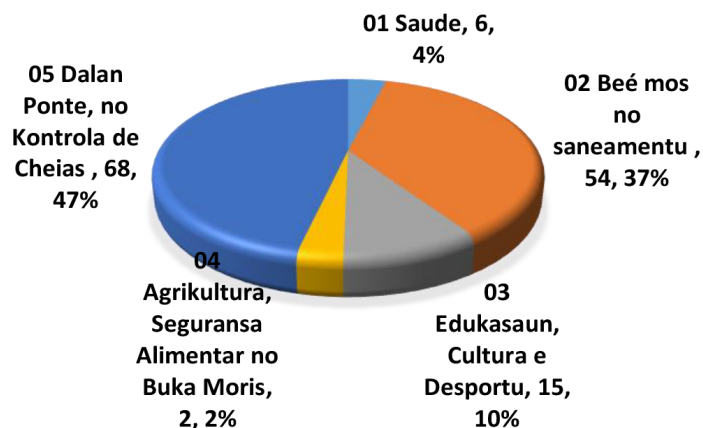

Hare ba grafiku determina Prioridade Final faze II Siklu 2 iha sorin, ita hare katak sektor dalan, ponte no kontrola cheias hetan porsentu bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.

- Total Partisipasaun EJS ba Modul Treinamentu Faze II Siklu 2 to,o fulan Febreiru

Total Partisipasaun EJS ba Modul Treinamentu Faze II Siklu 2



Modul Treinamento

- A: Introdusaun no Planeamento
- B: Kapasitasaun Feto 1
- C: Orientasaun ba Fasilitator Suku
- E: Hakerek Proposta
- F: Kapasitasaun Feto 2
- G: Jestaun Konstrusaun

Grafiku iha sorin total partisipasaun EJS ba iha Modul Treinamentu A-G ba Faze II siklu 2. Se ita hare ba grafiku iha sorin katak, persentajen Feto bo'ot liu kompara ho persentajen Mane.

- Faze ida neé implementa iha 91 suku no suku nebe mak halo ona enkontru akontabidade dahuluk hamutuk 36 suku.
- Progresu rata rata atinji ona **73.87%**



Konstrusaun Drainajen iha suku Funar Postu Administrativo Laclubar – Manatuto. Ho total orsamento \$8,160.63.

• ATIVIDADE GERAL SECRETARIADO TECNICO PNDS (ST. PNDS)

Progresu atividades PNDS ne'ebe mak elabora kona ba atividades no atividades prinsipal husi ST. PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

• Sorumutu Avaliasaun Annual iha Covalima Konaba Implementasaun PNDS 2016

Avaliasaun annual ba implementasaun Programa PNDS ida ne'e hala'o iha Municipiu Covalima no Municipiu Liquisa. Sorumutu Avaliasaun Annual ne'e ho nia objetivu atu revé fila fali vantajen no dezvantajen ne'ebé ekipa Munisípiu sira infrenta iha implementasaun programa PNDS.

Total Partisipante iha avaliasaun annual PNDS iha Municipiu Likisa hamutuk 67, kompostu husi Administradór Munisipál Liquisa, Administradór Postu Administrativu, Chefe Suku no Konsellu Suku, Ekipa Jestaun Suku, Ekipa PNDS Nasional nomos Munisipál no inklui ekipa apoiu PNDS husi Cardno.

Total Partisipante iha avaliasaun annual PNDS iha Municipiu Covalima hamutuk 57, kompostu husi Administradór Munisipál Covalima Interinu, Administradór Postu Administrativu, Chefe Departamentu Implementasaun Programa PNDS, Diretor Delegasaun Municipiu, Chefe Suku, Ekipa Jestaun Suku, Ekipa PNDS Munisipál no inklui ekipa apoiu PNDS husi Cardno.

Total partisipante iha avaliasaun annual PNDS ba iha municipiu rua ne'e hamutuk 124.



Administrador Interinu Munisipiu Covalima abertura enkontru Avaliasaun Annual Programa PNDS Munisipiu Covalima.

- **Enkontru Parseiru Monitorisaun no avaliasaun**

Ekipa Monitorizasaun no Avaliasaun partisipa enkontru parseiru M & A iha The Asia Foundation (TAF). Objetivu husi enkontru neé atu deskuti konaba Kontribuisaun Komunitade iha Implementasaun PNDS.



Enkontru Parseiru Monitorizasaun no Avaliasaun iha The Asia Foundation (TAF).

- **Grupu Kordenasaun Tékniku Seitoral, Partisipa Iha Programa Vizita Projeitu Programa PNDS Iha Munisípiu Bobonaro**

Programa Vizita Hamutuk ba Projeitu Programa PNDS ne'e nia objetivu atu fo oportunidade ba iha Grupu Tékniku husi Seitor relevantes sira atu observa no halo komunikasaun direita ho comunidade Suku no aldeia oinsá comunidade bele rezolve rasik problema dezvoltamentu ne'ebé sira infrenta durante ne'e, liu husi implementasaun Programa PNDS.

Rejultadu husi atividade ida neé mak mosu rekomendasaun husi Seitor relevantes sira oinsá atu asegura sustentabilidade nomos kualidade husi projeitu, no kria kordenasaun entre kada liña ministeriais hodi defini prioridade final tantu iha nivel nasional, sub-nasional nomos iha postu administrativu, atu nune'e bele evita programa duplu.



Ekipa konjunta Vizita Projeitu kanal Irigasaun ba Planta hortikultura iha Suku Sanirin Postu Administrativu Balibo Municipiu Maliana.

• Treinamentu

- Treinamentu ba fasilitador teknika postu administrativu etapa III no IV konaba fasilitasaun komunidad iha salaun Maries Tropes Dili. Treinamentu neé fasilita husi treinador Centru Treinamentu Rekursu Aprendesajen, treinamentu neé fahe ba grupo rua, Grupo Primeiru ho total partisipante hamutuk 29 no grupo segundu ho total partisipante hamutuk 28. Total partisipante hamutuk 57.
- Treinamentu konaba Planu Investimentu Integradu Municipal, iha salaun MSS nebeé organiza husi PNDS no SAIM, no Partisipa husi Administrador Municipiu, Diretor Delegasaun PNDS Municipiu, Administrador Postu Administrativu, Diretores SLAIM, Ekpa 13 husi PNDS Nasional, Enjineiru PNDS Municipiu no Fasilitador PNDS Sosial Postu Adminitrativu. Total partisipante hamutuk 124.
- PNDS serbisu hamutuk ho parseiru TAF hodi Apoio realiza treinamentu ba fasilitador Postu administrativu sira konaba Enkontru Avaliasaun Partisipativa iha Manufahi. Partisipante iha treinamentu ida ne'e hamutuk 15 pesoas.
- Treinamentu konaba MIS roll out, Treinamentu ne'e foka liu ba hasa'e kapasidade ekipa Munisipiu nian konaba oinsa atu hatama dados ba iha sistema MIS.



Treinamentu konaba MIS iha Oecusse

3. Dezafius

- Iha suku balun membru ekipa jestaun suku ladun halao sira nia funsaun ho diak tamba ekipa balun kestaun isentivu ba ekipa jestaun suku ki'ik, hetan serbisu seluk, no balun kontinua eskola.
- Lider komunidad iha suku balun seidauk iha kolaborasaun diak hodi partisipa iha implementasaun programa.
- Komunidade iha suku balun seidauk senti sai nain ba programa hanesan PNDS iha sira nian suku laran
- Projetu balun lao tarde tamba material konstrusaun tarde (tempu udan susar atu asesu dalan/lori material ba fatin projeitu)
- Mudansa ba iha estrutura suku, membru Ekipa Jestaun Suku iha suku balu eleitu nudar xefe suku no membru konselho do Suku.

4. Rekomendasaun

- Persija kontinua halo treinamentu ba EJS no halo treinamentu ba membru EJS foun;
- Ekipa PNDS sei halo sosializasaun ka deziminasan program ba iha entidade hotu;
- Ekipa PNDS Nasional no Municipiu kontinua haforsa halo monitoring ba iha suku hodi bele fo suporta ba Implementasaun.



Sekretariadu PNDS :

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico

Rua de : Bedik Hun, Fatuhada-Dili Timor Leste

E-mail : info@pnads.gov.tl

Website : www.pnads.gov.tl
