



Relatoriu Mensal

Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

Nu.SEK01/PNDS/14

Data Reporta: Dia 28, Fevereiru 2014



PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU

"HAMUTUK ITA DEZENVOLVE NASAUN"

Secretariadu PNDS, Edifício Central do MAE, Rua Jacinto Cândido
Dili, Timor Leste.
Tel: 331 0980



Sua Excelência : Ministru MAE
Sua Excelência : Sekretariu Estadu Dezenvolvimentu Lokal
Ex.Mos : Srs.Diretores Nasional MAE
Ex.Mos : Srs.Diretores Geral MAE
Ex.Mos : Srs.Membrus GTTIM

Assunto : Relatorio Mensal Janeiro 2014

Sua Excelencia,

Iha anexo, Ami hato'ó Relatoriu Konaba implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ba Janeiro 2013 no Progresu tomak konaba Operasaun Programa Nasional Dezenvolvimento Suco.

Mak ne'e deit, hau nia respeitu no elevada konsiderasaun hato'ó obrigadu Wai'n.

Prepara Husi

Rosito Guterres
Consultor-PNDS

Dili, Dia/...../ 2014

Dulce Guterres Junior
Adjunta Direitora Geral
Operasional Programa PNDS

Copia Hato'ó ba.

1. Arquivo



Hamutuk Ita Dezenvolve Nasaun



Relatoriu mensal

Janeiru 2014

1. Introdusaun


Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS), Bazeia ba Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (2011-2030) identifika prioridades dezenvolvimentu Sosial no Ekonomiku nasaun nian.

Objetivu

Metas husi programa PNDS atu suporta vizaun tempu naruk mak “Kondisaun Sosio-Ekonomiku aumenta no governu lokal ba mane no feto suku nian iha Timor Leste Liu husi Infraestrutura nebe jere husi comunidade” no sei Lao tuir Siklu Projeitu PNDS.

2. Atevidades no progresu

Iha fulan Janeiru 2014, implementasaun PNDS sei elabora relatoriu kona ba Pilotu, Faze I no Faze II. No Atevidades principal husi prosesu implementasaun nee maka Pilotu tama iha implementasaun konstrusaun, Faze I halo ona identifikasaun prioridades Aldeia & Suku no Faze II Hahu halo sosializasaun Nivel Distritu no Sub.Distritu. Tuir mai nee mak detaillu aktividades nebe mensiona.

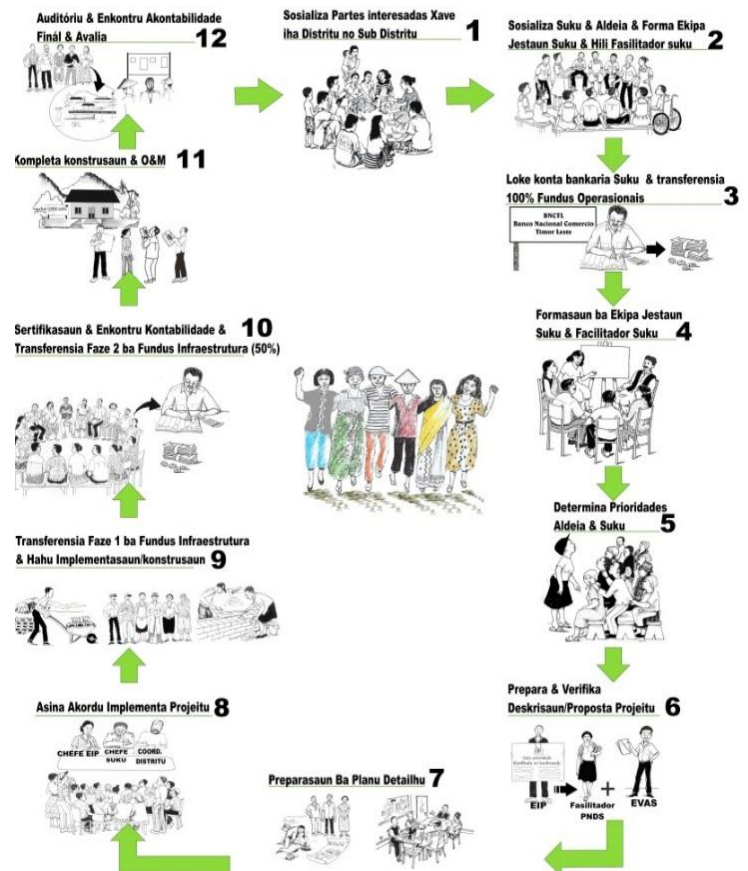

Relatoriu mensal


Janeiru 2014

Pilotu

Progresu pilotu ba implementasaun ate fulan Janeiru Jeralmente Atije Progresu Fiziku Atinje ona **67.70%** no progresu Finansas ba pilotu Atinje ona **53.85%**. Husi variasaun valor Progresu kada Distritu, husi dadus Nasional hatudu katak progresu Fiziku pilotu Distritu Dili, Manatutu no Aileu hetan Presentagem Progresu nebe Ki'ik (Entre 52.82% - 59.95%) no husi Distritu Ermera no Liquisa maka atinje ona progresu Ass (Entre 74.85%-80.42%).atu detaillu liu bele hare'e iha Sub topiku progresu Fiziku no Gastus fundus infraestrutura hanesan Grafiku tuir mae ne'e:

a. Progresu Fiziku no Gastus Fundus Infraestrutura

Progresu Fiziku no Gastus ba Fundus Infraestrutura ba iha Projeitu **75** Pilotu mak hanesan Grafiku tuir mai ne'e:

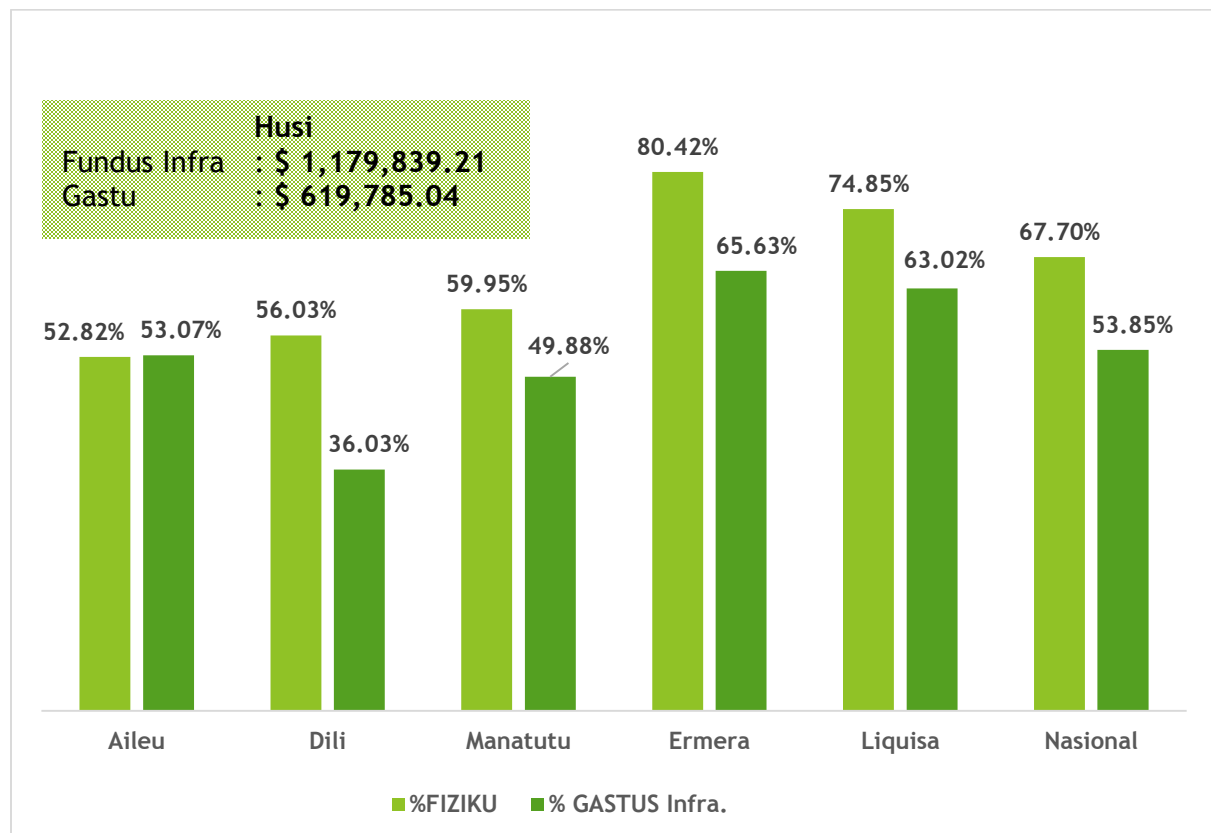


Relatoriu mensal

Janeiru 2014

Kategoria Utulizasaun Fundus Infraestrutura


Osan infraestrutura gasta kada kategoria - Pilotu

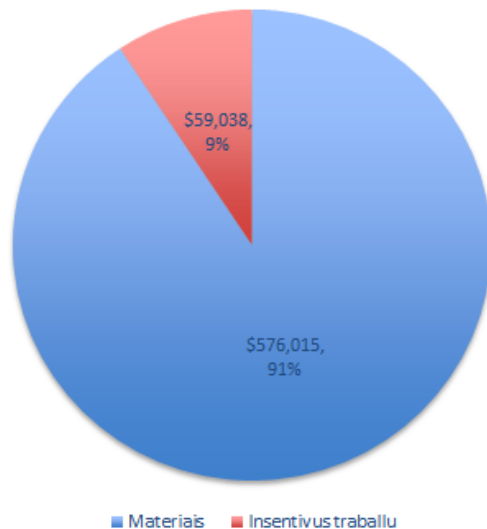

b. Gastu Operasional

Relatoriu Gastus fundus operacional ba iha 30 Suku Pilotu mak hanesan iha Grafiku tuir mai ne'e:

Presentagem Gastus Operasional

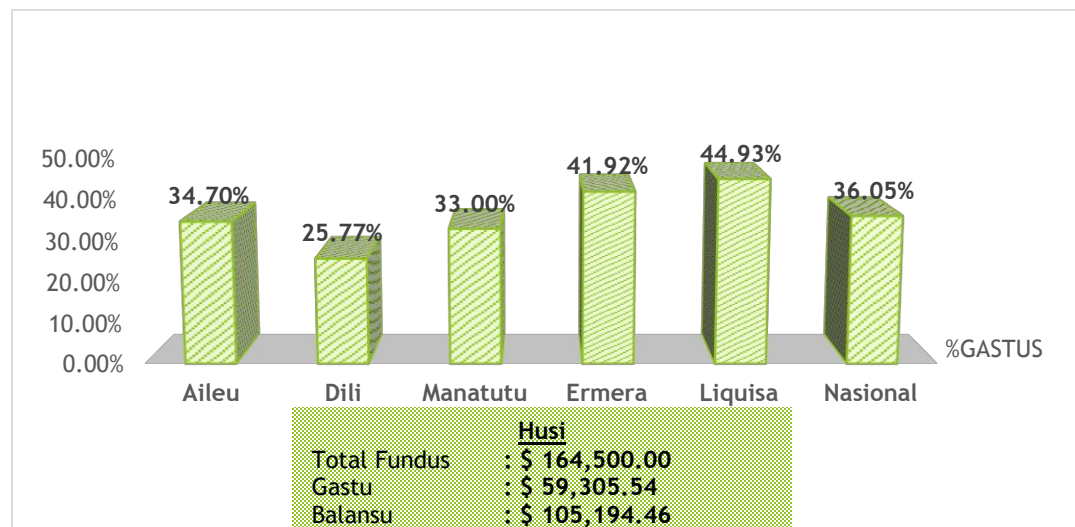


Relatoriu mensal

Janeiru 2014

Kategoria Utulizasaun Fundus Operasional

Osan Operasaun gasta kada kategoria - Pilotu

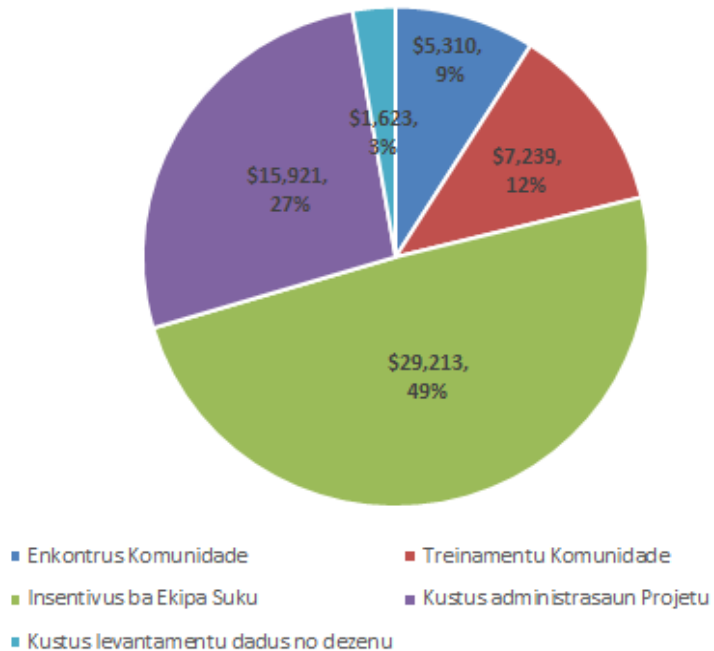

c. Informasaun Enkontru Akontabilidades

Husi 30 Suku Piulotu nebe mak implementa Projeitu Pilotu hamutuk 75 Pilotu, provizoriamente relasionadu ho informasaun no dados relasiona ho traballadores tamba Iha Fulan Janeiru nian laran seidauk iha informasaun relasiona ho traballadores..

d. Informasaun Traballadores


Provizoriamente relasionadu ho informasaun no dados relasiona ho traballadores tamba Iha Fulan Janeiru nian laran seidauk iha informasaun relasiona ho traballadores.

Relatoriu mensal

Janeiru 2014

e. Treinamnetu

Iha implementasaun Pilotu, iha mos Modul balun ne'ebe iha 30 Suku pilotu kontinua halo treinamentu maka hanesan Modul I (Monitorizasaun no Akontabilidade) modul nee prefere liu ba iha partisipasaun Komisaun Planeamentu no Akontabilidade (KPA) no Modul F (Kapasitasaun Feto sira nian Parte II) Prefere liu ba iha Lider Feto iha Suku nian no tuir mai ne'e maka Grafiku ba Partisipasaun Modul I no F:

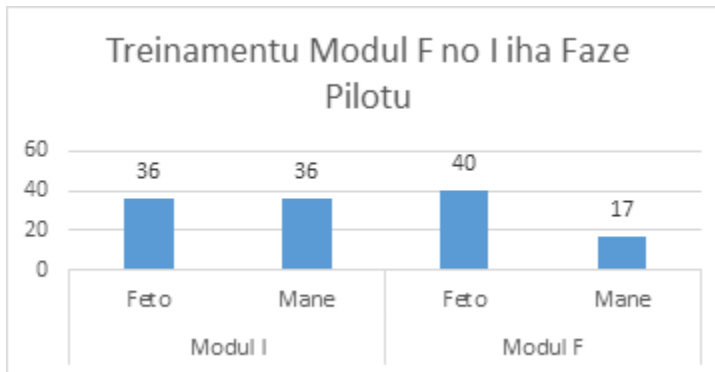

Relatoriu mensal


Janeiru 2014

Faze I

Iha implementasaun parte faze I, atividades nebe maka realiza ona iha fulan Janeiru liu ba mak hanesan Identifikasaun Prioridades tuir mai ne'e mak grafiku informasaun durante prosesu identifikasaun Prioridades.

a) Progresi Gastus Fundus Operasional

Husi 149 Suku, nebe maka realiza ona atividades nebe maka mensiona iha letan, husi total kustu operasional ba Faze I hamutuk \$ 883,750 maka suku sira uja hodi halao atividades no ate fulan janeiru total 149 suku gastu ona fundus operasional \$ 111,033.40 no atu detaillu liu, bele hare'e Grafiku Gastu operasional Faze I tuir mai ne'e:

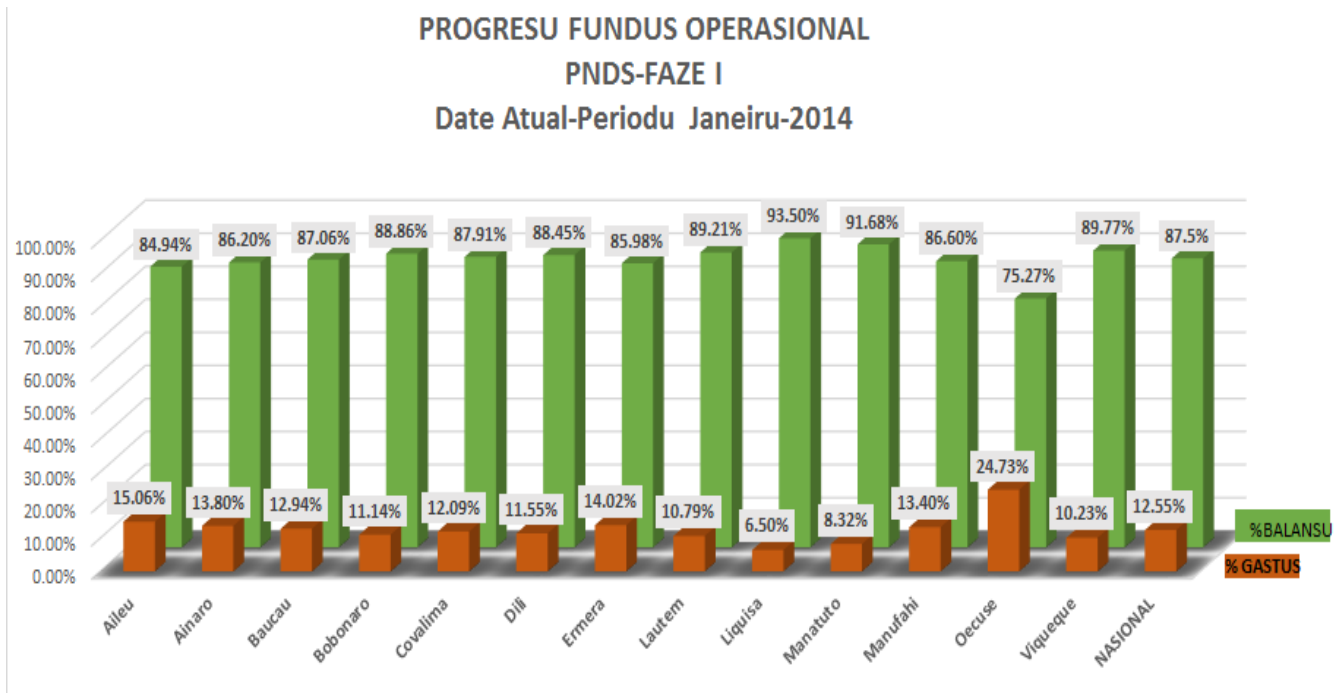


Relatoriu mensal

Janeiru 2014



Kategoria Utulizasaun Fundus Operasional

Osan Operasaun gasta kada kategoria - Fase 1

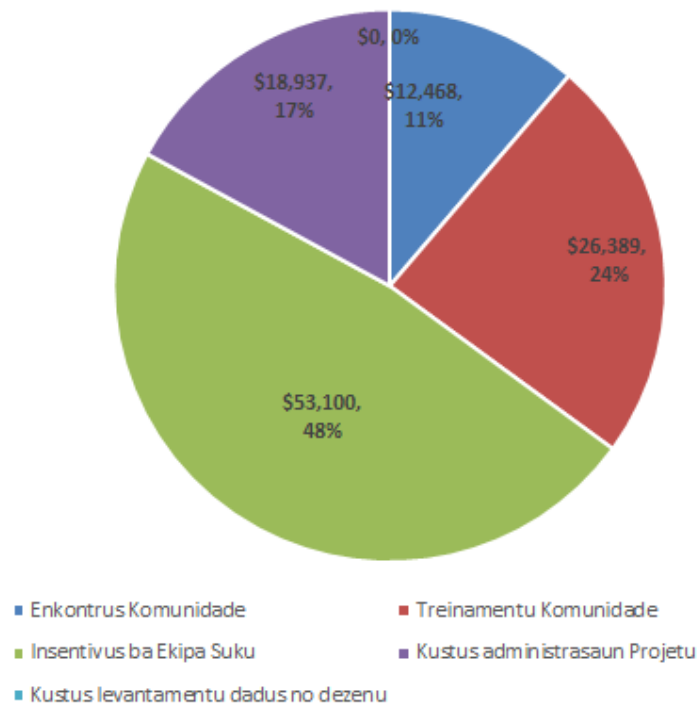

b) Partisipasaun SosIALIZASAUN Aldeia no Suku

Iha Grafiku tuir mai nee mak Detaillu partisipante Generu ba iha Atevidades identifikasaun Prioridades iha Aldeias no Suku:

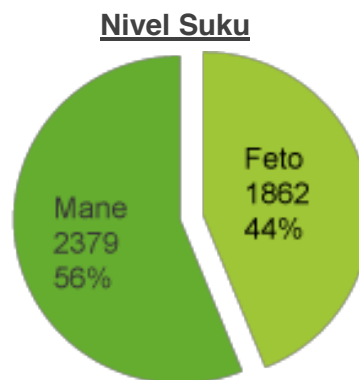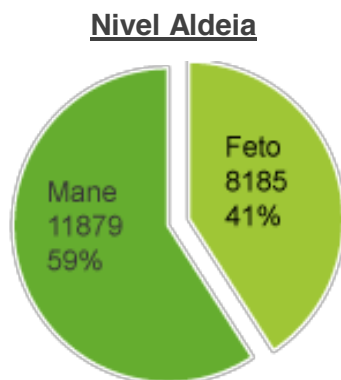

Relatoriu mensal


Janeiru 2014

c) Dadus Prioridades mai husi Grupo Feto

Husi total prioridades Suku iha Faze I hamutuk 255 Projeitus prioridades, dadus refere sei dadus provizoria nebe tama ona ba parte MIS nian, tamba Dadus total suku iha Faze dadus Prioridades Suku Seidauk tama hotu.

d) Tipo Prioridades iha Area Seitoral

Husi Dadus total 255 Projeitu Prioridades nebe maka mensionadu ona iha leten, iha mos varias kategoria prioridades ba iha Seitoral, mak hanesan Tuir mai ne'e:

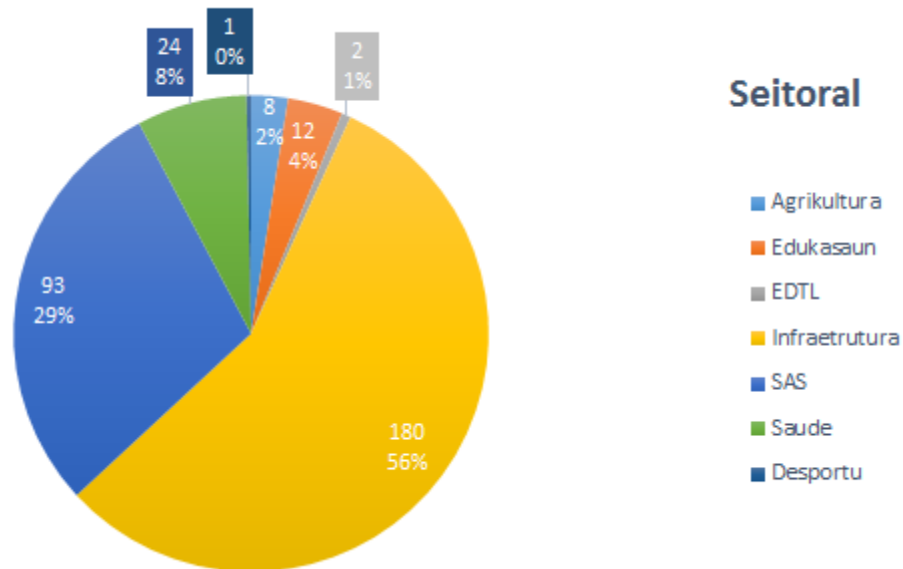

NOTAS: Relariona ho dadus nebe mensiona iha leten seidauk finan tamba dadus refere representa fulan Janeiru nian no iha dadus husi Sub.Distritu balun maka Ekipa Distritu liu MIS seidauk relata mai iha Sekretariadu Nasional para Analisa no publika iha Relatoriu ida ne'e


Relatoriu mensal

Janeiru 2014

3. Nasional

a) Logistiku

Husi Parte logisitiku Atevidades nebe'e mak Sekretariadu liu husi Logistiku halo mak Hanesan Distribusaun Ekipamentus ba ekipa terreno. Atu detaillu liu bele breve liu husi Grafiku Sumariu logistiku tuir mai ne'e:

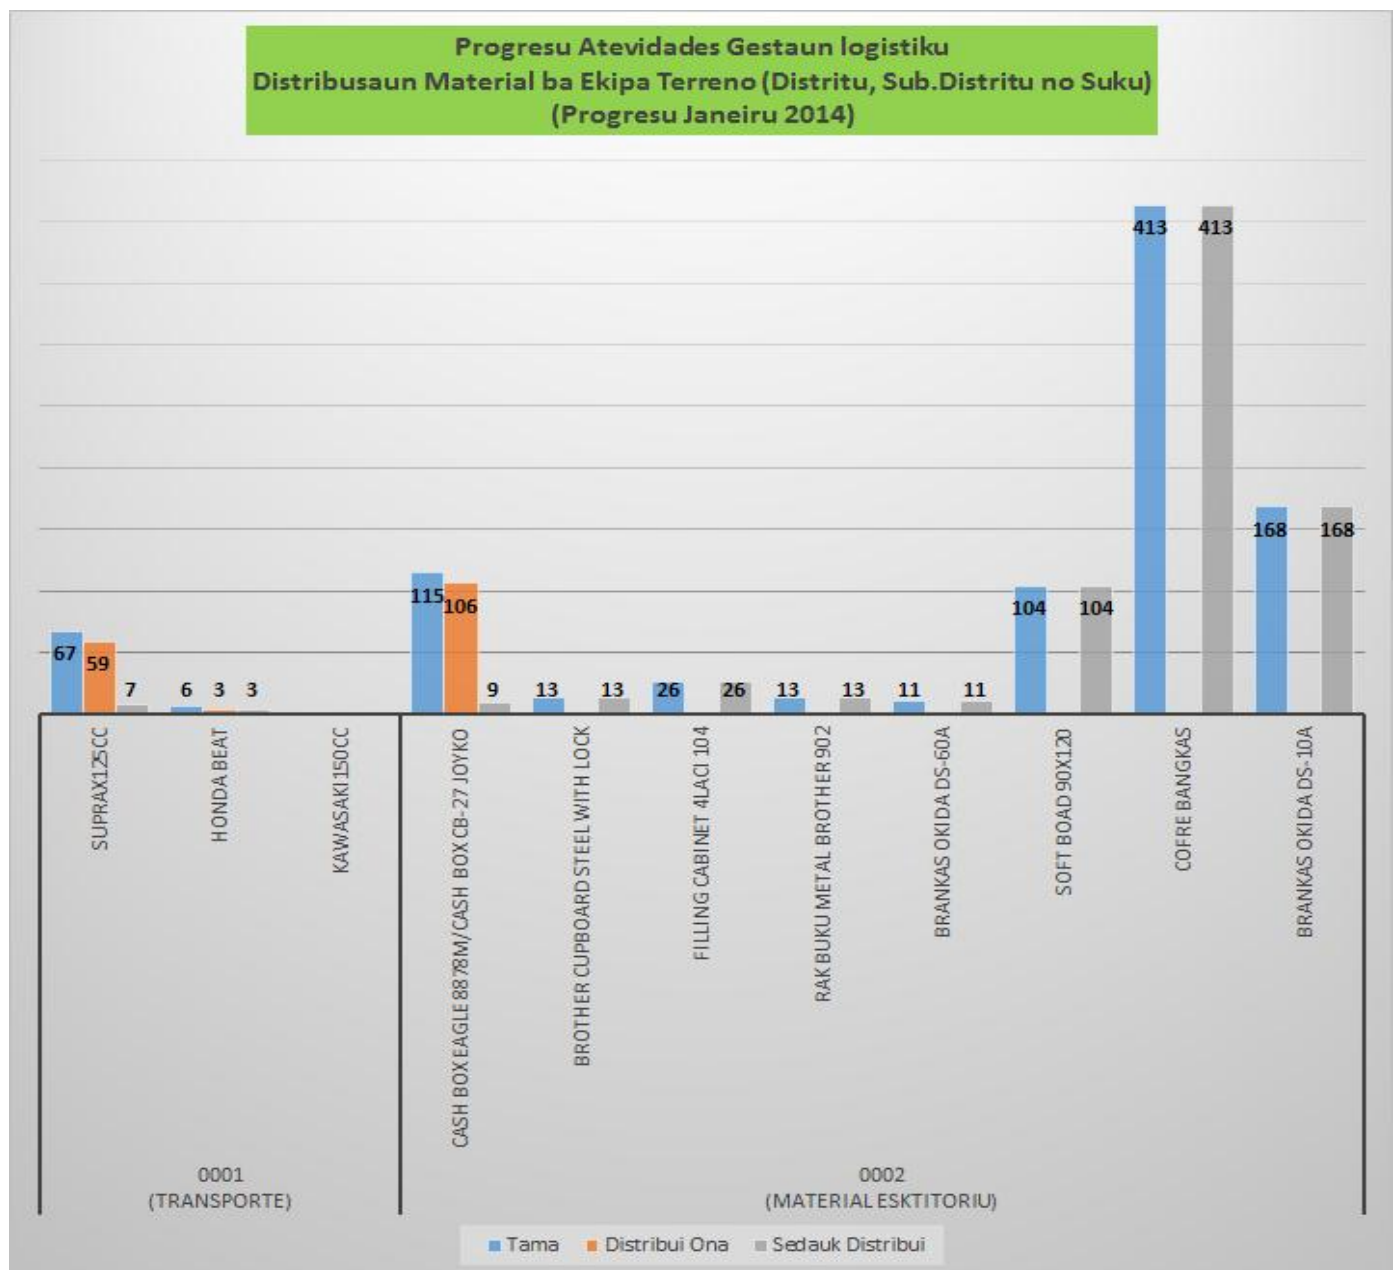

Relatoriu mensal

Janeiru 2014

b) Rekursu Humanu

Diresaun Rekursu Humanu Programa Nasional Dezenvolvimentu iha fulan Janeiru 2014 realiza atividades hanesan iha Sub.Topiku tabela tuir mai:

1. Informasaun Sumariu Kontrola Funsionariu PNDS iha Terreno (Distritu no Sub.Distritu)
 Relasiona ho Informasaun ne'e maka hanesan iha Tabela tuir mai ne'e:

Pozisaun	Númeru nebe rekruta	Númeru nebe Ativu	Komentariu
Fasilitador Sosial Sub-District	78	78	Kompletu
Fasilitador Finanzas Sub-District	78	78	Númeru ativu 78 hafoin substitui nain 3; 1 matebian no 2 seluk resigna an
Koordenador Delegasaun Distrital	13	13	Kompletu
Enjeneiru Distritu	26	26	Kompletu
Kontabilista Distritu	26		Númeru ativu kompletu hafoin substitui nain 2 nebe resigna an
Ofisial MIS Distritu	13	12	Númeru ativu 12 tamba 1 resignaan no la iha suplnete.
Total 233*	234*		

Relatoriu mensal

Janeiru 2014

2. Registrasaun Estadu no pagamentu ba Fasilitador Sosial Sub.Distritu no Fasilitador Finansas Sub.Distritu nian

Informasaun Konaba FSSD,FFSD no staf Distritu nian Registrasaun no Estadu pagamentu Salariu. Maka hanesan iha Tabela tuir mai ne'e:

Pozisaun	Número nebe rekruta	Nú. regista @ KFP	Estatutu iha Payroll		Comments
			Simu (\$)	Sei hein (\$)	
Fasilitador Social Sub Distritu	78	67	BNCTL 55	BNU 4 MANDIRI 4 ANZ: 1	Selu la kompletu
Fasilitador Finansas Sub-Distritu	77	68	BNCTL 60	BNU 6 MANDIRI 2	Selu la kompletu
Koordenador Distritu	13	12	BNCTL 7	BNU 2 MANDIRI 2	Selu la kompletu Selu deit ho salariu Grau B nian - seidaik iha legalidade salariu ekivalente ho director distrital.
Enjeneiru Distritu	26	22	BNCTL 17	BNU 2 MANDIRI 3	Selu la kompletu
Kontabilista Distritu	26	25	BNCTL 14	BNU 3 MANDIRI 8	Selu la kompletu
Ofisial MIS Distritu	13	12	BNCTL 10	BNU 1 MANDIRI 1	Selu la kompletu Staff Grau D selu liu ba grau B
Total	233*	206			

Relatoriu mensal

Janeiru 2014

c) Komunikaun

Husi parte komunikaun PNDS, iha fulan Janeiru 2014 konsege realiza ona atividades relasaun ho komunikaun maka hanesan iha tabela sumariza komunikaun tuir mai ne'e:

1. Trasa planu no Formula Orariu ba Sosializasaun nivel Sub.Distriu ba Faze II
2. Trasa Karta ba Distritu no Sub.Distritu inklui ba Delegasaun territorial konaba planu no agenda sosializasaun Faze II
3. Prepara pedido ba Planu Imprimi Material Komunikaun ba DGDL inklui Planu ba Perkiza no identifikasaun Quotasaun ba imprimidores.
4. Dezenvolve Planu no Estrategia direasaun komunikaun nian ba iha Trimestral no Annual
5. Diskusaun liu husi enkontru konaba Planu Video Spot
6. Halo planu no realiza planu Dezanimasaun ba Sosiedade Sivil no media konaba lalaok PNDS, Planu no Progresu.

Geralmente Parte komunikaun ho Nia Estrategia mak Hanesan visual tuir mai ne'e:

Estrategia Komunikaun

1. Mobilisasaun Administrivu / Relasaun Publiku / Advokasi

5. Promosaun
konaba ba fatin
ho ema.



2. Mobilisasaun
Komunidade
(Sosializasaun)

3. Advertising /
Publisidade

4. Ibun ba ibun, ho
ema ida-idak.

Relatoriu mensal

Janeiru 2014

4. Annexas

Annexa 4.1 Tabela Sumariza Progresu Atevidade

Annexa 4.2 Tabela Progresu Fiziku no Gastus Fundus Infraestrutura

Annexa 4.3 Fotografia Atevidades

Annexa 4.4 Planu Atevidades Fulan Oin

Annexa 4.1 Tabela Sumariza Progresu Atevidade

Data Atual Janeiro 2014

Etapas Atevidades Siklu Projeitu	Atevidades	PILOTU (30 sucus)	FAZE I (149 sucus)	FAZE II (91 sucus)
1	Sosializasaun Nivel Distritu no Sub.Distritu	Remata Ona	Remata Ona	Remata ona
2	Sosializasaun no Nomeasaun EJS nivel Aldeias	Remata Ona	Remata Ona	Fev-Marsu 2013
2	Sosializasaun no Elisaun EJS	Remata Ona	Remata Ona	Fev-Marsu 2013
3	Assina Akordu MOU	Remata Ona	Remata Ona	Marsu
3	Loke Konta Bankaria Suco	Remata Ona	Remata Ona	Marsu
3	Transferensia 100% Fundus Operasional	Remata Ona	Remata Ona	Marsu
4	Treinamentu EJS: Modul D (Finacial	Remata Ona	Remata Ona	Marsu-Abril
4	Treinamentu EJS: Modul A (Introduction and	Remata Ona	Remata Ona	Marsu-Abril
4	Treinamentu EJS: Modul B (Women	Remata Ona	Remata Ona	Marsu-Abril
4	Treinamentu EJS: Modul C (Suco Facilitator	Remata Ona	Remata Ona	Marsu-Abril
4	Treinamentu EJS: Modul E (Proposal Writing)	Remata Ona	Feb-14	Marsu-Abril
4	Treinamentu EJS: Modul F (Women Empowerment part 2)	1-2 Semana Fulan Dec.	Jul-14	Abril
4	Treinamentu EJS: Modul G (Managing	Remata Ona	May-14	Abril
4	Treinamentu EJS: Modul H (Finacial	Remata Ona	May-14	Abril-Maiu
4	Treinamentu EJS: Modul I (Monitoring and	1-2 Semana Fulan Dec.	Jun-14	Abril-Maiu
4	Treinamentu EJS: Modul J (Operations and	Mar-14	Sep-14	Abril-Maiu
4	Training CMT: Modul K (Financial Management	Apr-14	Oct-14	Abril-Maiu
4	Treinamentu EJS: Modul L (Monitoring and OM)	Apr-14	Oct-14	Abril-Maiu
5	Identifikasaun Prioridades Aldei no Suco	Remata Ona	Jan-Feb 14	Abril-Maiu
6	Hakerek Proposta Projeitu	Remata Ona	Mar-Apr 14	Maiu Junnu
7	Survey no Dezenu	Remata Ona	Mar-Apr 14	Maiu-Junnu
7	Dezenu Planu Detallu (BOQ, Planu, O&M,)	Remata Ona	Mar-Apr 14	Junnu-Jullu
7	Finaliza Proposta Projeitu	Remata Ona	Mar-Apr 14	Junnu-Jullu
8	Assina Akordu Implementasaun Projeitu	Remata Ona	May-14	Jullu
8	Implementasaun projeitu	Remata Ona	May-14	Jullu
Agustu	Pedido Pagamentu Subsidiu	Remata Ona	May-14	Agustu
9	Transferensia Faze I Fundus Infraestrutur	Remata Ona	May-14	Agustu
9	Kotasaun no Aprovizionamento	Remata Ona	May-Jun 14	Agustu-Setembru
9	Hahu Konstrusaun	Lao hela iha 30 suco pilotu	Jun-14	Agustu-Setembru
10	Sertifika Progresu no Enkontru Akontabilidade	Reuniaun Akontabilidade sei Lao iha 30 Sucos	Aug-Sep 14	Set-Out-Nov-Dezem
10	Transferensia Faze II Fundus Infraestrutur	Remata Ona	Aug-Sep 14	Set-Out-Nov-Dezem
11	Kompleta Kontrusaun no Hahu O&M	Marco-Apr 2014	Nov-14	Set-Out-Nov-Dezem
12	Akontabilidade Final	Maiu 2014	Dec-14	Set-Out-Nov-Dezem
12	Audita Final no Enkontru Akontabilidade	Maiu 2014	Dec-14	Set-Out-Nov-Dezem

Annexa 4.2 Tabela Progresu Fiziku no Gastus Fundus Infraestrutura



PROGRESU FIZIKU NO FINANSA Programa Nacional Desenvolvimento Suku Período Janeiro -2014

Distritu	Sub-Distritu	Suku	Projetus	Aldeia	Kustu Projeitu	Gastu	Balansu/Kustu Projeitu	% Presentagen Fisik Projecto	Total Kustu Projeitus Kada Suku	Progresu Fiziku Kada Suku
Aileu	Aileu Vila	Fahiria	Konstrusaun Sede Aldea Sarin		\$ 16,925.72	\$ 10,823.70	\$ 6,102.02	64.15%	\$ 35,000.00	61.18%
			Konstrusaun Sede Aldea Daulala		\$ 18,074.28	\$ 9,918.50	\$ 8,155.78	58.21%		
		Lausi	Rehabilitasaun Centru Comunitariu Aldea Lausi		\$ 18,277.03	\$ 5,965.00	\$ 12,312.03	70.56%	\$ 39,500.00	52.73%
			RehabilitasaunBe'e Mos Aldea Raifusun		\$ 5,000.89	\$ 3,341.45	\$ 1,659.44	74.35%		
			Konstrusaun Sede Aldea Erbuti		\$ 16,222.08	\$ 9,163.75	\$ 7,058.33	66.02%		
		Hoholau	Konstrusaun Ponte Ki'ik		\$ 22,186.68	\$ 9,692.75	\$ 12,493.93	64.73%	\$ 39,500.00	65.93%
	Konstrusaun Sede Aldea Maururia			\$ 17,313.32	\$ 10,795.90	\$ 6,517.42	67.13%			
	Laulara	Talitu	Tembok Penahan Suku Talitu		\$ 4,793.45	\$ 3,843.50	\$ 949.95	95.80%	\$ 44,250.00	81.93%
			Konstrusaun MCK Sede Suku Talitu		\$ 6,618.27	\$ 3,737.40	\$ 2,880.87	82.04%		
			Konstrusaun Sede Aldea Fatuk-Hun		\$ 16,600.34	\$ 10,020.50	\$ 6,579.84	75.15%		
			Konstrusaun Sede Aldea Quela'e		\$ 16,237.94	\$ 10,503.75	\$ 5,734.19	74.74%		
		Madabeno	Rehabilitasaun Sede Suku Madabeno		\$ 39,500.00	\$ 23,271.75	\$ 16,228.25	63.46%	\$ 39,500.00	63.46%
		Fatisi	Konstrusaun MCK Suku Fatisi		\$ 7,834.90	\$ 5,896.00	\$ 1,938.90	69.30%	\$ 44,000.00	66.71%
			Konstrusaun Plat Deker Aldea Mauboc		\$ 20,086.26	\$ 4,697.10	\$ 15,389.16	64.25%		
			Konstrusaun Plat Deker Aldea Banro		\$ 16,078.84	\$ 6,630.65	\$ 9,448.19	66.58%		
TOTAL DISTRITU			15		\$ 241,750.00	\$ 128,301.70	\$ 113,448.30	52.82%		

Annexa 4.2 Tabela Progresu Fiziku no Gastus Fundus Infraestrutura

Dili	Kristo-Rei	Camea	Konstrusaun Sede Suco gangden sede Juventudde	-	\$ 34,250.00	\$ 12,143.50	\$ 22,106.50	57.52%	\$ 34,250.00	57.52%
	Metinaro	Sabuli	Konstrusaun Sede Aldea Akaderu Laran	-	\$ 18,326.38	\$ 8,470.50	\$ 9,855.88	79.99%	\$ 39,500.00	67.22%
			Sede Aldea Sabuli	-	\$ 18,326.38	\$ 8,367.00	\$ 9,959.38	61.42%		
			Rehabilitasaun Baleta	-	\$ 2,847.24	\$ 1,590.00	\$ 1,257.24	60.26%		
	Vera-Cruz	Colmera	Konstrusaun Valeta	-	\$ 34,750.00	\$ 16,454.35	\$ 18,295.65	48.62%	\$ 34,750.00	48.62%
	Nain Feto	Bidau Lecidere	Sede Suku	-	\$ 32,245.94	\$ 3,427.00	\$ 28,818.94	26.62%	\$ 35,000.00	14.49%
			Fatin Lixu (B Lesidere & Aldea Kapela)	-	\$ 2,754.06	\$ 1,286.50	\$ 1,467.56	2.35%		
	Dom Aleixo	Kampo Alor	Rehab Valeta (Aldea 01 & 02)	-	\$ 17,269.03	\$ 2,081.35	\$ 15,187.68	87.41%	\$ 34,500.00	87.41%
			Morro Haleu Sede Suku (Sede Suku)	-	\$ 17,230.97	\$ 5,440.00	\$ 11,790.97	87.41%		
		Comoro	Aumenta Sala Klinika -Aldea Anin Fuik	-	\$ 14,451.79	\$ 5,934.90	\$ 8,516.89	79.33%	\$ 34,250.00	53.57%
Konstrusaun MCK -Aldea Metin IV			-	\$ 4,047.18	\$ 2,720.75	\$ 1,326.43	59.56%			
Konstrusaun Centru Komunitariu			-	\$ 15,751.03	\$ 8,386.90	\$ 7,364.13	21.81%			
TOTAL DISTRITU			12		\$ 212,250.00	\$ 76,302.75	\$ 135,947.25	56.03%		
Ermera	Ermera	Ponilala	Konstrusaun Centru Comunitario Aldea Sakoko	-	\$ 14,358.69	\$ 7,433.00	\$ 6,925.69	72.45%	\$ 44,250.00	69.95%
			Konstrusaun Centru Comunitario Aldea Hatuposi	-	\$ 15,447.38	\$ 7,366.00	\$ 8,081.38	65.00%		
			Konstrusaun Centru Comunitario Aldea Eroho	-	\$ 14,443.93	\$ 7,240.00	\$ 7,203.93	72.40%		
		Humboe	Konstrusaun Be'e Mos Aldea Borhei	-	\$ 23,782.77	\$ 10,755.00	\$ 13,027.77	38.79%	\$ 39,749.42	52.95%
			Konstrusaun Centru Komunitario Aldea	-	\$ 15,966.65	\$ 6,249.25	\$ 9,717.40	67.11%		
		Talimoro	Konstrusaun Centru Comunitario Aldea Liberty	-	\$ 15,554.56	\$ 8,536.50	\$ 7,018.06	80.00%	\$ 34,948.70	86.16%
	Konstrusaun Centru Comunitario Aldea Bura		-	\$ 15,554.56	\$ 10,954.50	\$ 4,600.06	78.48%			
	Konstrusaun MCK Suco Talimoro		-	\$ 3,839.58	\$ 4,417.25	\$ (577.67)	100.00%			
	Railaco	Railaco Leten	Konstrusaun Centru Komunitario Aldea Colhuinamo	-	\$ 15,719.70	\$ 8,822.25	\$ 6,897.45	81.00%	\$ 39,499.91	82.33%
			Konstrusaun Centru Komunitario Aldea Tilesu	-	\$ 15,722.70	\$ 10,420.25	\$ 5,302.45	81.00%		
			Konstrusaun Be'e Mos Aldea Tilesu	-	\$ 8,057.51	\$ 5,002.75	\$ 3,054.76	85.00%		
		Matata	Konstrusaun Centro Comunitario Aldea Tarmasari	-	\$ 15,509.70	\$ 18,506.00	\$ (2,996.30)	100.00%	\$ 39,498.40	100.00%
			Konstrusaun Centro Comunitario Aldea Mauane	-	\$ 15,509.70	\$ 16,165.75	\$ (656.05)	100.00%		
			Rehabilitasaun Be'e Mos Suco Matata	-	\$ 8,479.00	\$ 4,345.25	\$ 4,133.75	100.00%		
			Tokoluli	Rehabilitasaun Be'e Mos Aldea Kaisahe no Marobo	-	\$ 34,968.56	\$ 26,692.25	\$ 8,276.31		
TOTAL DISTRITU			15		\$ 232,914.99	\$ 152,906.00	\$ 80,008.99	80.42%		
Liquisa	Liquisa	Loidahar	Centro Comunitario Aldeia Soatala	-	\$ 19,710.42	\$ 13,971.55	\$ 5,738.87	74.27%	\$ 39,320.07	69.24%
			Centro Comunitario Aldeia Kotalara	-	\$ 19,609.65	\$ 13,971.55	\$ 5,638.10	64.20%		
		Darulete	Centro Comunitario Aldeia Manupatia	-	\$ 19,688.57	\$ 14,253.25	\$ 5,435.32	84.26%	\$ 39,346.67	84.05%
			Centro Comunitario Aldeia Kailili	-	\$ 19,658.10	\$ 14,253.25	\$ 5,404.85	83.84%		
		Loculai	Centro Comunitario Aldeia Metagou	-	\$ 19,318.23	\$ 15,469.75	\$ 3,848.48	90.83%	\$ 39,494.55	95.42%
			Rehabilitasaun Be'e Mos Aldeia Iebuana	-	\$ 20,176.32	\$ 14,919.15	\$ 5,257.17	100.00%		
	Bazartete	Fatumasi	Centro Comunitario Aldeia Metir	-	\$ 19,218.27	\$ 12,499.29	\$ 6,718.98	57.23%	\$ 39,477.36	59.78%
			Rehabilitasaun Be'e Mos Aldeia Bazartete	-	\$ 20,259.09	\$ 12,174.28	\$ 8,084.81	62.32%		
		Mota Ulun	Centro Comunitario Aldeia Mota Ikun	-	\$ 18,346.97	\$ 9,936.70	\$ 8,410.27	81.43%	\$ 39,435.58	80.72%
			Rehabilitasaun Be'e Mos Aldeia Mauluto	-	\$ 21,088.61	\$ 13,175.35	\$ 7,913.26	80.00%		
TOTAL DISTRITU			11		\$ 241,175.62	\$ 151,787.12	\$ 89,388.50	74.85%		

Annexa 4.2 Tabela Progresu Fiziku no Gastus Fundus Infraestrutura

Manatutu	Laclo	Lacu Mesak	Konstrusaun Moru Haleu Centru Komunitariu		\$ 13,797.03	\$ 6,752.25	\$ 7,044.78	48.94%	\$ 44,250.00	60.07%
			Konstrusaun Sintina Publika		\$ 7,160.82	\$ 2,722.35	\$ 4,438.47	40.25%		
			Rehabilitasaun Be'e Mos Hatuconan		\$ 8,227.04	\$ 2,230.45	\$ 5,996.59	62.17%		
			Konstrusaun Be'e Mos		\$ 15,065.11	\$ 12,562.90	\$ 2,502.21	88.92%		
		Uma Kaduak	Konstrusaun Moru Haleu Centru Komunitariu		\$ 6,876.03	\$ 3,009.00	\$ 3,867.03	53.20%	\$ 44,250.01	64.47%
			Konstrusaun Moru Haleu Klinika Fatumeta		\$ 4,854.97	\$ 2,724.50	\$ 2,130.47	98.83%		
			Konstrusaun Moru Heleu Escola Primario		\$ 6,096.03	\$ 3,402.00	\$ 2,694.03	98.17%		
			Rehabilitasaun Tanki Be'e Mos		\$ 6,684.04	\$ 3,081.50	\$ 3,602.54	57.39%		
			Konstrusaun MCK escola Filialmarmar		\$ 7,060.82	\$ 1,540.15	\$ 5,520.67	30.82%		
			Rehabilitasaun Posto Saudi		\$ 12,678.12	\$ 3,243.95	\$ 9,434.17	48.39%		
		Uma Naruk	Rehabilitasaun Uma Babainaka		\$ 17,853.60	\$ 9,500.60	\$ 8,353.00	54.27%	\$ 39,499.59	29.30%
			Rehabilitasaun Be'e Mos		\$ 9,365.32	\$ -	\$ 9,365.32	0.00%		
			Konstrusaun Aumenta Sala Escola Bua		\$ 12,280.66	\$ 3,582.95	\$ 8,697.71	33.62%		
	Manatutu vila	Ma'abat	Rehabilitasaun Ponte Kiik		\$ 7,801.99	\$ 4,501.97	\$ 3,300.02	100.00%	\$ 34,999.78	120.81%
			Konstrusaun Armenta Sala Centru Komunitariu		\$ 5,981.37	\$ 3,056.20	\$ 2,925.17	78.21%		
			Rehabilitasaun Valeta Soraha		\$ 21,216.42	\$ 7,751.70	\$ 13,464.72	63.41%		
		Sau	Rehabilitasaun Centru Komunitariu-Sau		\$ 17,865.01	\$ 8,155.00	\$ 9,710.01	64.42%	\$ 44,499.22	75.86%
			Konstrusaun Centru Komunitariu-Obrato		\$ 13,312.57	\$ 11,606.00	\$ 1,706.57	68.46%		
			Konstrusaun Sintina Publika-Balak		\$ 6,660.82	\$ 4,705.00	\$ 1,955.82	70.55%		
			Konstrusaun Sintina Publika-We Ra'in		\$ 6,660.82	\$ 4,314.75	\$ 2,346.07	100.00%		
		Cribas	Rehabilitasaun Sentro Communitario-Cribas		\$ 28,177.08	\$ 9,264.75	\$ 18,912.33	36.45%	\$ 44,250.00	29.40%
			Konstrusaun Centru Komunitariu - Caunua		\$ 16,072.92	\$ 2,779.50	\$ 13,293.42	22.34%		
TOTAL DISTRITU		30	22		\$ 251,748.60	\$ 110,487.47	\$ 141,261.13	59.95%		
TOTAL NASIONAL			75		\$ 1,179,839.21	\$ 619,785.04	\$ 560,054.17	67.70%		

Annexas 4.3 Fotografia Atevidades -Relatoriu Janeiro 2014

Rezultadu Progressu Ate Dezembro 2013



Annexas 4.3 Fotografia Atevidades -Relatoriu Janeiru 2014



Annexas 4.3 Fotografia Atevidades -Relatoriu Janeiro 2014





Annexas 4.3 Fotografia Atevidades -Relatoriu Janeiru 2014



Annexas 4.3 Fotografia Atevidades -Relatoriu Janeiru 2014



Annexas 4.3 Fotografia Atevidades -Relatoriu Janeiro 2014



Annexas 4.3 Fotografia Atevidades -Relatoriu Janeiro 2014



Atevidades Faze I



Annexas 4.3 Fotografia Atevidades -Relatoriu Janeiru 2014



Annexas 4.3 Fotografia Atevidades -Relatoriu Janeiru 2014



Planu Servisu Fulan Tuir Mai Fevereiro 2014

PILOT		FAZE I		FAZE II	
Atividade	Fevereiro	Atividade	Fevereiro	Atividade	Fevereiro
Enkontru Akontabilidade 1		Treinamentu Modul A & B		Sozializasaun Sub Distrito	
Treinamentu Modul J, K, L		Prioridades Aldeias & Sucos		Sozializasaun Suco & Aldeia	
Kompletu konstrusaun		Treinamentu Modul E		Eleisaun ba CMT	
Enkontru akontabilidade final		Survei, desenho, kusto no verifikasaun		Loke konta bankaria	
Audit Final		Asina akordu implementasaun		Transfere fundu operacional	
Entrega projeitus ba EOM		Treinamentu Modul F, G, H, I		Treinamentu Modul C & D	
		Prosesu & transfere orsamentu fundus infras l		Treinamentu Modul A & B	
		Aprovisionamentu no implementasaun konstrusaun		Prioridades Aldeias & Sucos	
				Treinamentu Modul E	
