



Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

National Program for Village Development

Relatóriu Mensal Janeiru 2016



Rua de : Bedik-Hun
Dili-Timor Leste

Programa Nacional de Desenvolvimento Sucos PNDS



OFÍCIO
No : 102 /PNDS.MPIE-MAE /II /2016

Hato'o ba :

1. Sua Ex. cia Ministro Planeamentu e Investimentu Estratégico,
2. Sua Ex. cia Ministro Administração Estatal,
3. Sua Ex. Cia Vicê Ministro Administração Estatal,

Assuntos : Relatoriu Mensal - Progresu Implementasaun PNDS - Janeiro 2016


Excelencias,

Relaciona ho assunto nebe mensionado iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio mensal ba fulan Janeiro 2016 konaba progresu ezekusaun Faze I, II, III no Faze I siklu 2 no implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) bazeia ba relatóriu husi Komunitade.

Ida ne'e mak relatorio mensal PNDS, ba sua. Excêlências sira nian konsiderasaun, Obrigada



Dili, 25 Fevereiro 2016


Dulce Guterres Junior
Diretora PNDS

Copia ba :

1. Ex.mo : Diretor Jeral Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (DG-ADN),
2. Ex.mo : Diretor Jeral Desentralizasaun administrativa (DG DA),
3. Arkivu



Ministério do Planeamento e
Investimento Estratégico
Hudi Iaran, Fatuhada,
Dili, Timor-Leste
info@pnds.gov.tl

KONTEUDU



1. Progresu gastu subsidiu husi relatorio komunidade
2. Progresu atividades faze I, II, III & faze I siklus II
3. Dezafius
4. Rekomendasaun

1. PROGRESU GASTUS NO FISIKU HUSI KOMUNIDADE

Esplikasaun konaba progresu gastu ezekusaun orsamentu PNDS ba, Faze II & Faze III No Faze I Siklus 2, fulan Janeiru 2016 mak hanesan tuir mai ne'e :


» FAZE II

Progresu ezekusaun iha nivel komunidade ba iha 91 suku iha fulan Janeiru, Subsidiu Operasional gastu ona **\$421,178.28** ou **78.91%** husi total **\$533,750.00** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$3,520,769.63** ou **87.45%** husi total Orsamentu **\$4,026,250.00**. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

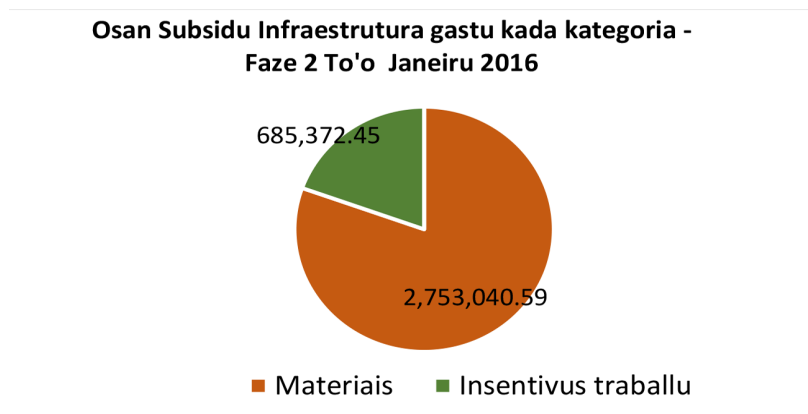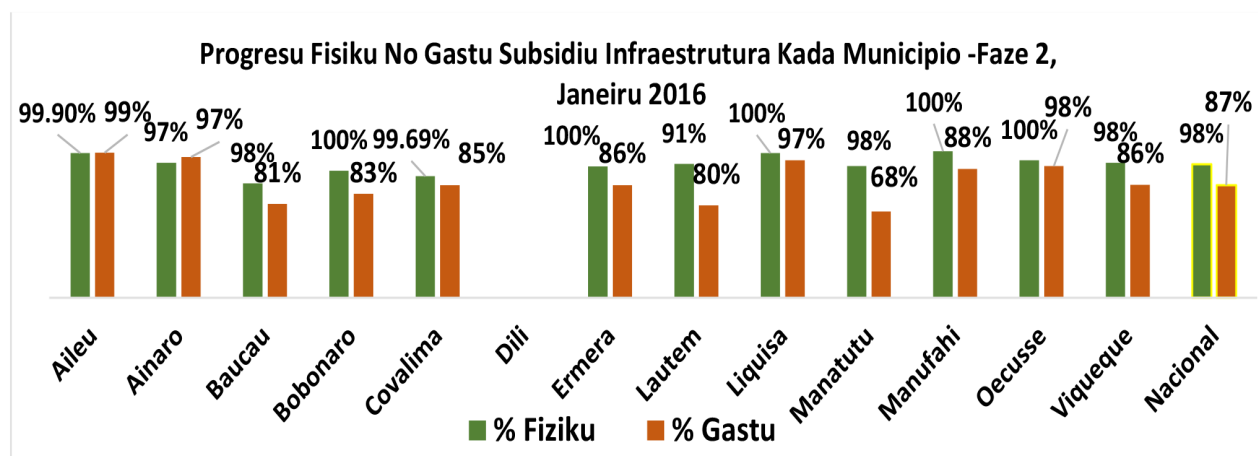


» FAZE III

Progresu ezekusaun iha nivel comunidade ba iha 202 suku iha fulan Janeiru, Subsidiu Operasional gastu ona **\$538,749.04** ou **44.39%** husi total **\$1,213,768.28** no Subsidiu Infraestrutura gastu ona **\$2,085,577.92** ou **24.41%** husi total Orsamentu **\$8,635,605.42**. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

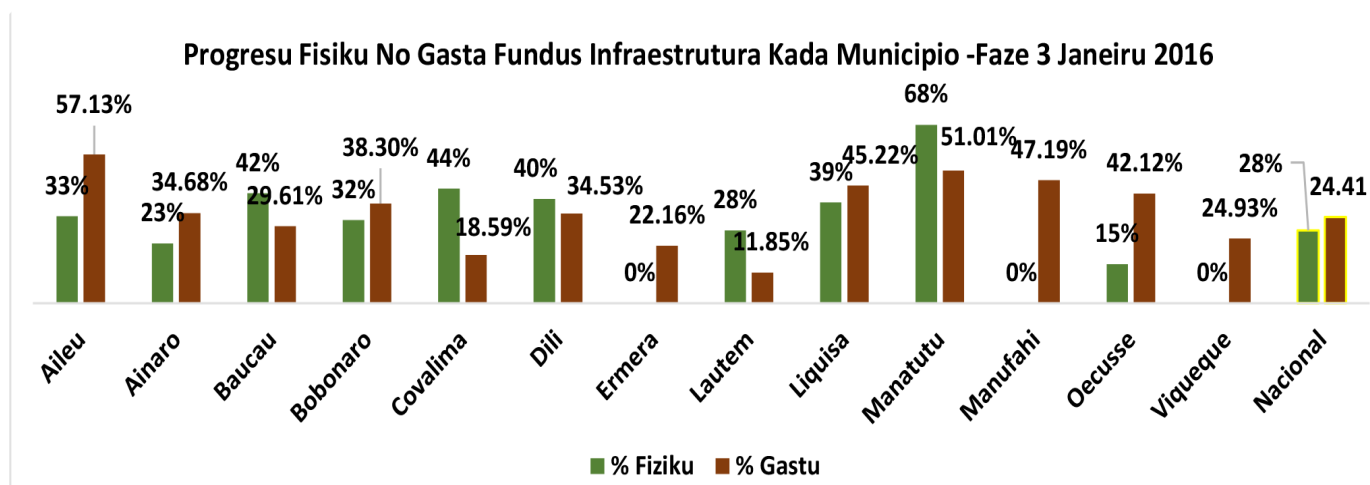

» FAZE I SIKLU 2

Orsamentu ba Faze I Siklus 2 hamutuk **\$1,316,758.95** no gastu ona **\$478,076.75** ou **6.31%**. Orsamentu restu husi Faze I siklus 1 ne'be mak atu suporta ba aktividade & progresu Faze I Siklus 2 hamutuk **\$433,903.80**. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

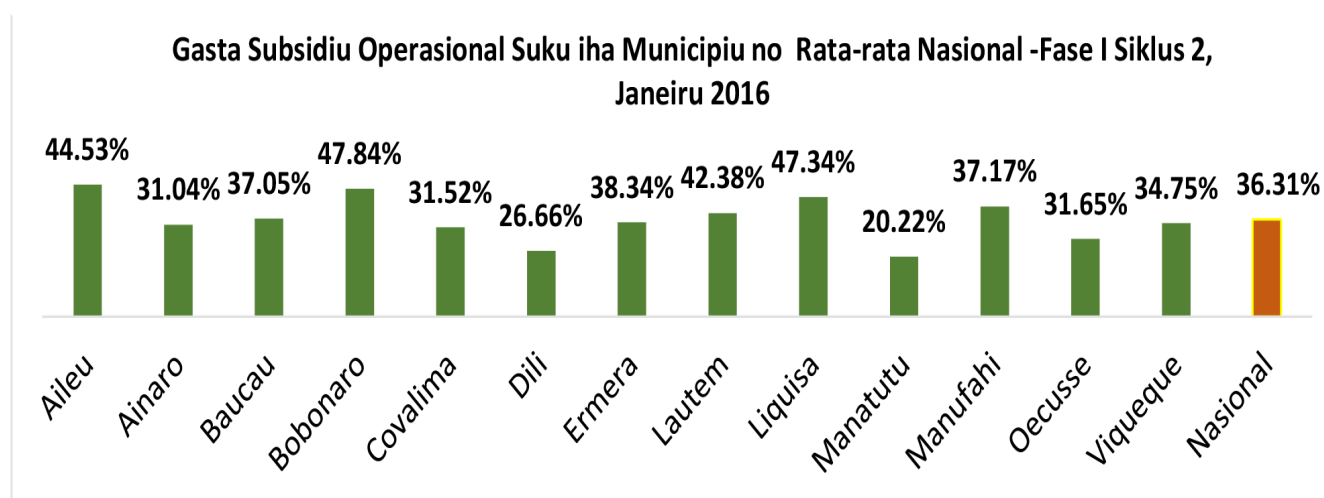


2. PROGRESU AKTIVIDADES

Iha fulan Janeiro 2016, progresu implementasaun PNDS ne'be mak elabora kona ba progresu atividades no Atividades prinsipal husi prosesu implementasaun tuir Siklus PNDS mak hanesan tuir mai ne'e :

FAZE I

- 149 Suku no 335 projetu kompleta hotu ona konstrusaun. Projetu sira ne komesa utiliza husi comunidade. Atu hatene grafiku numeru benefisiarius ba iha Faze I Hare grafiku tuir mai ne'e :


Numeru Benefisiarius Ba Projetu Faze I

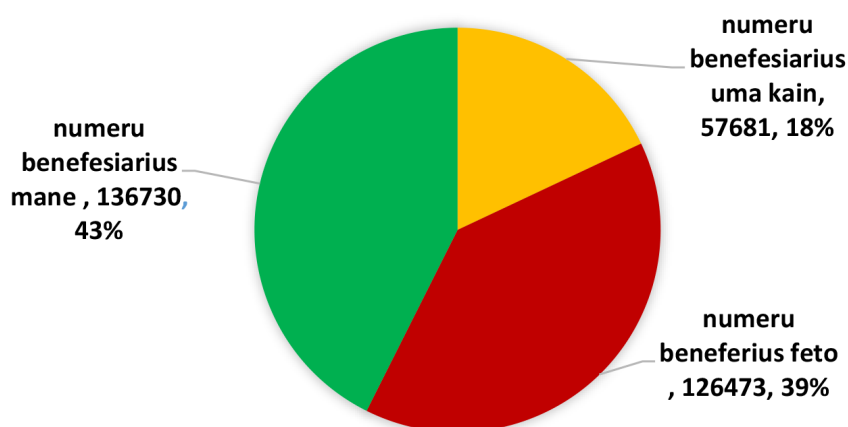

FAZE II

Faze II implementa ba iha 91 suku ho total projetus hamutuk 218 projetus . Progresu atividade tuir siklu implementasaun, tama ona ba etapa 11 no 12 (kompleta konstrusaun no encontru akontabilidade final). Esplikasaun detailu kona ba Progresu

o Projetu Final Faze II

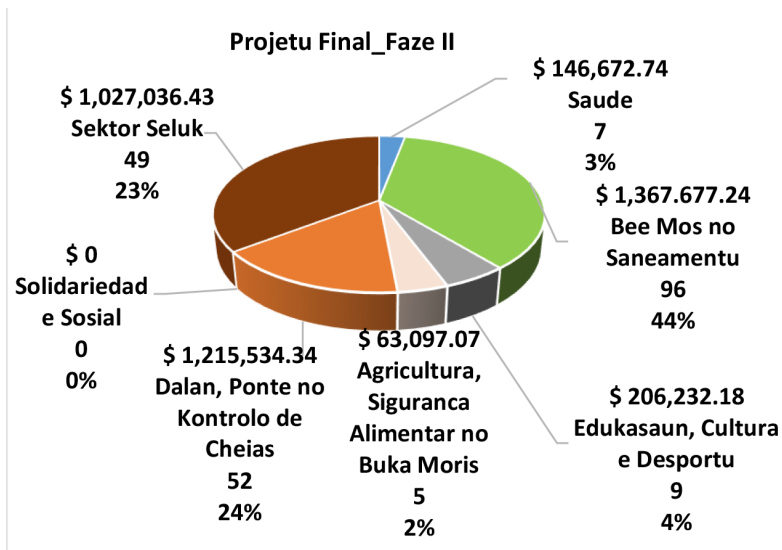

Hare ba grafiku projetu Final Faze II iha sorin, ita hare katak sektor Bee Mos no Saneamento hetan porsentu maka'as liu kompara ho sektor sira seluk.

- 193 projetus mak atinji ona 100% husi total projetu 218 no 25 projetu iha faze finalizasaun projetus.




Kompleta kostrusaun Projetu Bee Mos iha Suku Fahisoi, Municipiu Aileu ho total Orsamento \$14,822.06

- Progresu fisiku rata-rata nivel nasional 98.52%
- Husi 91 Suku, 80 Suku halo ona Enkontru Akountabilidade final no 11 Suku mak sei prosesu kompleta kostrusaun.

FAZE III

Progresu implementasaun ba iha suku 202 no progresu atividades tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 10 (sertifikasaun primeiru no enkontru akontabilidade 50%) . Esplikasaun detailu mak hanesan tuir mai ne'e :

o Projeto final faze III

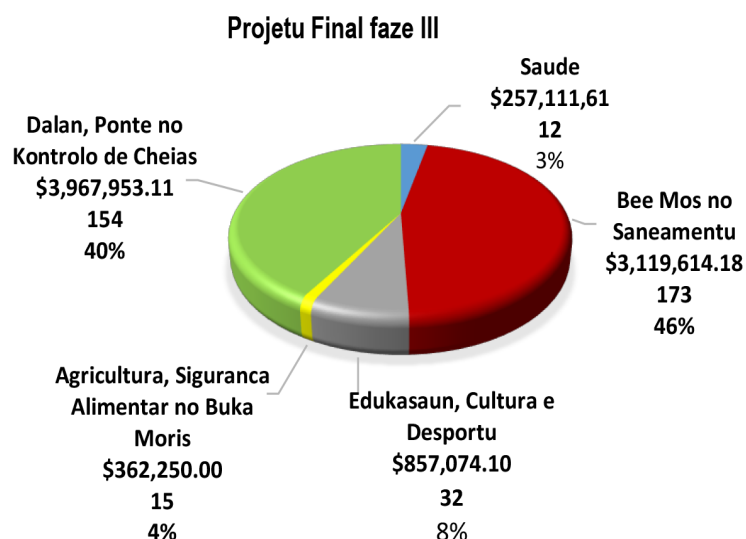

Hare ba grafiku projektu Final faze III iha sorin, ita hare katak sektor Be'e mo'os no Saneamento hetan porsentu bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.


Treinamentu ba modul A kompleta ona iha suku 201, no sukus nebe mak halao tiha ona Treinamentu modul hanesan : (B= suku 198, C= suku 188, D= suku 192, E= suku 161, F= suku 153, G= suku 153, H= suku 140, no I= 104, J= suku 17, K= suku 17, L= suku 11).

Total_Partisipasaun_Generu_Treinamento EJS_Modul

Faze III

Modul Treinamento

- A: Introdusaun no Planeamento
- B: Kapasitasaun Feto 1
- C: Orientasaun ba Fasilitator Suku
- D: Jestaun Finansas 1
- E: Hakerek Proposta
- F: Kapasitasaun Feto 2
- G: Jestaun Konstrusaun
- H: Jestaun Finansas 2
- I : Monitorizasaun no Akontabilidade
- J: Operasaun no Manutensaun
- K: Jestaun Finansas 3
- L: Monitorizasaun no O&M

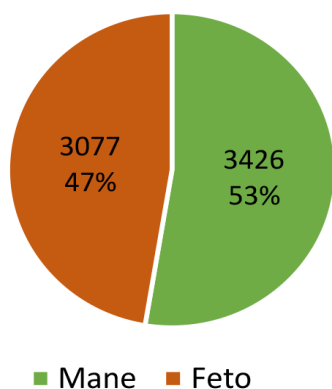

Grafiku iha sorin, reprezenta dados partisipante generu iha treinamentu ba modul A-L faze III. Grafiku iha sorin hatudu katak persentajen mane bo'ot liu kompara ho persentajen feto.




Projetu Rehabilitasaun Estrada Suku Deudet, PA Lolotoe- Bobonaro
iha prosesu konstrusaun hela ho total Orsamento
\$48,500.00

- Iha 202 Suku, Suku 7 mak halo ona Enkontru Akountabilidade primeiru no 195 Suku sei prosesu konstrusaun.
- Progresu rata-rata atinji ona **28.07%**.

» FAZE I SIKLU 2

Faze I siklu 2 Suku sira nebe mak finaliza ona sira nian siklu I, no agora dadaun, progresu atividade tuir siklu implementasaun mak, tama ona ba etapa 7 (preparasaun ba planu detalhu no transferensia fundus 50% ba 31 suku) . Esplikasaun klaru kona ba progresu implementasaun actividades FAZE I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Janeiru 2016 maka hanesan tuir mai ne'e :


o Prioridades Final Faze I Siklu II

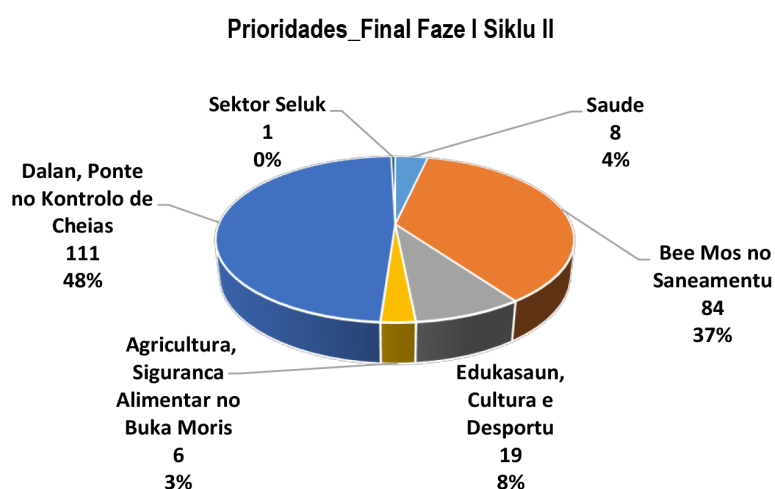

Harre ba grafiku determina Prioridade Final faze I Siklu II iha sorin, ita hare katak sektor dalan, ponte no kontrola cheias hetan porsentu bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.

- Treinamentu ba modul A kompleta ona iha Suku 68, no total sukus nebe mak halao ona treinamentu ba modul B= suku 69, C= suku 59, D= suku 49, E= suku 42, F= suku 39, G= suku 31), H= suku 31, I= suku 18, J= suku 14, K= suku 14, L= suku 14)

Total Partisipante EJS ba Modul Treinamentu Faze 1 siklu 2

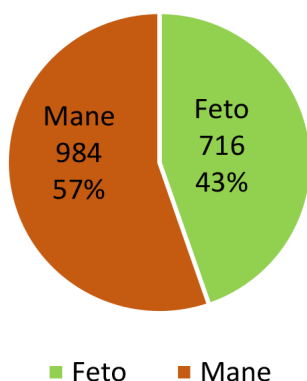

Grafiku iha sorin reprezenta total partisipasaun EJS modul treinamentu A-H ba Faze I siklu II. Se ita hare ba grafiku iha sorin katak, persentajen Mane bo'ot liu kompara ho persentajen Feto.



Ekipa sira komesa hahu halo preparasaun ba planu detallu

- Transferensia fundu 50% ba iha konta bankaria 31 suku halao ona
- Ba 118 suku agora dadaun komesa prepara ona ba planu detailhu

3. DEZAFIUS

- Linas seitoral iha Nasional no Munisipio seidauk iha kolaborasaun no kordenasaun diak
- Iha suku balun membru ekipa jestaun suku ladun halao sira nia funsaun ho diak tamba kestaun isentivu ba ekipa jestaun suku ki'ik, hetan serbisu seluk no balun kontinua eskola.
- Lider comunidade iha suku balun seidauk iha kolaborasaun diak hodi partisipa iha implementasaun programa.
- Komunitade iha suku balun seidauk senti sai nain ba programa hanesan PNDS iha sira nian suku laran
- Birokrasia foti osan PNDS prosesu naruk (kleur liu)
- Projetu balun lao tarde tamba material konstrusaun tarde
- Komunidaade nian rekursu iha suku laran, menus kuinesementu iha area Tekniku no Finansa

4. REKOMENDASAUN

- Persija kontinua halo treinamentu ba EJS
- Ekipa PNDS sei halo sosializasaun ka deziminasan program ba iha entidade hotu
- Ekipa PNDS nasional no Municipiu sei haforsa monitoring ba iha suku hodi bele fosuporta ba Implementasaun.

