




REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku **PNDS**

Relatóriu Mensal Fulan : Janeiru 2017

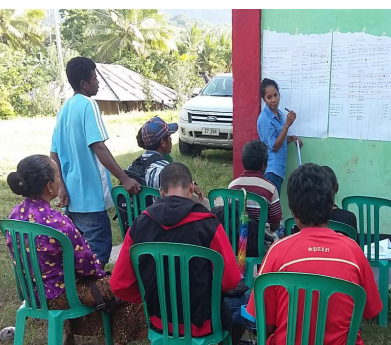

Programa Nacional de Desenvolvimento Sucus

PNDS



OFFÍCIO

No: 67 /PNDS.MPIE-MAE/III/2017

Hato'o ba :
: Sua Ex. Cia Ministro Planeamentu e Investimentu Estratégico,
: Sua Ex. Cia Ministro Administração Estatal,
: Sua Ex. Cia Vicê Ministro Administração Estatal,

Assuntos : Relatoriu Progresu Implementasaun PNDS – Janeiro 2017

Excelencias,

Relasiona ho assunto nebe mencionado iha leten, liu husi biban ida ne'e, hakarak submete relatorio mensal ba fulan Janeiro 2017, relatorio ne'e sei kobre progresu ezelesaun faze III, Faze I siklu 2, Faze II Siklu 2 no progresu global implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) bazeia ba relatorio husi Komunitade.

Ida ne'e mak relatorio mensal PNDS, ba sua. Excêlências sira nian konsiderasaun, Obrigada



Dili, 23. Fevereiro 2017

Dulce Guterres Junior

Diretora PNDS

CC ba :

- EX.^{mo} Diretor Jeral Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (DG-ADN),
- EX.^{mo} Diretor Jeral Desentralizasaun Administrativa (DG-DA),
- EX.^{mo} Diretor Jeral Servicos Cooperativos (DG-SC),
- Arquivo



Sekretariado PNDS:
Ministério do Planeamento e
Investimento Estratégico
Rua de : Bedik-Hun, Fatuhada-Timor Leste
E-mail : info@pnds.gov.tl
www.pnds.gov.tl

KONTEUDU


1.Progresu gastu subsídiu husi relatorio comunidade	2
2.Progresu atividades faze III & faze I siklus 2 no Faze II Siklu 2	4
3.Dezafius	12
4.Rekomendasaun	12

1. PROGRESU GASTUS NO FISIKU HUSI KOMUNIDADE

Esplikasaun konaba progresu gastu ezelesaun orsamentu PNDS ba Faze III, Faze I Siklus 2 no Faze II Siklu 2, fulan Janeiru 2017 mak hanesan tuir mai ne'e:


FAZE III

Progresu ezelesaun orsamentu iha nivel comunidade ba iha 202 suku iha fulan Janeiru, Subsídium Infraestrutura gastu ona \$ 7,760,327.73 ou 89.86% husi total Orsamentu \$ 8,635,605.42. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e:

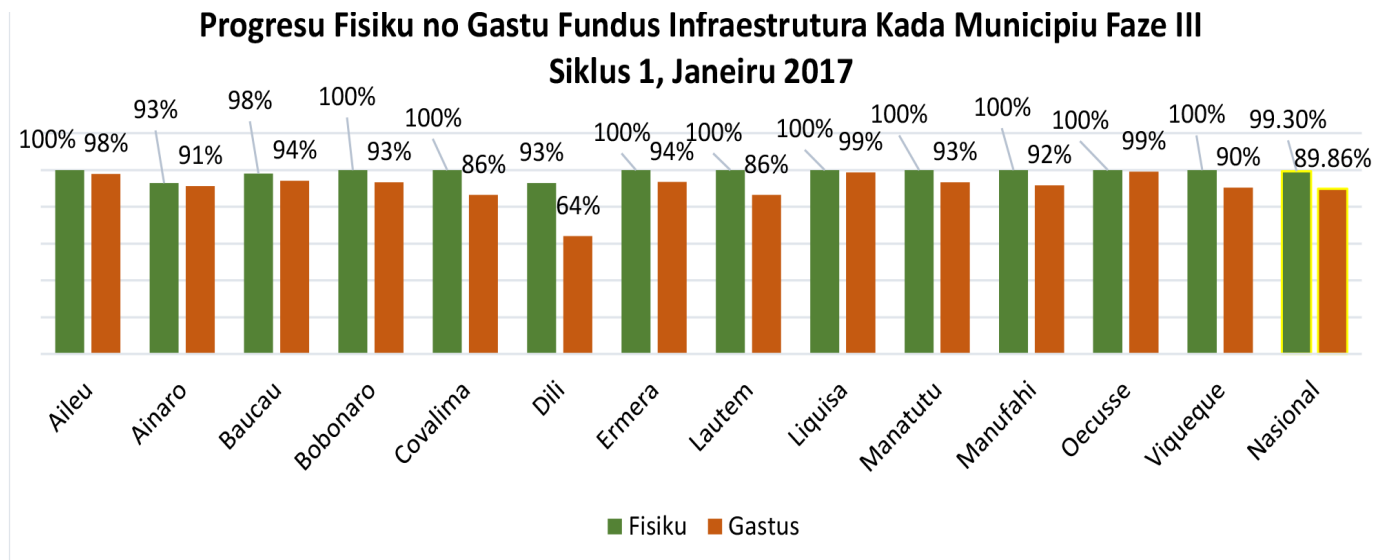

FAZE I SIKLU 2


Progresu ezelesaun orsamentu iha nivel comunidade ba iha 149 suku iha fulan Janeiru. Subsídium Infraestrutura gastu ona \$ 3,752,903.65 ou 56.59% husi total Orsamentu \$6,631,250.00. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e :

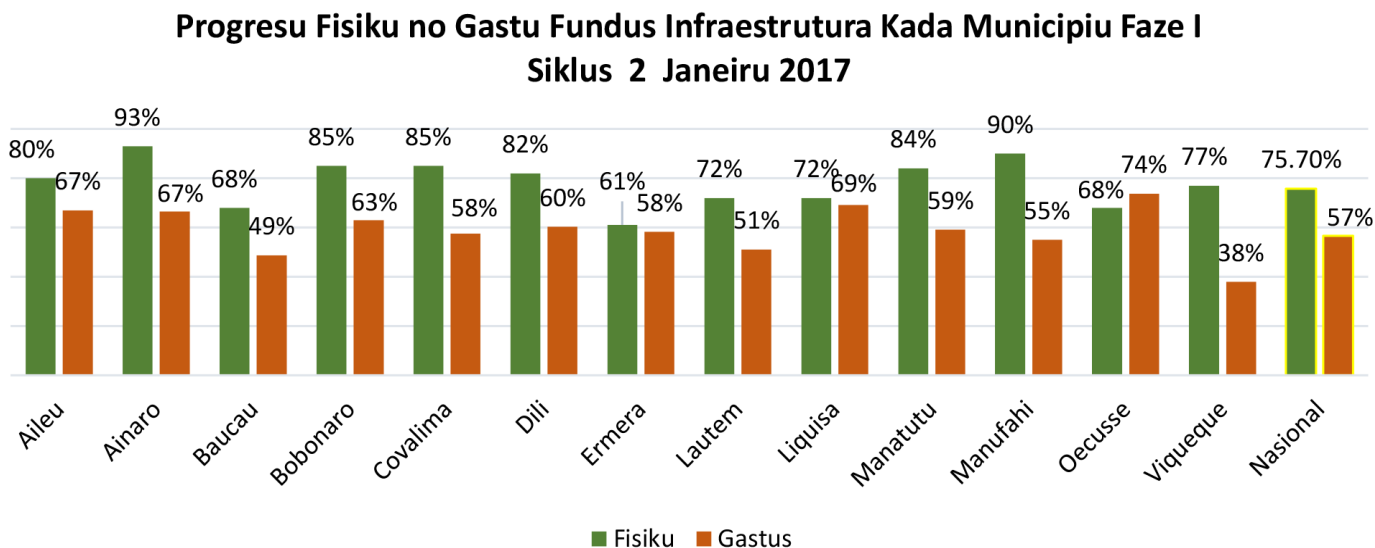

FAZE II SIKLU 2

Progresu ezelesaun orsamentu iha nivel comunidade ba iha 91 suku ba Subsídium Operasional gastu ona \$198,205.02 ou 31.55% husi total \$ 628,274.47 no Subsídium Infraestrutura gastu ona \$ 1,916,018.88 ou 47.59% husi total Orsamentu \$ 4,026,250.00. Atu hatene persentajen hare iha grafiku tuir mai ne'e:

**Progresu Fisiku no Gastu Fundus Infraestrutura Kada Municipiu Faze II
Siklus 2 Janeiro 2017**

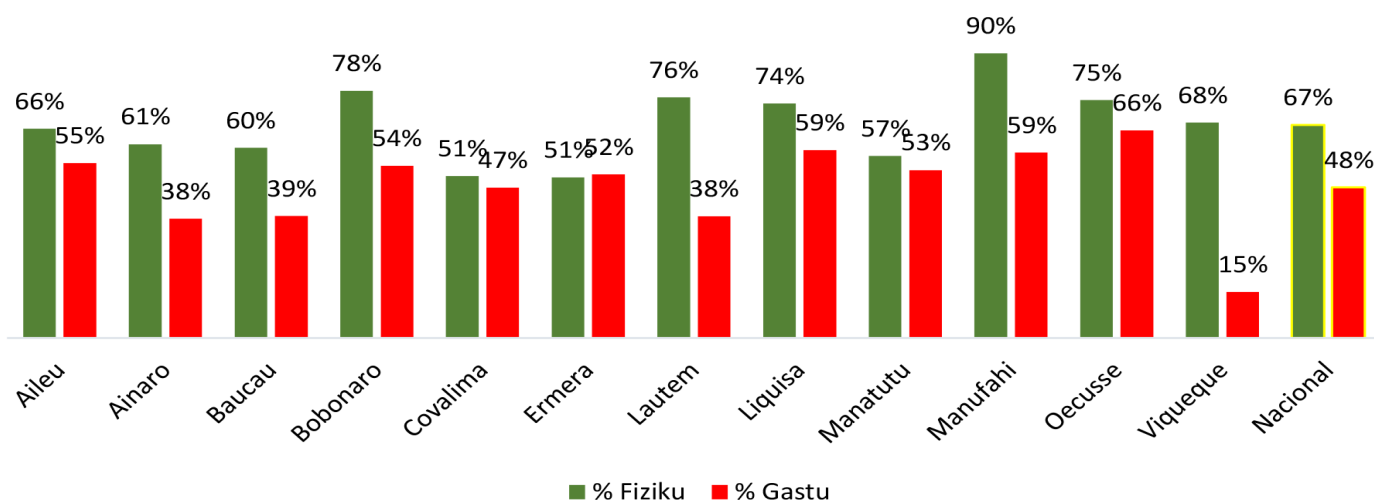

2. PROGRESU ATIVIDADES


Progresu atividade PNDS ne'ebe mak comunidade realiza iha fulan janeiru mak hanesan tuir mai ne'e:

FAZE III

Progresu implementasaun ba iha suku 202 no progresu atividades tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 11 no 12 (Kompleta Konstrusaun no Enkontru akontabilidade Final). Esplikasaun detailu mak hanesan tuir mai ne'e:

- **Projetu Final Faze III**


Projetu Final faze III

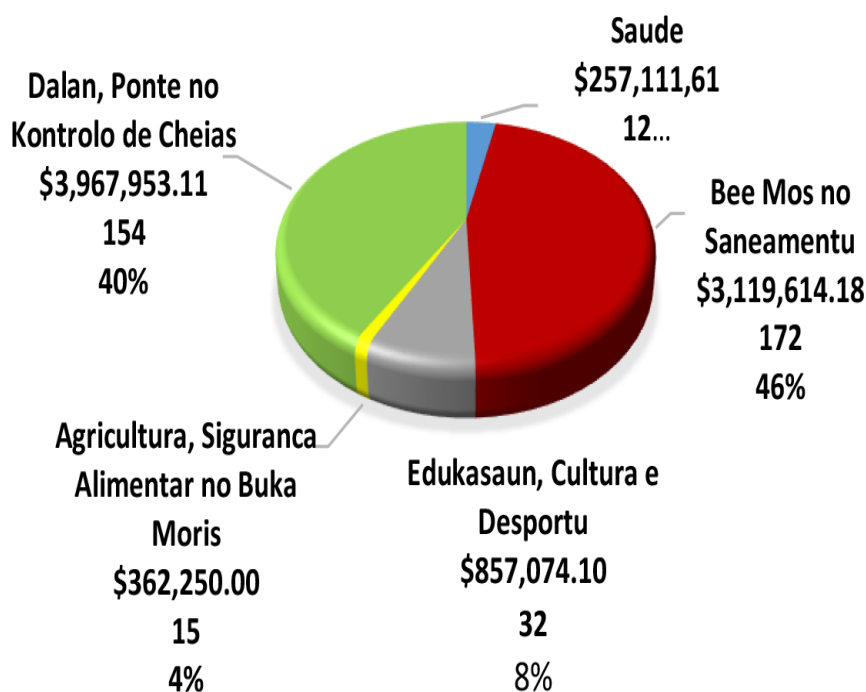

Hare ba grafiku projetu Final faze III iha sorin, nota katak sektor Be'e mo'os no Saneamento nudar projeitu ne'ebe persentazen bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.

- **Total Benefisiariu EJS ne'ebe Partisipa iha Treinamentu ba Faze III to,o fulan Janeiru**

Total EJS Treinamentu ba modul Faze III

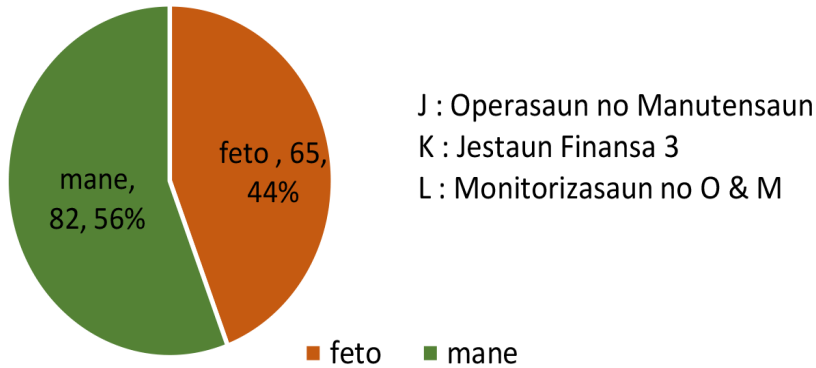

Grafiku iha sorin, reprezenta dadus partisipante EJS iha treinamentu ba modul J-L faze III. Grafiku iha sorin hatudu katak persentajen Mane bo'ot liu kompara ho persentajen Feto.



Extensaun Eskola Primaria iha Suco Tibar, Postu Administrativu Bazartete- Likisa. Ho total Orsamentu \$ 29,866.32


- Progresu rata-rata atinji ona 99.30%.
- Husi 385 Projetus 369 projetu mak kompleta ona konstrusaun ou 100%. No 12 Projetu mak
- sei prosesu kompleta konstrusaun ho progresu fisiku atinji ona 85%-95%. Projetu hat mak
- kanseladu tamba mudansa klimatika.
- Iha 202 Suku, Suku 133 mak halo ona Enkontru Akountabilidade final no 69 Suku sei prosesu organiza enkontru no prosesu finalizasaun konstrusaun.

FAZE I SIKLU 2

Faze I siklu 2 Suku sira nebe mak finaliza ona sira nian siklu 1, no agora dadaun, progresu atividade tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 9 (Implementasaun Projeitu). Esplikasaun klaru kona ba progresu implementasaun atividades Faze I Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Janeiru 2017 maka hanesan tuir mai ne'e:

- **Prioridade Final Faze I Siklu 2**


Total Partisipasaun Komunitade Treinamentu
ba EJS Modul ba Faze I Siklu II



Hare ba grafiku d e t e r m i n a Prioridade Final faze I Siklu II iha sorin, nota katak sektor dalan, ponte nokontrola cheias hetan porsentu bo'ot liu kompara ho sector sira seluk.

- **Total Partisipasaun Komunitade Modul Treinamentu ba EJS Faze I Siklu 2 to,o fulan Janeiru**

Total Partisipasaun Komunitade Treinamentu
ba EJS Modul ba Faze I Siklu II



Grafiku iha sorin total partisipasaun K o m u n i d a d e Treinamentu ba EJS iha Modul Treinamentu I (Monitorizasaun n o Akontabilidade) ba Faze I siklu II. nota ba grafiku iha sorin katak, persentajen Mane bo'ot liu kompara ho persentajen Feto.

- Iha faze ida neé total projetu hamutuk 216 projetu no projetu nebeé kompletu ona konstrusaun hamutuk 29 projetus, falta 186 projetu mak sei prosesu kompleta konstrusaun.
- Husi 149 suku, 68 suco mak Halo ona enkontru akontabilidade primeiru
- Progresu rata-rata atinji ona 75.70%




Tamba be'e mos nesidade ne'ebe urjenti, Projetu seidauk atinji 100% maibe comunidade komesa utilija ona beé mos ba nesesidade lorloron iha suku Taroman Postu Administrativo Fatululik ho total orsamentu\$ 29,943.02.

- Iha faze ida neé total projetu hamutuk 216 projetu no projetu nebeé kompletu ona konstrusaun hamutuk 29 projetus, falta 186 projetu mak sei prosesu kompleta konstrusaun.
- Husi 149 suku, 68 suco mak Halo ona enkontru akontabilidade primeiru
- Progresu rata-rata atinji ona 75.70%

FAZE II Siklu 2

Faze II siklu 2, Suku sira nebe mak finaliza ona sira nian siklu 1, no agora dadaun, progresu atividade tuir siklu implementasaun mak tama ona ba etapa 9 (komesa konstrusaun). Esplikasaun klaru kona ba progresu implementasaun atividades Faze II Siklus 2 nebe'e mak realiza ona iha fulan Janeiro 2017 maka hanesan tuir mai ne'e:

• Prioridade final Faze II siklu II

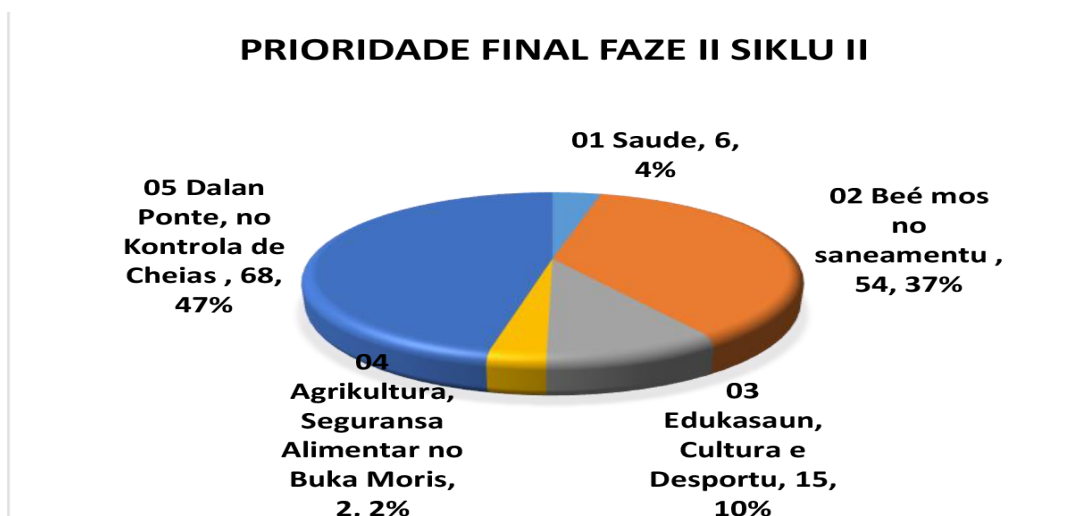

- Husi 143 projetu, projetu 10 mak kompleta ona konstrusaun no 133 projetu mak sei iha prosesu kompleta konstrusaun.
- Faze ida ne'e implementa iha 91 suku no suku nebe mak halo ona enkontru akontabilidade dahuluk hamutuk 34 suku.
- Progresu rata rata atinji ona 67.29%



Konstrusaun
Ponte iha suku
Nunumugoe postu
administrativo Hatu-
bulico – Ainaro. Ho
total orsamento \$
19,875.00

ATIVIDADE GERAL SEKRETARIADU TEKNIKU PNDS (ST. PNDS)

Progresu Atividades PNDS ne'ebe mak elabora kona ba atividades no Atividades prinsipal husi ST. PNDS mak hanesan tuir mai ne'e:

• Enkontru Konaba Planu Integradu Nasional no Municipiu

PNDS realiza sorumutu nasional iha dia 13/1/2017 iha JL. Villa no objetivu husi enkontru ida ne'e mak: Atu hetan lisaun apredezajen husi implementasaun PNDS tinan 2016 hodi hamosu estratejia ba Municipiu. Partisipa husi Directora PNDS, Xefe Unidade Operasional, Xefe Unidade administrasaun finansa, Diretor delegasaun 12 Municipiu no RAE OA, Parseiru Cardno no Funsionariu PNDS nasional. Total Partisipante hamutuk 60.



Diskusaun Konaba Dezafiu no
Susesu iha Implementasaun
PNDS 2016

• Sorumutu Avaliasaun Annual Konaba Implementasaun PNDS 2016

Avaliasaun annual ba implementasaun Programa PNDS ida ne'e hala'o iha Municipio Aileu no Municipio Manatuto. Sorumutu Avaliasaun Annual ne'e ho nia objetivu atu revé fila fali vantajen no dezvantajen ne'ebé ekipa Munisípiu sira infrenta iha implementasaun programa PNDS. Atividade ikus ba iha sorumutu avaliasaun annual ida ne'e mak fo apresiasaun ba iha suku melhor sira liu husi entrega premiu.

Enkontru ne'e partisipa husi Diretora PNDS, Presidente Autoridade Municipiu ho administrador Postu Administrativu, Lider komunitáriu, Ekipa Jestaun Suku, Ekipa PNDS Nasional nomos Munisípiu no inklui ekipa apoiu PNDS husi Cardno. Total Partisipante hamutuk 124.




Diretora PNDS entrega taxa ba suku hirak ne'ebé jestaun diak iha implemetasun PNDS

- Partisipa enkontru konaba lalaok bens serbisu iha Ministeriu Finansa
- Partisipa enkontru ho Diretora, Chefe Unidade Chefe Departementu no Diretor Delegasaun PNDS 12 Municipius no RAEOA konaba Planu serbisu tinan 2017
- Partisipa Enkontru ho Direktor Administrasaun Financas MAE konaba prosesu manutensaun viaturas e motorizadas 12 municipais no RAEOA no Prepara Planu Lojistika hodi apoio atividade PNDS nasional no Municipiu
- **Treinamentu**
 - Treinamentu ba ekipa Municipiu Lautem no Baucau konaba ITC mobile training. Total partisipante hamutuk 11.
 - Treinamentu ba fasilitador teknika postu administrativu etapa I konaba fasilitasaun comunidade iha Maries Tropes Dili, durante fulan ida. Total partisipante hamutuk 31.



FTPA sira Partisipa treinamentu fasilitasaun comunidade

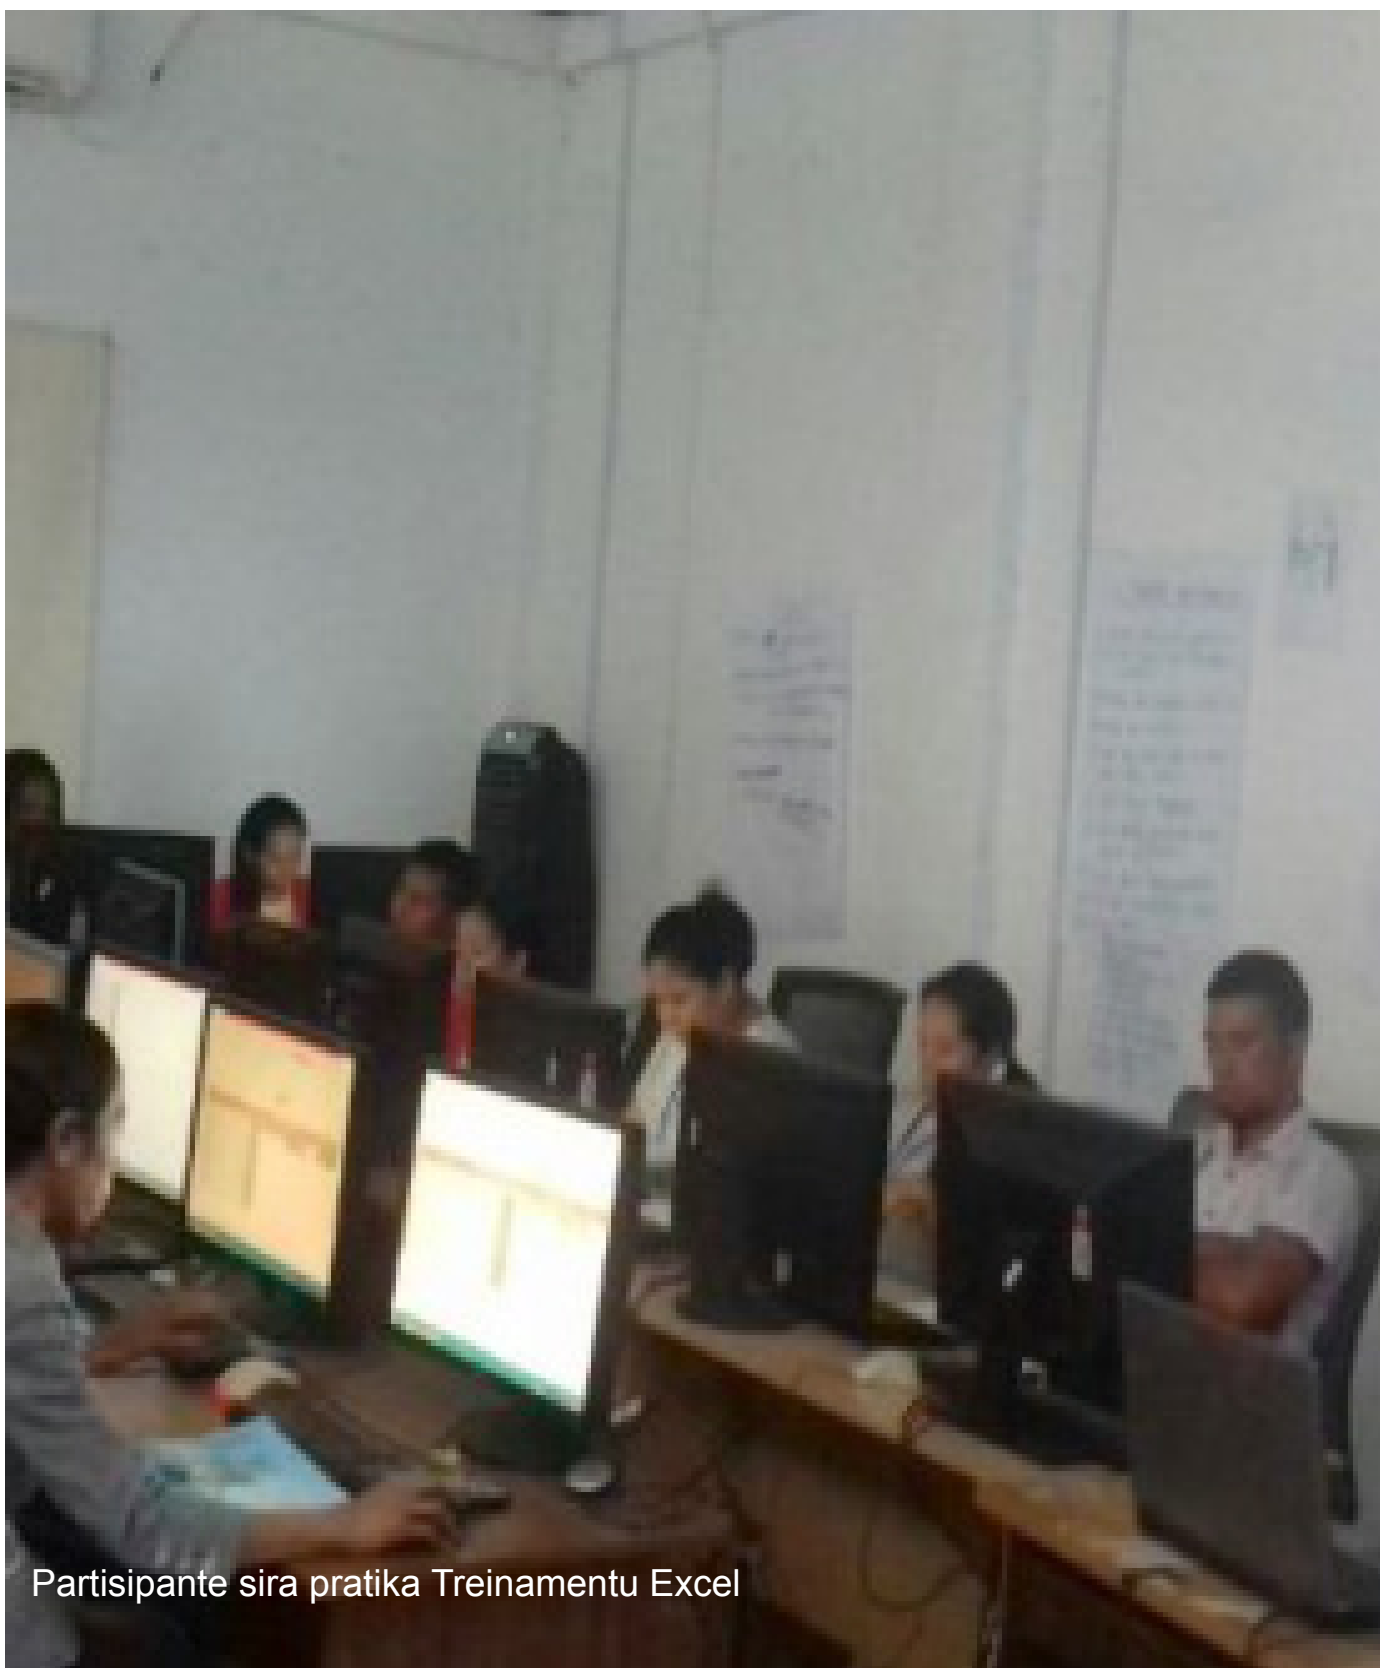

Partisipante sira pratika Treinamentu Excel

- Finaliza Relatoriu Exekusaun Orsamentu Adiantamento PNDS tinan 2016 no Prepara Planu Ezekusaun Orsamento ba iha 2017
- Prepara Planu hodi apoio Lojistika ba atividade PNDS nasional no Municipiu

3. Dezafius

- Iha suku balun membru ekipa jestaun suku ladun halao sira nia funsaun ho diak tamba ekipa balun kestaun isentivu ba ekipa jestaun suku ki'ik, hetan serbisu seluk, no balun kontinua eskola.
- Lider komunidad iha suku balun seidauk iha kolaborasaun diak hodi partisipa iha implementasaun programa.
- Komunidade iha suku balun seidauk senti sai nain ba programa hanesan PNDS iha sira nian suku laran
- Projetu balun lao tarde tamba material konstrusaun tarde (tempu udan susar atu asesu dalan/ lori material ba fatin projeitu)
- Mudansa ba iha estrutura suku, membru Ekipa Jestaun Suku iha suku balu eleitu nudar xefe suku no membru konselho do Suku.

4. Rekomendasaun

- Persija kontinua halo treinamentu ba EJS no halo treinamentu ba membru EJS foun
- Ekipa PNDS sei halo sosializasaun ka deziminasan program ba iha entidade hotu
- Ekipa PNDS Nasional no Municipiu kontinua haforsa halo monitoring ba iha suku hodi bele fo suporta ba Implementasaun.



Sekretariadu PNDS :

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico

Rua de : Bedik Hun, Fatuhada-Dili Timor Leste

E-mail : info@pnads.gov.tl

Website : www.pnads.gov.tl
