

Relatorio Monitorizasaun

PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUCO (PNDS)



Numeru (001)

Data Reporta: 26 de Setembro 2013

Hato'o Ba: Exmo. Diretor Geral Desenvolvimento Lokal
Sr. Miguel Pereira de Carvalho

Prepara Husi: Rosito Guterres
(Oficiais M&A)

Aprova Husi: Dulce Guterres Junior

Asinatura


(Adjunta Direitora Geral Operasional PNDS)



PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU

“HAMUTUK ITA DEZENVOLVE NASAUN”

Secretariadu PNDS, Edifício Central do MAE, Rua Jacinto Cândido
Dili, Timor Leste.
Tel: 331 0980



Ex.Mos/a :

Srs/a Directores /a Gerais DGAF, STAE, AN do MAE

Sr. Inspector Geral do MAE

Srs. Chefes Gabinete SEDA e SEDL

Srs/a Diretores DNAL. DNF, DNDD, DNAAS

Srs/a Diretores DNPACE

Assunto : Relatório 3º Trimestre de 2013

Ho Respeito,

Iha anexo, Ami hato'o kona ba Monitorizasaun implementasaun Pilotu Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) 2013 iha Distritu 5, Sub_Distritu 13, no iha Suco 30 no Progresu tomak konaba Operasaun Programa Nasional Dezenvolvimento Suco.

Mak ne'e deit, hau nia respeito no elevada konsiderasaun hato'o obrigadu Wai'n.

Dili, 26 de Setembro 2013

Dulce Guterres Junior

Adjunta Diretora Geral
Operacional Programa PNDS

Copia Hato'o ba.

1. **Sua Excia. Sr. Ministro do MAE;**
2. **Sua Excia. Sr. Secretado de Estado Descentralizacao Administrativa;**
3. **Sua Excia. Sr. Secretario de Estado Dezenvolvimento Local;**
4. **Arquivo.**

1. INTRODUSAUN

➤ Enkuadramentu PNDS




Programa Nasional Deznvolvimentu Suku (PNDS), Baseia ba Planu Estratejiku Deznvolvimentu Nasional (2011-2030) identifika prioridades deznvolvimentu Sosial no Ekonomiku nasaun nian. Atu atinji planu metas ne'e, governu Timor Leste deznvolve ona programa desentralizadu foun nebe foka ba deznvolvimentu lokal iha nivel comunidades iha Suku no Aldeias. No planu deznvolvimentu ida nee tuir enkuadramentu regulatoriu :

- ☐ Lei No. 3/2009, 8 Jullu (Lideransa Tradisional)
- ☐ Dekretu Lei No. 4/2012, 15 Jullu (Planu Deznvolvimentu Integradu Distrital)
- ☐ Rezolusaun Governu No. 1/2012, 15 Janeiru (Aselera Deznvolvimentu Komunitariu)
- ☐ Diploma Konjunta Ministerial No. 22/2012, 27 Junu (Komite Inter-Ministerial no GTTM) no
- ☐ Dekretu Lei PNDS No. 8/2013, 26 Junho 2013


➤ Objetivu PNDS

Metas husi programa PNDS atu suporta vizaun tempu naruk mak “Kondisaun Sosio-Ekonomiku aumenta no governu lokal ba mane no feto suku nian iha Timor Leste Liu husi Infrastrutura nebe jere husi comunidade” no sei Lao tuir Siklu Projeitu PNDS.

SIKLU IMPLEMENTASAUN PROGRAMA PNDS

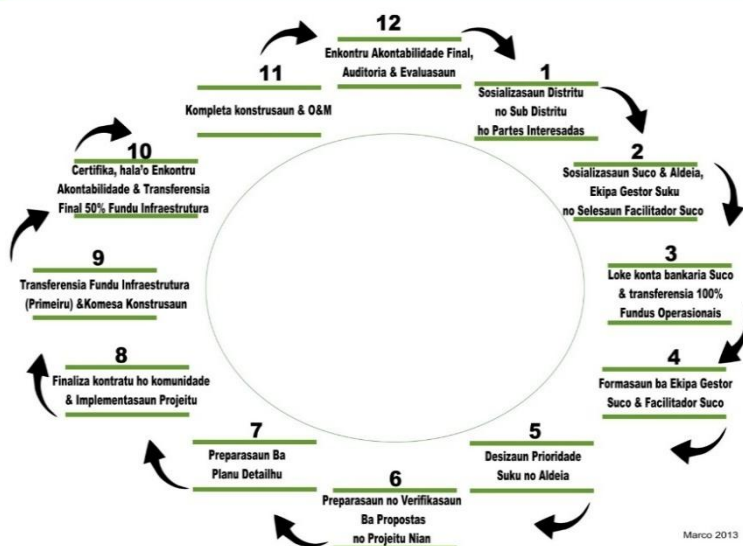

Marco 2013



12/06/2013



2. PROGRESU

Progresu Programa Nasional Deznvolvimentu Suku (PNDS),mak hahu lansamentu Pilotu ba programa nebe nebe implementa iha fulan Maiu-Janeiru 2014.iha Tabela tuir mai ne'e mak Detaillu informasaun konaba total Area Implementasaun Pilotu:

Distritu	Sub.Distritu	Suku	Aldeias
5	13	30	142

osializasaun (Distritu no Sub_Distritu)

Hala'o Enkontrus Orientasaun no Sosializasaun atu nune'e partes interese iha Distritu no Sub-Distritu kompriende objetivus, prinsipius, prosedimentu PNDS nian no sira-nia kna'ar hodi suporta Suku ezerse sira-nia direiru no responsabilidade ba planeamentu no implementasaun atividades PNDS nian. Iha Sosializasaun Nivel Distritu no Sub.Distritu Hahu iha dia 06-10 de Maiu 2013.



➔ Sosializasaun Suku &


Aldeia

Enkontrus Oreintasaun no Sosializasaun ho Konsellu Suku no comunidade sira, inklui feto no grupus marjinalizadus sira nune'e sira kompriende metas Programa PNDS, implementasaun no sira-nia kna'ar, direitu no responsabilidade.

Durante Prosesu sosializasaun nivel Aldeia no suku iha distritu pilotu 5 Sub_Distritu 13, Suku 30 no Aldeias 142 durante pilotu programa PNDS



Total partisipasaun iha Nivel Aldeia no Suku Hamutuk nain 4940 husi **Mane** = 2995 no **Feto**=1945, Para klaru liu tan bele hare'e iha Trafegu MIS tuir mai ne'e :



*Trafiku SosIALIZASAUN
Nivel Aldeia-Suku*

Nomeasaun & Elisaun

Komunidade, ho orientasaun husi Konsellu Suku no assistensia husi Fasilitador sira PNDS nian, hili ema sira atu forma Ekipa Manajementu Komunidade inklui:

- ☐ Komisaun Planeamentu no Akontabilidade (KPA).
- ☐ Ekipa Implementasaun Komunidade (EIP).
- ☐ Ekipa Operasaun no Manutensaun (EOM), no
- ☐ Fasilitador Rua husi Suku (FS).

No Total comunidades sira nebe mak Tur iha Esekutivu Equipa Gestor Suco iha Suco 30 ba Pilotu pograma mak hamutuk 330.

Hare Iha Informasaun tabela Tuir Mai :

Exzekutivu CMT					Mane	Feto	(% m/f)	
							Mane	Feto
30	KPA	3	11	330	175	155	53%	47%
	EIP	3						
	EOM	3						
	FS	2			330			

Loke Konta Bankaria

Ho suporta husi Fasilitador Finanseiru Sub-Distritu nian, Trezureiru EIP no Prezidente KPA loke Konta Bankaria Suku nian rua, ida ba Fundus Operasional no ida seluk ba Fundus Infraestrutura atu simu pagamentu Súbsidiu Suku nian.

Loke konta bankaria ne'e hamosu pagamentu porsentu 100 husi Fundus Operasional ba enkontrus planeamentu, manajementu operasaun, monitorizasaun komunidade, no formasaun ba Ekipa Manajementu Komunidade no Fasilitador sira.

Iha Tabela Tuir mai nee mak Grant (Total) Fundus Subsidiu ba Fundus Operasional no Infraestrutura Bazeaia ba Formulasau tuir mai :

Populasaun Suku		Distansia husi Kapital Distritu			
		La Remota <10km	Remota 10 - 30km	Remota tebes 30 - 55km	Remota tebes >55km
Menus 2,000	Total Subsidiu	\$40,000	\$45,000	\$50,000	\$55,000
	Maximal operasaun	\$5,000	\$5,500	\$6,000	\$6,500
2,000 to'o 4,500	Total Subsidiu	\$45,000	\$50,000	\$55,000	\$60,000
	Maximal operasaun	\$5,250	\$5,750	\$6,250	\$6,750
4,500 to'o 7,500	Total Subsidiu	\$50,000	\$55,000	\$60,000	\$65,000
	Maximal operasaun	\$5,500	\$6,000	\$6,500	\$7,000
More than 7,500	Total Subsidiu	\$55,000	\$60,000	\$65,000	\$70,000
	Maximal operasaun	\$5,750	\$6,250	\$6,750	\$7,250

(Tabela Formulasau Subsidiu)

➔ Treinamentu (EMK)

Fasilitador Sub-Distritu hala'o formasaun ba Ekpa Suku (KPA, EIP & EOM) no Fasilitador Suku atu nune'e sira iha skil administrasaun no tékniku nesesariu atu maneja atividades PNDS nian. Kada autór sira ne'e treinadu atu hala'o sira-nia kna'ar no responsabilidade wainhira presiza no hanesan defini ona iha MOP. Lista ida ba formasaun mandatoriu no materias fornese ba Fasilitador sira Sub-Distritu hanesan parte husi sira-nia formasaun.

Tabela Eventu Treinamentu.

Modul	Observ
A. Introdusaun & Planeamentu	Sim
B. Kapasitasaun Grupo Feto	Sim
C. Kapasitasaun FS	Sim
D. Manajementu Finansa	Sim
E. Hakerek Proposal	Sim

identifikasau
n
Prioridades
(Aldeia-
Suku)

Suku)

Mapa comunidade no analiza situasaun sei implementa iha kada kaldeia atu identifika prioridades infraestrutura, kategoriza no hafoin prioritiza ba 3-5. Ida ne'e inklui identifika projetu ho eskala ki'ik nebe comunidade sira iha Suku bele implementa liuhusi Súbsidiu Suku, nomos, eskala boot, projetu nebe demanda tékniku no finansieriu boot nebe bele implementa husi ministerius, ajencias ou kontraktor tékniku. Hala'o enkontrus separadu ba feto no mane sira, no hafoin enkontrus konjuta ho mane no feto sira atu determina Prioridades Aldeia.

Revee Planu Dezenvolvimentu Suku (PDS) nebe eziste no kompara ho prioridades Aldeia nian.

Hala'o prosesu etapa 2 ida nebe hanesan ho primeiru enkontru ida ho membru feto sira Komisaun Planeamentu no Akontabilidade (KPA), hafoin enkontru boot ida nebe produz Lista final ida ba prioridades, integra preukupasaun feto sira nian. Ida ne'e fó sai ba publiku no hamosu fali enkontrus comunidade adisional karik iha kestaun balun. Lista final mos hetan arkivu atu nune'e bele vizita fila fali iha tinan tuir mai.

Lista prioridades haruka ba Komisaun Dezenvolvimentu Sub-Distritu (KDSD) no ba Komisaun Dezenvolvimentu Distritu (KDD) ho objetivu koordenasaun.

Rezultadu Prioridades ba Programa Pilotu : (Dados MIS)

☞ **Total Prioridades Bazeia Ba Rangkin Tipo Prioridades Aldeias no Suku (30 Suco Pilotu)**

Suku	Ranking 1	Ranking 2	Ranking 3	Ranking 4	Ranking 5	
Fahiria	SP05	SP04	SP06	SP06	SP05	
Hoholau	SP06	SP05	SP05	RP104		
Lausi	RP103	RP104	SP05			
Fatisi	SP08	SP12	SP06			
Madabeno	RP108	SP05	SP08			
Talitu	SP05	SP02	SP08			
Camea	SP10 & SP14	RP109	SP06	SP05	SP02	
Campung Alor	RP117	SP11	SP01	SP06		
Comoro	RP109	SP08	SP02	SP02	SP06	
Sabuli	SP05	RP104	SP02	SP02	SP08	
Bidau Lecidere	RP108	SP01	SP02			
Colmera	SP02	SP06	SP01			
Humboe	SP06	SP05	SP04			
Ponilala	SP05	RP106	SP06	SP23	SP04	
Talimoro	SP05	SP04	SP08			
Matata	SP06	SP05	SP08			
Railaku	SP05	SP06	SP04	SP08	RP109	
Tocoluli	SP06	SP05	SP16			
Cribas	RP108	RP109	RP109	SP09	SP05	
Maabat	RP107	RP108	RP120			
Sau	RP103	SP05	SP08	SP08	RP114	RP109
Lacu Mesak	SP11	SP08	RP104	SP06	RP119	
Uma Kaduak	SP11	RP109	RP109	SP08		
Uma Naruk	RP108	RP104	RP109	SP02		



(Tabela 30 Sucos no Kodigu Prioridades ba Rangkin Prioridades)

Rengking 1	SP02	SP05	SP06	SP08	SP10 & SP14	SP11	RP103	RP107	RP108	RP109	RP117
	1	6	4	1	1	2	2	1	4	1	1
	Cons. Baleta	Cons. Centro Comunitario	Cons. Be Foun	Cons. MCK	Cons. Cede Suku & Cede Joventude	Cons. Moru Haleu Sede Suku	Rehab. Cede Aldeia	Rehab. Ponte Kiik	Rehab. Cede Suku	Rehab. Clinica/Amenta Sala Clinica	Rehab. Baleta Boot.

Rengking 2	SP01	SP02	SP04	SP05	SP06	SP08	SP11	SP12	RP104	RP106	RP108	RP109
	1	1	2	6	2	2	1	1	1			
	Cons. Lixu Fatin	Cons. Baleta	Cons. Istrada Local	Cons. Cede Aldeia	Cons. Be Foun	Cons. MCK	Cons. Campo Futsall	Cons. Deker Ponti Kiik	Rehab. Be Mos	Rehab. MCK	Rehab. Cede Suku	Rehab. Clinica/Amenta Sala

Rengking 3	SP01	SP02	SP04	SP05	SP06	SP08	SP16	RP104	RP109	RP120
	2	3	2	2	4	5	1	1	3	1
	Cons. Lixu Fatin	Cons. Baleta	Cons. Istrada Local	Cons. Cede Aldeia	Cons. Be Foun	Cons. MCK	Cons. Campo Futsall	Rehab. Be Mos	Rehab. Clinica/Amenta Sala	Rehab. Baleta

(Tabela 30 Sucos no Bazeia ba Rangkin Prioridades)

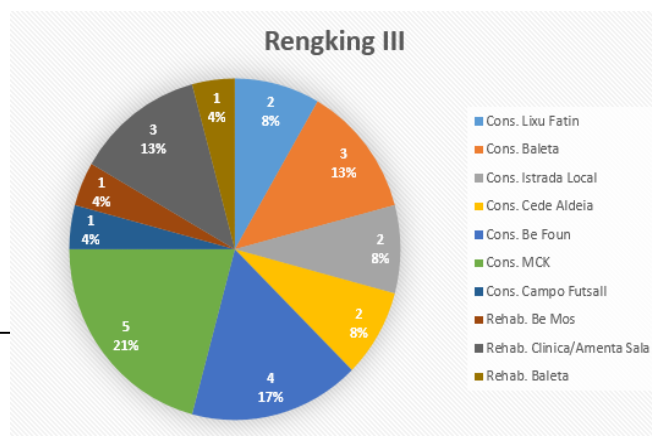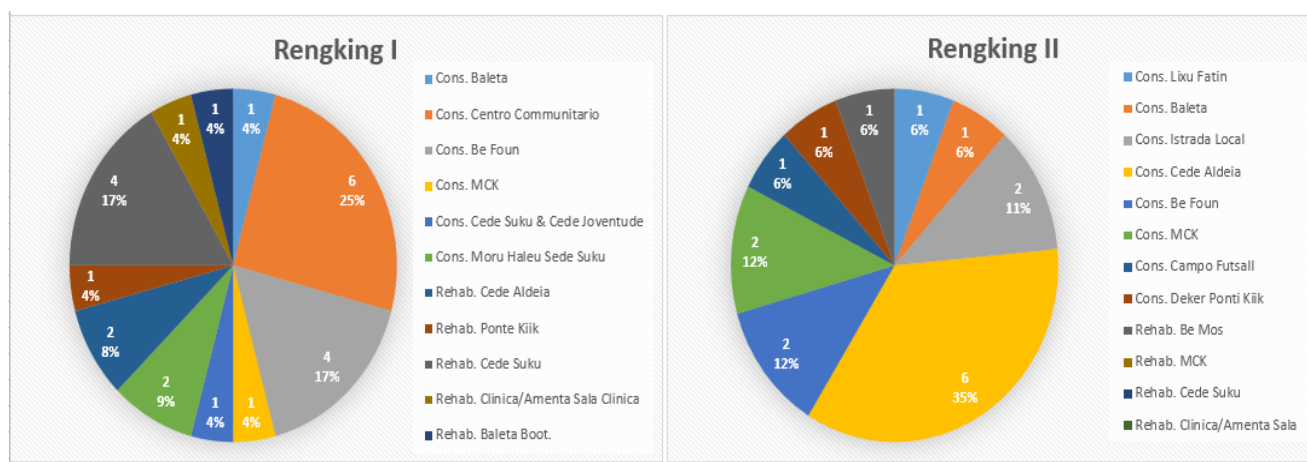

(Trafego Rangkin Prioridades 30 Sucos Pilotu)


 Total Prioridades Final Atu Implementa Uluk (30 Suco Pilotu)

Suku	Tipu Projetu					
Fahiria	SP05	SP09				
Lausi	RP103	RP104	SP05			
Hoholau	SP09	SP05				
Talitu						
	SP05	SP03	SP08	SP05		
Madaben	RP103					
Fatisi	SP08	SP09				
Camea	SP10&SP07					
Sabuli	SP05	SP05	RP120			
Colmera	SP02					
Bidau Lec	RP108	SP01				
Kampo Al	SP02	SP01	SP11			
Comoro	RP109	SP08	SP05			
Ponilala	SP05	SP05	SP05			
Humboe	SP06	SP05				
Talimoro	SP05	SP05	SP08			
Railaco Le	SP05	SP05	SP06			
Matata	SP05	SP05	SP06			
Tokoluli	SP06					
Loidahar	SP05	SP05				
Darulete	SP05	SP05				
Loculai	SP05	RP104				
Fatumasi	SP05	RP104				
Mota Ulur	SP05	RP104				
Tibar	RP104					
Lacu Mesa	SP11	SP08	RP104	SP06		
Uma Kadu	SP11	SP27	SP28	RP116	SP08	RP109
Uma Naru	SP29	RP104	RP101			
Ma'abat	RP107	RP108	RP120			
Sau	RP103	SP05	SP08	SP08		
Cribas	RP108	SP05				

(Tabela Prioridades Final 30 Sucos ho kodigu prioridades)

SP01	SP02	SP03	SP05	SP06	SP08	SP09	SP10 & SP	SP11	SP27	SP28	SP29	RP116	RP101	RP103	RP104	RP107	RP108	RP109	RP120
2	2	1	27	5	8	3	1	3	1	1	1	1	1	3	7	1	3	2	2
Cons. Lixu Fatin	Cons. Baleta	Cons. Barrera	Cons. Centro Comunitario	Cons. Be Mos	Cons. MCK	Cons. Ponte Kiik	Cons. Centro Comunitario & Centro Juventude	Cons. Moru Haleu Centro Comunitario	Cons. Moru Haleu Clinika	Cons. Moru Haleu Iskola	Cons. Uma Bainaka	Rehab. Tanqe Be Mos	Rehab. Iskola/amenta sala Iskola	Rehab. Centro Comunitario	Rehab. Be Mos	Rehab. Ponte Kiik	Rehab. Centro Comunitario (Suku)	Rehab. Clinika/Amenta Sala	Rehab. Baleta

(Tabela Prioridades Final Nebe Atu Implementa Iha 30 Sucos Pilotu)

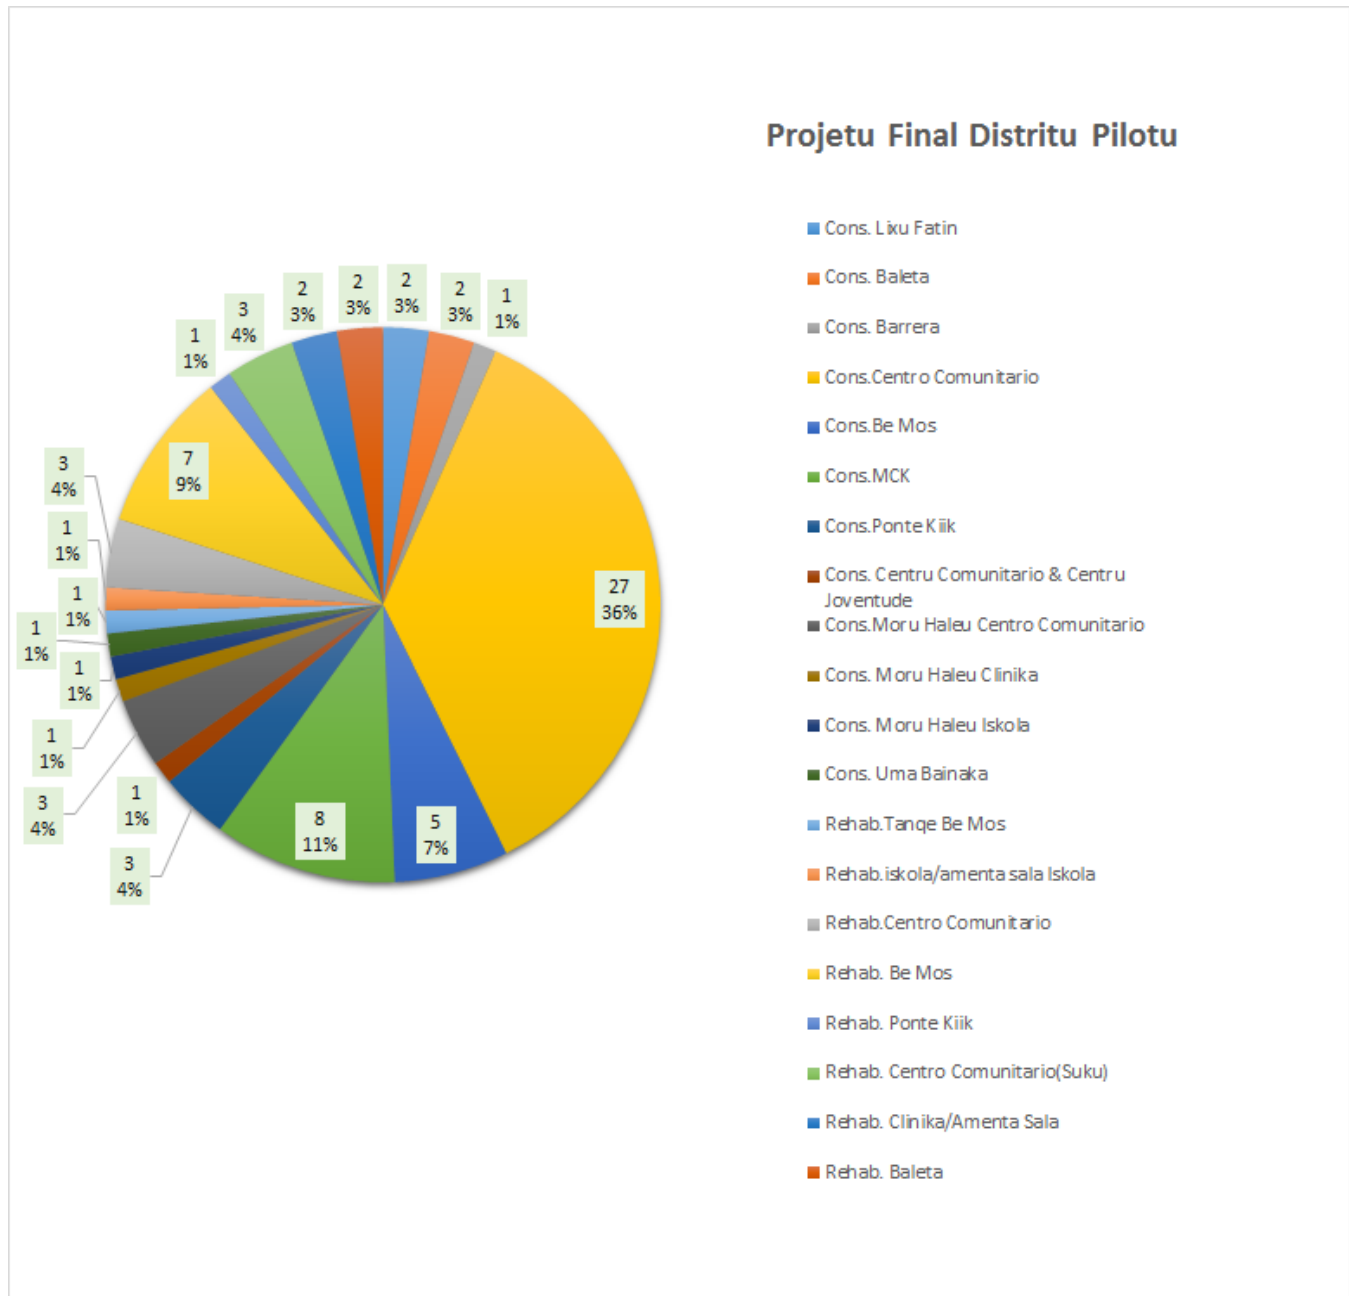

(Trafego Dados MIS ba Prioridades Final Iha 30 Sucos Pilotu)

Matrix Progresu Pilotu (Maiu-Agustu)

			LEGEND														
			Delayed/issues	In progress	Completed												
			Less than 50%=1	51-99%=2	100%=3												
PRESENTATION ON EACH STAGE (Cycle 12 Stage)																	
 M&E			10-May	26-Jun	15-Jul	20-Aug	25-Aug	6-Sep	6-Sep	30-Sep	25-Nov	22-Dec	30-Jan				
			1 Sosialisaun Partes Intesantes Xave lla Distrito no Sub. Distrito	2 Sosialisaun Suku No Aldeia & Forma Equipa Jestaun Suku	3 Loke Konta Bankaria Suku & Transferensi 100% Fundus Operasional	4 Formasaun ba Equipa Jestaun Suku	5 Determina Prioridades Aldeia & Suku	6 Prepara no Verifica Deskrisaun/Proposta Projéitu	7 Prepara ba Plani Detallu	8 Asina Akordu implementasaun Projéitu	9 Transferensi Fase 1 ba Fundus Infraestrutur & Hahu Implementasaun Konstrusaun	10 Sertifikaasaun & Enkontru kontabilidade & Transferensi Fase 2 ba Fundus Infraestrutur	11 Kompleta Konstrusaun no O&M	12 Auditoriu & Enkontru Alontabilidade Final & Avalia	PRESENTAZEM [%]		
CLUSTER DISTRICT 1	DILI	Lecidere	3	3	3	3	3	3	2	2				58%			
		K. Alor	3	3	3	3	3	3	2	2				58%			
		Comoro	3	3	3	3	3	3	2	2				58%			
		Colmera	3	3	3	3	3	3	2	2				58%			
		Camea	3	3	3	3	3	3	2	2				58%			
	MANATUTO	Sabuli	3	3	3	3	3	3	2	2				58%			
		Má'abat	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Sau	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Cribas	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		L.Mesac	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
	AILRU	U.Kaduak	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		U.Naruk	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Fahiria	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Laoni	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Hoholau	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Talitu	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Madabeno	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Fatisi	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
CLUSTER DISTRICT 2	LIQUEA	Loidahar	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Darulete	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Luculai	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Fatumanai	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Tibar	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
	ERMERA	MotaUlan	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Ponilala	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Talimoro	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Humbos	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Railaco_L	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Matata	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
		Tokoluli	3	3	3	3	3	3	3	2				67%			
PRESENTAZEN (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	0%	0%	0%	0%	65%				

3. PLANU ATEVIDADES PILOTU

Bazeia ba Progresu Nebe Atinji ona iha Relatoriu Leten, Equipa Pilotu PNDS iha mos agendas ba atividades fulan tuir mai: **Matrix Planu Atividades Equipa :**

No	Phase	Activity	Target / Location	August	September	Targeted Timing (Global Timeline)
LIQUICA				15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1	7	Survey	6 sucus	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		6-Sep-13
2		Dezenho Projeto	6 sucus			
3		Sura BOQ	6 sucus			
4		Sura Orariu Implementasaun	6 sucus			
5		Planu O&M	6 sucus			
6	8	Prepara akordu implementasaun projetu	6 sucus		2 3 4 5 6	
7		Asina akordu implementasaun projetu	6 sucus		9	15-Sep-13
8		Prepara dokumentus no payment request	6 sucus		9 10	
9	9	Infrastructure funds transfer	6 sucus		11 12 13	30-Sep-13
10		Prepare for construction	6 sucus		16 17 18 19 20	10-Oct-13
11		Start construction	6 sucus		23 24 25	11-Oct-14
MANATUTO				15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1	6	Proposal writing and verification	6 sucus	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24		25-Aug-13
2	7	Survey and design	6 sucus	19 20 21 22 23 24		6-Sep-13
3		Make detailed plan	6 sucus	26 27 28 29 30 31	1 2 3 4	
4	8	Prepare and signing of project implementation agreement	6 sucus		4 5 6	15-Sep-13
5		Payment request	6 sucus		6	
6	9	Infrastructure funds transfer	6 sucus		9	30-Sep-13
7		Prepare for construction	6 sucus		10 11 12 13	10-Oct-13
8		Start construction	6 sucus		16 17 18 19 20	11-Oct-13
AILEU				15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1	6	Proposal writing and verification	6 sucus	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26		25-Aug-13
2	7	Survey and design	6 sucus	27 28 29 30 31		6-Sep-13
3		Make detailed plan	6 sucus		1 2 3 4 5 6 7	
4	8	Prepare and signing of project implementation agreement	6 sucus		9 10 11 12 13	15-Sep-13
5		Payment request	6 sucus		12 13	
6	9	Infrastructure funds transfer	6 sucus			30-Sep-13
7		Prepare for construction	6 sucus		16 17 18 19 20	10-Oct-13
8		Start construction	6 sucus		23 24 25 26 27	11-Oct-13
DILI				15 16 17 18 19 20 21	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1	5	Finish priority setting	6 sucus	15 16 17 18 19 20 21		20-Aug-13
2	6	Proposal writing and verification	6 sucus	22 23 24 25 26 27		25-Aug-13
3	7	Survey and design	6 sucus	27 28 29 30 31		6-Sep-13
4		Make detailed plan	6 sucus		1 2 3 4 5 6 7	
5	8	Prepare and signing of project implementation agreement	6 sucus		9 10 11 12 13	15-Sep-13
6		Payment request	6 sucus		12 13	
7	9	Infrastructure funds transfer	6 sucus			30-Sep-13
8		Prepare for construction	6 sucus		16 17 18 19 20	10-Oct-13
9		Start construction	6 sucus		23 24 25 26 27	11-Oct-13
ERMERA				15 16 17 18 19 20 21 22 23	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
1	6	Proposal writing and verification	6 sucus	15 16 17 18 19 20 21 22 23		25-Aug-13
2	7	Survey	6 sucus	26 27 28 29 30 31		6-Sep-13
3		Dezenho Projeto	6 sucus			
4		Sura BOQ	6 sucus			
5		Sura Orariu Implementasaun	6 sucus			
6		Planu O&M	6 sucus			
7	8	Prepara akordu implementasaun projetu	6 sucus		2 3 4 5	
8		Asina akordu implementasaun projetu	6 sucus		5 6	15-Sep-13
9		Prepara dokumentus no payment request	6 sucus		9 10	
10	9	Infrastructure funds transfer	6 sucus		9 10 11 12 13	30-Sep-13
11		Prepare for construction	6 sucus		16 17 18 19 20	10-Oct-13
12		Start construction	6 sucus		23 24 25 26 27 28 29 30	11-Oct-14
COORDINATION AND LEARNING						
1	District Coordination Meeting August			15		
	a	Liquica		16		
	b	Aileu				
	c	Dili		21		
	d	Ermera		22		
	e	Manatuto		23		
2	Internal Coordination Meeting September: all team				17	
3	District Coordination Meeting September					
	a	Liquica			19	
	b	Aileu			20	
	c	Dili			23	
	d	Ermera			24	
	e	Manatuto			25	
4	Sub-District Coordination Meeting September					
	a	Bazartete, Liquica			11	
	b	Ermera, Ermera			13	
	c	Dom Alexio, Dili			10	
	d	Laulara, Aileu			12	
5	First Bimonthly Learning Workshop: all team			27 28		
6	Team's monthly reporting:					
	a	SDF for July 13 report		15		
	b	DC for July 13 report		15		
	c	SDF for August 13 report			7	
	d	DC for August 13 report			13	

4. LALAOK NO ASUNTUS

1. Sosializasaun

- ☐ Persija Halo Revizaun Konaba Durasau Tempu;
- ☐ Material komunikasaun (Poster, FlipChart);
- ☐ Persija Hadiah Sistema Koordenasaun Estrutura lokal.

2. Nomeasaun No Elisaun

- ☐ Hasa'e Kuinhesementu konaba Knar no Responsavelidades Euipa Gestor Suku

3. Loke Konta Bankaria

- ☐ Persija Sosializa Dokumentus Relevantes ho MOU.

4. Treinamentu

- ☐ Revizaun Durasau Tempu ba Kada Modulo;
- ☐ Revizaun ba kuantidades Material Treinamento.

5. Identifikasaun Prioridades (Aldeia-Suku)

- ☐ Koordenasaun Linha Distritu inklui seitores sira;
- ☐ Persija adapta tuir nesesariu Lokal iha parte Dezeinu no Preparasaun Planu Detaillu.



5. MEKANISMU KOORDENASAUN NO IVENTU RUTINA

□ Enkontru Koordenasaun Distritu

Objetivus no Agenda prinsipal iha Enkontru Koordenasaun Distritu (District Coordination Meetin) realiza Durante Loron Rua (Loron 1 ba Interna PNDS no Loron Ida hamutuk ho Autoridades Lokal) ho objetivu mak:

- Apresenta Progresu Equipa PNDS Iha Kada Distritu;
- Diskusaun konaba Lalaok durante Prosesu;
- Halo Aranjamentu ba Planu Atevidades tuir mai;
- Informa Progresu PNDS ba Autoridades Lokal;
- Halo Promosaun no Forma Sinerjia inklui hametin linhas Koordenasaun iha nivel Disitritu.

□ Reuniaun Semanal

Reuniaun Semanal Mak Reuniun nebe realiza iha kada semana iha aloron Sesta Feira no partisipa husi, Sekretariadu PNDS (Equipa Nasional), Direitores, Aseessores. Objetivu Reuniaun ida nee mak:

- Update Progressu
- Avaliasaun Linha Koordenasaun
- Revizaun ba Planu Suportasaun
- Diskusaun konaba lalaok Progressu iha Area Sosial, Finansa no Tekniku

□ Reuniaun Workshop PNDS

Reuniaun Workshop ou Learning Workshop realiza Kada Fulan rua dala ida, durante loron rua no objetivu principal ba iventu ida nee mak:

- Apresentasaun Rezultadu Monitorizasaun no Avaliasaun
- Diskusaun konaba Asuntu Relevantes

6. PLANU ATEVIDADES SEKRETARIADU

☞ Atividades

Sekretariadu PNDS (Equipa Nasional) iha ona estrategia no planu atividades servisu nian mak hanesan tuir mai nee:

- ☐ Rekrutamentu Funsionariu PNDS (Koodinador Distritu, Kontabilista Distritu, Engeneiru Distritu, MIS Distritu no Fasilitador: Finansa, Sosial no Tekniku); atinje ona **90%** ba kompleto.
- ☐ Aranjamentu ba Planu Orariu sosializasaun ba 2014.

Anexa Planu Servisu:

Implementasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS), sei implementa tuir planu no estrategia implementasaun iha tabela tuir mai:

NIVEL	Area Kobertura PNDS			Total
	Faze I	Faze II	Faze III	
ALDEIA				2.250
SUCO	149	94	199	442
SUB.DISTRITU	22	15	28	65
DISTRITU	13			13



Planu Orariu

Sekretariadu PNDS hamutuk ho Equipa Nasional iha ona planu atividades iha Fulan Setembru-Otoubro 2013 Sei halao sosialisasaun Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) iha nivel Distritu no Sub.Distritu, tuir Planu Atividades Faze I mak hanesan iha Tabela Tuir Mai :

Matrix Planu Servisu:

Socializasaun PNDS Socialization ba Fase I																																					
September - October 2014																																					
No	Activities	September							October																				Equipa	Nota							
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23	24	25
Nivel Distritu																																					
1	Ainaro																														21					Team A	
2	Manufahi																															22					
3	Covalima																																23				
4	Bobonaro																																	24			
5	Ermera																															21					Team B
6	Dili																																22				
7	Aileu																																	23			
8	Liquica																																		24		
9	Lautem																																21				Team C
10	Baucau																																22				
11	Viqueuqu																																	23			
12	Manatuto																																		24		
13	Oecusse																																		25		
Nivel Sub-Distritu		Distritu																																			
1	Atauro									30																											Team A
2	Matinaro											1																									
3	Maubara												2																								
4	Hatolia													3																							
5	Balibo										30																										Team B
6	Cailaco											1																									
7	Zumalai												2																								
8	Fatuhlic													3																							
9	Luro										30																										Team C
10	Tutuala											1																									
11	Laga												2																								
12	Quelicaí													3																							
13	Ossu										30																										
14	Uatucarbau											1																									Team D
15	Fatuberliu												2																								
16	Barique													3																							
17	Soibada														4																						
