



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

PNDS

Relatóriu 3º Trimestre Julhu-Setembru 2019



Sekretariadu PNDS :

E-mail : info@pn.ds.gov.tl

Webside: www.pn.ds.gov.tl



MINISTÉRIO DA
**ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL**



Gabinete do
Vice-Ministro

REF: 522 / VM-MAE / XI / 2019

Data: 19 Novembro 2019

Para: Sua Excelência o Primeiro Ministro da RDTL
Senhor Taur Matan Ruak

Assunto: Relatório PNDS ba Terceiro Trimestre 2019

Excelência Senhor Primeiro Ministro,

Iha biban ida ne'e, hato'o ba Sua Excelencia Senhor Primeiro Ministro, Relatorio PNDS ba Terceiro Trimestre, tinan 2019.

Relatorio refere composto husi:

1. Rezultadu Implementasun no Ezekusaun Orsamentu PNDS nian;
2. Progresu Implementasaun Konstrusaun Fatin Halimar;
3. Progresu Implementasaun Programa Retornu Ekonomiku Baziku;
4. Progresu Implementasaun Konstrusaun infraestrutura Eskola Edukativa.

Ne'e mak Relatório ba apreciação Sua Excelencia Senhor Primeiro Ministro.

Ho consideração nebe às liu.


Abílio José Caetano
Vice-Ministro



Konteudu

Akronimu.....	2
Sumariu Ezekutivu	3
1. Introdusaun	6
2. Rezultadu Implementasaun PNDS 3º Trimestre 2019.....	7
2.1 Hametin PNDS nia Sistema Prosesu no Prosedimentu.....	7
2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun Komunidade Sira	14
2.3 Infra-estrutura ho Kualidade Di'ak Hari'i no Mantein Ona Husi Komunidade.....	17
2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun	23
2.5 Igualdade Jeneru no Inklusaun Sosial (JIS) Integradu iha PNDS.....	24
2.6 Atividade Adisional	25
2.6.1 Implementasaun Konstrusaun Fatin Halimar (<i>Playgrounds</i>)	25
2.6.2 Programa Retornu Ekonomia Báziku (PREB).....	25
2.6.3 Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa	27
3. Konklusaun.....	29
Planu 4º Trimestre (Outobru - Dezembru 2019).....	30
4. Anexu	31

Akronimu

CDD	<i>Community Driven Development</i>
DNIE	Diresaun Nasionál Infraestrutura Edukativa
EIP	Ekipa Implementasaun Programa
EJS	Ekipa Jestaun Suku
EOM	Ekipa Operasaun no Manutensaun
FDCH	<i>Fundo Desenvolvimento Capital Humano</i>
FS	Fasilitador Suku
GTTM	Grupu Traballu Tékniku InterMinisterial
HANDS	Halimar Aprende Deskobre no Susesu
IT	Informasaun Teknolójia
JIS	Jéneru no Inklusaun Sosiál
KIEE	Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa
KPA	Komisaun Planeamentu no Akontabilidade
KTT	Komite Kordenasaun Téknika
MAE	Ministériu Administrasaun Estatál
MEJD	Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu
MIS	<i>Management Information System</i> (Sistema Jestaun Informasaun)
PNDS	Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku
PNDS-SP	Programa Apoiu PNDS/PNDS- <i>Support Programme</i>
PREB	<i>Programa Retornu Ekonómia Báziku</i>

Sumáriu Ezekutivu

Relatóriu ida ne'e hanesan relatóriu 3º trimestre ne'ebé kobre implementasaun atividades PNDS husi fulan Jullu to'o Setembru 2019. Relatóriu Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) halo hodi submete ba iha Ministériu Administrasaun Estatál hodi aktualiza rezultadu ne'ebé mak atinji durante 3º trimestre tuir Planu Asaun Anual 2019. Rezultadu implementasaun PNDS xave sira mak hanesan:

Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS

Ba tinan 2019 Governu Timor-Leste liu husi Ministériu Administrasaun Estatál aloka Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ba PNDS liu husi kategória 3 (tolu) hanesan rúbrika bens de serbisus, Transferensia Públiku no Kapital Menor hamutuk **\$ 9,972,706.00** no gastu atinji ona **\$ 5,896,554.88 (59%)**. Bele haree esplikaun detalhe hanesan iha tabela tuir mai:

Tabela Gastus Orsamentu PNDS tuir Kategória 3º Trimestre 2019:

No	Deskrisaun	Alokasaun	Gastus	Balansu	Ezekusaun
1	Bens de Serbisus	\$ 769,600.00	\$ 382,686.70	\$ 386,913.30	50%
2	Kapital Menor	\$ 83,600.00	\$ 74,800.00	\$ 8,800.00	89%
3	Transferensia Públiku (Subsidu Operasional)	\$1,791,195.00	\$1,790,832.91	\$ 362.09	100%
	Transferensia Públiku (Subsidu Infraestrutura)	\$7,328,311.00	\$3,648,235.27	\$3,680,075.73	50%
Total		\$9,972,706.00	\$5,896,554.88	\$4,076,151.12	59%

Fontes Informasaun husi Finansa MAE

Progresu Gastus Subsídium Operasional no Infraestrutura Suku

Progresu gastus subsídium operacional no infraestrutura iha Suku durante 3º Trimestre mak hanesan tuir mai:

Subsídium Infraestrutura Suku

Subsídium Infraestrutura Suku						
Faze/Siklu	Transfer	Osan Restu Tinan	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	%
Faze 3 Siklu II	\$ 7,328,311.00	\$ 813,607.17	\$ 8,141,918.17	\$ 275,017.15	\$ 7,053,293.85	4%
Total	\$ 7,328,311.00	\$ 813,607.17	\$ 8,141,918.17	\$ 275,017.15	\$ 7,053,293.85	4%

Subsídium Operasional Suku

Subsídium Operasional Suku						
Faze	Transfer	Osan Restu Tinan Kotuk	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	Ezekusaun
Faze I	\$ 490,250.00	\$ 538,347.70	\$ 1,028,597.70	\$ -	\$ 1,028,597.70	0%
Faze II	\$ 326,237.50	\$ 326,237.50	\$ 652,475.00	\$ -	\$ 652,475.00	0%
Faze III	\$ 974,707.50	\$ 1,044,775.00	\$ 2,019,482.50	\$ 191,555.25	\$ 1,827,927.25	9%
Total	\$ 1,791,195.00	\$ 1,909,360.20	\$ 3,700,555.20	\$ 191,555.25	\$ 3,508,999.95	5%

Progresu Implementasaun

Iha tinan 2019, hamutuk projetu 272 ne'ebé implementa iha faze III siklu 2 iha Suku 202 no progresu fisiku atinji ona porsentu ruanulu-resin-rua (22%) no iha suku balu realiza ona enkontru akontabilidade dahuluk ba ezekusaun subsidiu porsentu limanulu (50%) husi primeira transferencia.

Treinamentu

Ekipa Jestaun Suku no Komunitade tuir ona treinamentu ba modul A-L ba faze III siklu 2 iha Suku 55. Total partisipasaun 3,649 kompostu husi EJS 542 no Komunitade 3,107.

Funsionáriu PNDS nivel Nasionál no Munisípiu partisipa mós iha treinamentu ne'ebé finansia husi Governu Timor-Leste (GoTL) liu husi *Fundo Desenvolvimento do Capital Humano* (FDCH), Governu Australia (GoA) liu husi DFAT nomós Governu Nova-Zelandia (HANDS) iha área Tékniku, Finanzas no Sosiál. Total participante ema hamutuk 213.

Progresu Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosiál (JIS)

Implementasaun atividade PAAJIS 2018/2019 nian atinji ona porsentu hitunulu-resin-tolu (73%). Atividade ne'ebé hala'o durante trimester ne'e hanesan partisipa iha enkontru ekipa Trabalho Jenéru no Inklusaun Sosiál nian, implementa *Radio Talk Show*, halibur dados iha Sistema MIS-PNDS, Semináriu no Mini Expo no seluk-seluk tan.

Progresu Implementasaun Programa Retornu Ekonómia Báziku

Iha fulan Jullu - Setembru 2019, PNDS liu husi Programa Retornu Ekonómia Bázika hala'o asesmentu viabilidade ekonómia ba implementasaun atividade sosiu ekonómika iha tinan oin. Asesmentu ne foka liu ba prioridade prinsipal haat (4) mak hanesan Uma Bainaka, Mini Merkadu, Armagen Agrikola no Lutu ba To'os. Atividade ne'e konsentra iha Suku sanulu-resin-sia (19) iha Munisípiu hitu (7).

Progresu Implementasaun Konstrusaun Fatin Halimar (Playground)

PNDS kontinua Implementa Konstrusaun Fatin Halimar ba iha Pre-Eskolar ba etapa daruak hamutuk projetu 67, Suku 66 mak hetan ona transferencia subsidiu operacional no infraestrutura ba konta bankaria Suku hodi hahú implementa konstrusaun Fatin Halimar (falta Suku 1).

Progresu Implementasaun Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa

Iha fulan Jullu - Setembru 2019, PNDS hahú implementa hodi harii Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa sia (9) iha Munisípiu hitu (7). Progresu husi implementasaun ne'e atinji ona porsentu ualu (8%).



HAMUTUK ITA DEZENVOLVE NISAUN

Iha Suku Matore Postu Administrativu Turiscas Munisípiu Manufahi, Feto Partisipa Serbisu iha Implementasaun Program PNDS ho antusiasmu.

1. Introdusaun

Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (2011-2030) identifika prioridade dezenvolvimentu sosiál no ekonómiku nian. Atu atinji metas ida ne'e Governu Timor- Leste defini Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) sai hanesan mekanismu Nasionál hodi bele aselera dezenvolvimentu iha territóriu Timor-Leste tomak.

Governu Timor-Leste iha tinan 2019, liu husi Ministériu Administrasaun Estatál aloka Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2019 ba PNDS liu husi rúbrika Bens Serbisus, Transferensia Públiku no Kapital Menor ho montante hamutuk **\$9,972,706.00** no gastu atinji ona **\$5,896,554.88 (59%)**. Bele haree esplikasaun detalhe hanesan iha tabela tuir mai:

Tabela 1. Gastus Orsamentu PNDS tuir Kategória 3^o Trimestre 2019

No	Deskrisaun	Alokasaun	Gastus	Balansu	Ezekusaun
1	Bens de Serbisus	\$ 769,600.00	\$ 382,686.70	\$ 386,913.30	50%
2	Kapital Menor	\$ 83,600.00	\$ 74,800.00	\$ 8,800.00	89%
3	Transferensia Públiku (Subsidu Operasional)	\$1,791,195.00	\$1,790,832.91	\$ 362.09	100%
	Transferensia Públiku (Subsidu Infraestrutura)	\$7,328,311.00	\$3,648,235.27	\$3,680,075.73	50%
Total		\$9,972,706.00	\$5,896,554.88	\$4,076,151.12	59%

Fontes Informasaun husi Finansa MAE

2. Resultadu Implementasaun PNDS 3º Trimestre 2019

PNDS iha resultadu prinsipál 5 (haree anexu 2) ne'ebé mak presija atinji liu husi atividade sira ne'ebé mak defini husi programa. Tuir mai esplikaun detalhe kona-ba resultadu implementasaun husi fulan Jullu - Setembru 2019, tuir Planu Asaun Anual PNDS 2019.

2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Prosesu no Prosedimentu

Atividade / Indikator	Metas Anual	Resultadu Jullu – Setembru 2019
1.1 Suku 452 simu subsidiu Operasional no Infraestrutura	452	Suku 240 simu transferensia subsidiu operacional no Suku 201 simu transferensia subsidiu infraestrutura
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu	90	Ema 213 ne'ebé mak hetan treinamentu
1.3 Keixa resolve ona	80% resolve	Kontinua halo monitorizasaun ba keixa husi tinan kotuk

Atividade 1.1: Alokasaun Subsidiu Suku

Iha tinan 2019, PNDS hetan alokasaun ba subsidiu Suku ho montante hamutuk **\$9,566,590.00**. Husi alokasaun orsamentu ne'e, Suku 452 mak hetan subsidiu operacional ho montante **\$1,791,195.00** no Subsidiu Infraestrutura ba Suku 201 iha faze III siklu 2 ho montante **\$7,328,311.00** hodi implementa tuir prioridade sira ne'ebé mak defini ona husi Suku. Iha parte seluk, subsidiu operacional Suku iha faze I no II seidak iha ezekusaun, ho razaun katak subsidiu ba infraestrutura seidak aloka ba konta bankaria Suku. Progresu gastus subsidiu operacional no infraestrutura hanesan iha detalhe informasaun tuir mai:

Subsidiu Infraestrutura:

Subsidiu Infraestutura Suku						
Faze/Siklu	Transfer	Osan Restu Tinan	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	%
Faze 3 Siklu II	\$ 7,328,311.00	\$ 813,607.17	\$ 8,141,918.17	\$ 275,017.15	\$ 7,053,293.85	4%
Total	\$ 7,328,311.00	\$ 813,607.17	\$ 8,141,918.17	\$ 275,017.15	\$ 7,053,293.85	4%

Subsídriu Operasional:

Subsídriu Operasional Suku						
Faze	Transfer	Osan Restu Tinan Kotuk	Total Orsamentu	Gastu	Balansu	Ezekusaun
Faze I	\$ 490,250.00	\$ 538,347.70	\$ 1,028,597.70	\$ -	\$ 1,028,597.70	0%
Faze II	\$ 326,237.50	\$ 326,237.50	\$ 652,475.00	\$ -	\$ 652,475.00	0%
Faze III	\$ 974,707.50	\$ 1,044,775.00	\$ 2,019,482.50	\$ 191,555.25	\$ 1,827,927.25	9%
Total	\$ 1,791,195.00	\$ 1,909,360.20	\$ 3,700,555.20	\$ 191,555.25	\$ 3,508,999.95	5%

Atividade 1.2: Treinamentu

Iha fulan Jullu to'o Setembru 2019, ekipa Rekursu Umanu – Treinamentu PNDS implementa ona atividade treinamentu ne'ebé finansia husi Governu Timor-Leste (GoTL) liu husi *Fundo Desenvolvimento do Capital Humano* (FDCH), Governu Australia (GoA) liu husi DFAT nomós Governu Nova-Zelandia (HANDS) ba Funsionáriu PNDS nivel Nasionál no Munisípiu iha área tékniku, finansia no sosiál molok hahú implementa projetu Fatin Halimar no Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa iha Suku. Detalle liu mak hatudu iha tabela kraik ne'e:

Tabela Detalhe Treinamento Ne'ebe Financia husi FDCH, GoA no GoNZ

No	Detalle Treinamentu	Total Partisipante			Data	Fatin Treinamentu	Total Orsamentu	Financia husi
		Mane	Feto	Total				
1	Sosializasaun no treinamentu sosiál kona-ba implementasaun Fatin-Halimar (playground) faze II ba funsionáriu PNDS iha nivel Nasionál no Munisípiu 12 no RAE OA	29	3	32	01 Jullu 2019	SENAI-Dili	\$ 23,512.73	GoNZ
2	Treinamentu tékniku kona-ba implementasaun Fatin-Halimar (playground) faze II ba pesoal tékniku PNDS	39	5	44	02 - 03 Jullu 2019	SENAI-Dili		
3	Treinamentu finansa kona-ba implementasaun Fatin-Halimar (playground) faze II ba pesoal finansa PNDS	19	15	34	02 - 03 Jullu 2019	SENAI-Dili		
4	Treinamentu iha area sosiál kona-ba Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa iha Munisípiu 7 (Ainaro, Baucau, Bobonaro, Ermera, Manufahi, Lautem, Viqueque)	12	1	13	04 Jullu 2019	SENAI-Dili	\$ 6,199.00	FDCH (GoTL)
5	Treinamentu iha area finansa kona-ba Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa iha Munisípiu 7	11	14	25	04 - 05 Jullu 2019	SENAI-Dili		
6	Treinamentu iha area tékniku kona-ba Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa iha Munisípiu 7	39	3	42	04 - 05 Jullu 2019	SENAI-Dili		
7	Treinamentu kona-ba ekipamentu (tools) ba teste qualidade bee-mós	14	1	15	31 Jullu 2019	STVJ-Comoro, Dili	\$ 960.00	DFAT (GoA)
8	Treinamentu iha area monitorizasaun no avaliasaun ba projetu komunitariu liuhusi PNDS	6	2	8	19-23 Agostu 2019	Bali, Indonesia	\$ 15,862.40	FDCH (GoTL)
Total		169	44	213			\$ 46,534.13	



Treinamentu iha Area Finansa Hodi Halo Preparasaun Molok Hahú Implementa Konstrusaun Infraestrutura Escola Edukativa.



Treinamentu Kona-ba Monitorizasaun no Avaliasaun ba Projetu Komunitariu iha Bali-Indonesia.

Atividade 1.3: Rejistu no Rezolve Keixa

Durante periode ida ne'e Ekipa Jestaun Keixa iha Sekretariadu PNDS Nasionál simu keixa foun rua. Husi keixa rua ne'e, ekipa keixa halo identifikasaun no verifikasaun ba keixa rua ne'e hodi konklui katak keixa hirak ne'e la tama ba kategória kazu. Ho razaun ema ne'ebé halo keixa menus koñesementu ba sistema no prinsípiu PNDS. Iha parte seluk, Ekipa Jestaun Keixa serbisu hamutuk hodi kontinua halo monitorizasaun no haree kona-ba sistema rejistu keixa ne'ebé mak estabesele ona.

Sistema Jestaun Informasaun (MIS) no Informasaun Teknolójia (IT) PNDS**Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS**

PNDS liu husi kontabilista, enjeñeru no ofisiál MIS iha Munisípiu 12 no RAEOA hamutuk ema nain 60 mak hatama dados iha Sistema Jestaun Informasaun kona-ba progresu fíziku, finansa no partisipasaun Komunitade husi atividade PNDS. PNDS Nasionál halo atualizasaun kona-ba sistema utilizasaun dados no haree kona-ba rezultadu hodi produs relatóriu.

Informasaun Teknolójia (IT) PNDS

Migrasaun liña internet no intranet PNDS ba iha liña Governu ne'ebé maneja husi TIC TIMOR estabesele ona iha Munisípiu 12 falta deit RAEOA ne'ebé mak tuir planu sei estabesele iha fulan oin. Objetivu husi migrasaun ne'e mak atu elimina kustu ne'ebé mak durante ne'e selu husi Governu Australia (GoA) liu husi DFAT no mós redus kustu selu internet no intranet hodi garante seguransa ba dados hotu PNDS nian iha futuru.

Atividade hirak ne'ebé mak ekipa IT halo mak hanesan: dezliga liña husi TT (Timor Telekom) no Telemor, muda server ne'ebé mak durante ne'e iha Fatuhada ba TIC data centre, Vendor halo instalasaun ba liña fibra ótika husi PNDS Palacio ba iha TIC data centre, halo mós konfigurasan ba email no website server atu bele simu ka haruka email no mós atividade ne'ebé mak relasiona ho serbisu IT nian inklui rezolve problema hirak ne'ebé relasiona ho atividade instalasaun no konfigurasan.



Ekipa IT Instala Redi iha Munisípiu 12 (la inklui RAEOA) Hodi Halo Migrasaun Rede PNDS ba Rede Governu TIC Timor.


2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun Komunitade Sira

Atividade / Indikator	Metas Anual	Rezultadu Jullu – Setembru 2019
2.1 # Estrutura EJS no Komunitade partisipa iha treinamentu	4,972	3,649 (Feto = 1,560, Mane = 2,089) mak partisipa iha treinamentu.
2.2 % husi feto sira partisipa iha atividade PNDS	40%	42% (Feto 1,295) partisipa iha atividade PNDS

Atividade 2.1: Kapasitasaun ba Ekipa Jestaun Suku no Komunitade

Durante fulan Jullu - Setembru 2019 fasilitador PNDS fo treinamentu ba membru Ekipa Jestaun Suku no Komunitade iha Faze III Siklu 2. Treinamentu ne'e hala'o atu aumenta kapasidade EJS ninia iha área Planeamentu, Kapasitasaun Feto, Jestaun Finaseira, Konstrusaun Projetu, Monitorizasaun, Operasaun no Manutensaun. Treinamentu ne'e hetan partisipa husi EJS ema 542 (Feto = 265, Mane = 277) no Komunitade ema 3,107 (Feto = 1,295, Mane = 1,812).

Partisipasaun EJS no Komunitade iha Trainamentu

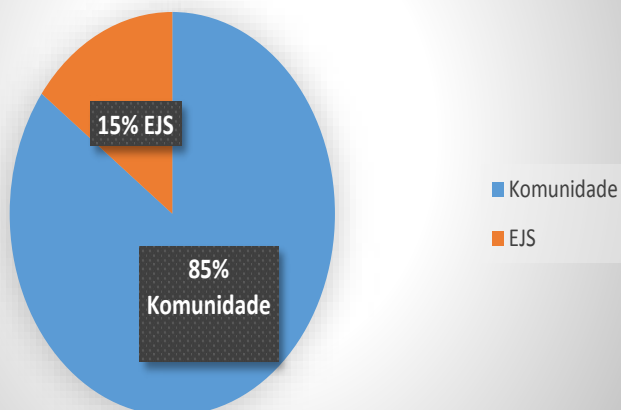

Modul Treinamentu

- A : Introdusaun no Planeamentu
- B : Kapasitasaun Feto 1
- C : Orientasaun ba Fasilitador Suku
- D : Jestaun Finansas 1
- E : Hakerek Proposta
- F : Kapasitasaun Feto 2
- G : Jestaun Konstrusaun
- H : Jestaun Finansas 2
- I : Monitorizasaun no Akontabilidade
- J : Operasaun no Manutensaun
- K : Jestaun Finansas 3
- L : Monitorizasaun no O&M



Fasilitador Postu Administrativu Munisípiu Manatuto fasilita treinamentu ba Ekipa Jestaun Suku.

Atividade 2.2: Partisipasaun Feto iha Atividade PNDS

Partisipasaun Komunitade hamutuk ema nain 3,107 ne'ebé mak partisipa iha atividade PNDS iha nivel Suku. Feto hamutuk 1,295 ka porsentu haatnulu-resin-rua (42%) mak partisipa iha atividade ne'e liu-liu atividade implementasaun ba konstrusaun iha Suku.



Komunidade Hahú Implementa Projetu Bronjong ho Distansia metru 50 iha Suku Manumera Postu Administrativu Turiscai Munisípiu Manufahi.

2.3 Infraestrutura ho Kualidade Di'ak Harii no Mantein ona husi Komunitade


Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu Jullu – Setembru 2019
3.1 % husi infrastrura baziku iha kualidade Tékniku	80%	Lista projetu final Faze III Siklu 2 hamutuk 272 projetu
3.2 # Suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	452 Suku	Suku 40

Atividade 3.1: Kualidade Tékniku Projetu PNDS

Progresu Fíziku

Prioridade husi Komunitade ba tinan 2019 iha implementasaun faze III siklu 2 hamutuk projetu 272 ne'ebé seidak inklui projetu husi RAE OA. Projetu 272 ne'e hahú implementa husi Komunitade iha fulan Jullu 2019 no progresu fíziku atinji ona porsentu ruanulu-resin- rua (22%). Tuir mai gráfiku kona-ba progresu fíziku iha Munisípiu 12:

Gráfiku Progresu Kategória Munisípiu

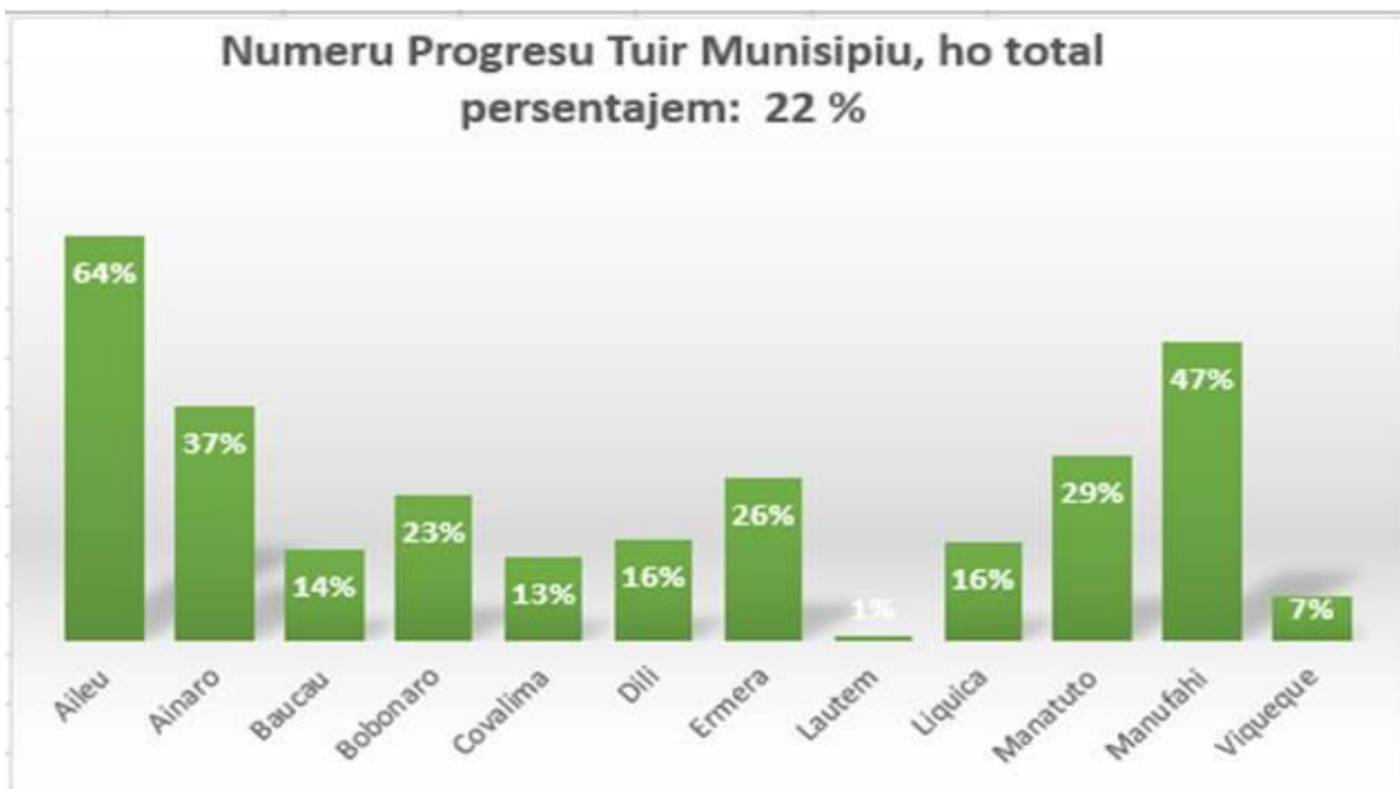

Husi gráfiu ne'e hatudu katak Munisípiu Aileu mak progresu fíziku konstrusaun atinji ona porsentu neennulu-resin-haat (64%) no Munisípiu Lautem mak nia progresu fíziku foin atinji porsentu ida (1%). Munisípiu seluk atinji ona ba porsentu sanulu (10%) ba leten.



Progresu Fíziku Konstrusaun Ponte Betaun ho naruk 39m ho Box Kulvert ho Distansia metru 4,177.12m² ho Total Orsamentu \$ 39,854.50 iha Suku Laktos Postu Administrativu Fohorem Munisípiu Covalima.

Atividade 3.2: Monitorizaun no Supervizaun ba Projeitu PNDS

Ekipa PNDS nivel Munisípiu no Nasionál kontinua halo monitorizasaun no mós supervizaun ba Ekipa Jestaun Suku iha Suku 202 iha Faze III siklu 2. Iha trimestre ne'e suku haatnulu (40) mak hetan monitorizasaun no supervizaun husi ekipa PNDS Nasionál

- **Primeira Pedra**



Lansamentu Perfurasaun Be'e-mos Ne'ebé Lança Husi Vice-Ministru Administrasaun Estatal, Abílio José Caetano no Akompañia Husi Embaixador Australia ba Timor-Leste, Hala'o iha Postu Administrativu Cristo-Rei.

Lansamentu perfurasaun Be'e-mos ne'ebé lansa husi Vice-Ministru Administrasaun Estatal, Abílio José Caetano no akompanha husi Embaixador Australia ba Timor-Leste, hala'o iha Aldeia Akanunu, Suku Hera, Postu Administrativu Cristo-Rei, Munisípiu Dili. Projetu ne'e propoin husi Komunitade rasik atu bele responde sira nia difikuldades kona-ba falta be'e-mos. Iha lansamentu ne'e hetan partisipasaun mos husi Vice-Ministru Administrasaun Estatal, Embaixador Australia ba Timor-Leste, Funsionáriu PNDS Nasionál, Munisípiu no Postu, Autoridade Lokal no mós Komunitade husi Suku Hera Aldeia Akanunu.



Representante Vice MAE, Edgar Sequeira Martins Akompanha Husi Komunitade Suku Maumeta Lansa Premeira Pedra ba Rehabilitasaun no Konstrusaun Estrada.

Implementasaun konstrusaun no rehabilitasaun estrada rural iha iha Aldeia Nartutu, Suku Maumeta, Postu Administrativu Bazartete, Munisípiu Liquisa oficialmente hahú ho lansamentu premeira pedra husi representante Vice Ministru Adminitasaun Estatal, Edgar Sequeira Martins akompaña husi Komunitade Suku Maumeta ba rehabilitasaun no konstrusaun estrada. Konstrusaun no rehabilitasaun ba Estrada rural ne'e atu fasilita Komunitade no ba movimentu tranporte públiku husi Postu Administrativu ida ba Postu Administrativu seluk hodi halo atividade loron-loron nian.

Rehabilitasaun konstrusaun no projetu estrada rural ho distansia metrus 700 ne'ebé uja sistema rabat beton. Lansamentu ne'e hetan partisipasaun husi representante Vice-Ministru MAE, Administrador Postu Liquisa, Diretora Nasionál Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku, Diretor Delegasaun Munisípiu Liquisa PNDS no Funsionáriu PNDS Munisípiu Liquisa, Komunitade Suku Maumeta no representante husi parseirus PARTISIPA.

• Enkontru Akontabilidade Primeiru Ezekusaun Husi Komunitade

Etapa 10 husi siklu implementasaun PNDS mak enkontru akontabilidade dahuluk ba ezekeusaun subsídiu fundu infraestrutura ne'ebé mak Ekupa Jestaun Suku sira maneja hodi realiza implementasaun konstrusaun iha Suku. Ba implementasaun faze III siklu 2, total Suku 79 mak realiza ona sira nia enkontru akontabilidade ba dahuluk.

Partisipasaun husi Komunitade no EJS masimu tebes no Komunitade sente sai nain ba projetu ne'ebé mak harii ona iha sira nia Suku. Komunitade no EJS hamutuk 817 mak partisipa iha atividade ne'e, feto ema 293 no mane ema 542.



Enkontru Akontabilidade Dahuluk iha Suku Liurai, Postu Administrativu Turiscari Munisípiu Manufahi.

• Monitorizasaun Auditoria Finansa

Monitorizasaun Auditoria Finansa mak sai hanesan monitorizasaun rutina husi PNDS. Objetivu husi monitorizasaun auditoria ne'e mak atu halo avaliasaun ba iha atividade PNDS liliu iha parte finansa. Iha tinan ne'e, Munisípiu Ainaro no Manufahi sai tarjetu ba monitorizasaun.

Ekipa ne'ebé mak ba halo avalisaun no monitorizasaun ne'e mak kompostu husi GTTM mak hanesan ekipa husi Ministeriu Finansa, Ekipa husi Ministeriu Agrikultura no Ministeriu Administrasaun Estatal inklui ekipa balun husi PNDS rasik. Rezultadu husi avalisaun no monitorizasaun ida ne'e, hatudu katak iha Komunidade iha Suku balun ne'ebé mak susesu ona hodi jere orsamentu ne'ebé mak Governu aloka ba iha Suku no iha mós Komunidade iha Suku balun ne'ebé sei kontinua hetan tulun husi ekipa PNDS atu jere orsamentu ne'ebé alokadu.



Diretora PNDS, Dulce Guterres Junior Esplika Objetivu Husi Monitorizasaun Konjunta Kona-ba Ezekusaun Orsamentu PNDS iha Implementasaun Faze III Siklu 2 iha Suku Maulau, Postu Maubisse, Munisípiu Ainaro.

2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu Jullu – Setembru 2019
4.1 # Enkontru kordenasaun External iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 3	2 (Enkontru hamutuk ho MEJD)
4.2 # Enkontru kordenasaun Internal iha nivel Nasionál no Munisípiu realizadu	Enkontru realiza dala 4	1 (Enkontru kordenasaun Nasionál no enkontru nivel Munisípiu)

Atividade 4.1:

Iha trimestre ne'e, PNDS kontinua realiza enkontru regular ho MEJD. Objetivu husi enkontru ne'e mak hodi fahe informa kona-ba progresu husi implementasaun Playground no mós ba programa harii eskola edukativa no kordena di'ak liu tan serbisu hotu ne'ebé ligadu ho atividades refere. Enkontru hirak ne'e partispa husi Diretor MEJD Munisípiu, Xefe Unidade Operasional PNDS, tékniku husi MEJD, tékniku PNDS no membru KKT.

Atividade 4.2:

- **Enkontru Koordenasaun Internal**



Diretur Nasionál PNDS Interinu, Xefe Unidade Operasional, Diretores Delegasaun PNDS Munisípiu 12 no RAEOA, Asesores no Funsionáriu PNDS hala'o Enkontru Kordenasaun PNDS nivel Nasionál iha Salaun Centru Grupu Trabalho Turizmu Hatobuilico, Postu Hatobulico, Munisípiu Ainaro.

Atu hametin liu tan liña kordenasaun entre funsionáriu PNDS, Sekretariadu Tékniku Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) realiza enkontru kordenasaun iha Postu Administrativu Hato-builico, Munisípiu Ainaro. Objetivu husi enkontru koordinasaun ne'e mak atu bele kordena di'ak liu tan serbisu hotu ne'ebé ligadu ho implementasaun rutina programa PNDS nian liu-liu foka ba implementasaun faze III siklus 2 ne'ebé sei implementa iha Suku 202 iha territóriu Timor-Leste.

Alende diskute kona-ba planu global PNDS nian iha enkontru ne'e mós diskute kona-ba planu global atividade adisional seluk ne'ebé halo ona akordu atu implementa konstrusaun Eskola Edukativa 9 inklui Fatin Halimar hamutuk 67 ne'ebé sei implementa iha Suku hirak ne'ebé pertense iha implementasaun. Enkontru ne'e hetan partisipasaun husi representante Diretora Sekretariadu Tékniku PNDS, representante Administrador Postu Hato-builico, Coordenador PNDS husi Munisípiu 12 no RAOEA, Xefe Unidade, Xefe Departamentu, Funsionáriu PNDS Nasionál, Assessor Nasionál no Internasionál nomós *Field Support Team* (FST) husi ajénsia PARTISIPA ne'ebé durante ne'e fo apoiu ba implementasaun Programa PNDS.

2.5 Igualdade Jéneru no Inklusaun Sosiál (JIS) Integradu iha PNDS

Atividade / Indikador	Metas Anual	Rezultadu Jullu – Setembru 2019
5.1 Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual	73% husi atividade iha Planu Asaun Anual JIS 2018-19 implementa ona

Atividade 5.1: Planu Asaun Annual Jéneru no Inklusaun Sosial (JIS)

Iha trimester ne'e, Implementasaun atividade PAAJIS 2018/2019 nian atinji ona 73%. Ekipa JIS realiza Semináriu no Mini Expo kona-ba Kontribuisaun Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku hodi Hasa'e Rendimentu Ekonómia Feto. Semináriu ne'e hala'o ho objetivu atu fahe esperensia ba malu husi istória ne'ebé di'ak, susesu no fó oportunidade ba feto maluk sira atu aprende kona-ba oinsá PNDS fó tulun ba feto sira hodi hasa'e sira nia vida ekonómia lor-loron. Atividade seluk husi PAAJIS tuir mai mak hanesan:

- Halibur dados bazeia ba agregadu jéneru no inklusaun sosiál liu husi sistema MIS;
- Prepara proposta hodi husu pedidu orsamentu ba MAE sobre atividade seminar no mini expo iha Lautem, Suku Vizita Malu iha Munisípiu Covalima inklui *RadioTalk Show* ne'ebé kobre Munisípiu Manatuto, Viqueque, Lautem no RAOEA;
- Implementa *Radio Talk Show* iha Munisípiu Viqueque no Manatuto;
- Partisipa iha enkontru ekipa Traballu Jenéru no Inklusaun Sosiál nian;
- Fahe relatório JIS nian ba parseiru sira hanesan MSSI, SEII no parseiru dezvoltamentu sira seluk inklui sosiedade sivil hanesan RHTO, ADTL, WaterAid, Fokupers no seluk tan.



Representante Vice Ministru Administrasaun Estatal, Representante Husi Administrador Munisípiu Lautem, Diretora Nasionál PNDS, Representante husi Liña Ministerial Munisípiu Lautem, Representante husi SEIL.

2.6 Atividade Adisional

2.6.1 Sorumutu no Sosializasaun Fatin Halimar (Playground)

Liu husi programa **“Halimar, Aprende no Deskobre Susesu (HANDS)”** ne’ebé foka ba edukasaun pré-eskolár, Sekretariadu Tékniku PNDS hamutuk ho Ministériu Edukasaun Ensinu Pre-Eskolár kontinua implementa no harii Fatin Halimar ba faze daruak (II). Iha trimester ne’e, Suku 66 tama ona iha etapa sia (9) mak etapa transferensia fundu operacional no infraestrutura ba iha konta bankaria Suku ho montante hamutuk **\$ 278,696.60** falta Suku 1 mak sei hetan transferensia iha trimester tuir mai. Detalle informasaun kona-ba Fatin Halimar iha aneksu.

2.6.2 Programa Retornu Ekonómia Báziku (PREB)

Iha fulan Jullu - Setembru 2019, PNDS liu husi Programa Retornu Ekonómia Bázika hala’o estudu análise viabilidade ekonómia ba implementasaun atividade sosiu ekonómika iha tinan oin. Estudu análise ne’e foka liu ba prioridade prinsipal haat (4) mak hanesan Uma Bainaka, Mini Merkadu, Armagen Agrikola no Lutu ba To’os. Objetivu prinsipal husi atividade ne’e mak atu haree direta viabilidade ekonómia no identifika klean liu tan kona-ba prioridade haat (4) ne’ebé mak relasiona ho infraestrutura bázika ne’ebé PNDS estabelese ona husi Komunidade iha Suku. Atividade ne’e konsentra iha Suku sanulu-resin-sia (19) mak hanesan tuir mai:

No	Munisípiu	Postu Administrativu	Suku	Prioridade
1	Ainaro	Maubise	Maulau	Uma Bainaka
2			Matorek	Mini Merkadu
3	Baucau	Baquia	Alaua-Leten	Uma Bainaka
4		Venilale	Uaioli	Uma Bainaka
5			Uma-Anaco	Armajen Agrikola
6		Vemase	Loiulubu	Uma Bainaka
7			Caicua	Uma Bainaka
8	Bobonaro	Maliana Vila	Saburai	Uma Bainaka
9	Covalima	Fohorem	Dato 2	Uma Bainaka
10			Dato 3	Uma Bainaka
11			Fohorem	Uma Bainaka
12			Laktos	Uma Bainaka
13	Lautem	Lautem	Raca	Uma Bainaka
14		Lospalos	Souro	Mini Merkadu Tais
15	Manufahi	Turiscaí	Caimauk	Uma Bainaka
16			Matorek	Mini Merkadu
17			Manumera	Uma Bainaka
18	Manatuto	Manatuto Vila	Cribas	Lutu ba To'os
19		Laclo	Hohorai	Uma Bainaka

Komunidade antusiasmu tebes ho atividade ne'e no hetan partisipasaun masimu husi Xefe Suku, Xefe Aldeia, Membro Konsellu Suku no EJS. Rezultadu husi asesmentu viabilidade ekonómia sei halo analiza hodi fo sai rezultadu iha tempu tuir mai hodi tetu nia implementasaun iha tinan 2020.



Asesmentu Viabilidade Ekonómia iha Suku Souro, Postu Administrativu Lautem, Munisípiu Lautem.

2.6.3 Programa Harii Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa (KIEE)

Iha tinan 2019, Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) no Ministériu Administrasaun Estatal (MAE) asina akordu (MoU) hodi implementa no harii konstrusaun infraestrutura eskola edukativa sia (9) iha Munisípiu hitu (7). Programa harii Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa ne'e ho objetivu atu harii sala aula foun no rehabilitasaun ba sala sira ne'eb'e mak hetan estragus husi dezastre naturais tuir mekanismu no prosedimentu ne'ebé estabesele ona iha PNDS.

Orsamentu ne'ebé alokadu ho montante hamutuk \$ 588,571.19. Implementasaun konstrusaun infraestrutura eskola edukativa ne'e atinji ona porsentu ualu (8%). Tuir mai detalhe informasaun kona-ba eskola sia (9):

Tabela Eskola Bazika Filial sia (9) iha Munisípiu hitu (7)

No.	Munispiu	Postu Administrativu	Suku	Eskola
1	Ainaro	Ainaro	Mau-Ulo	EBF Pader
2	Ainaro	Ainaro	Ainaro	EBF Sabago-1 Uma eskola
				EBF Sabago-2 Haris fatin & Sintina
3	Baucau	Laga	Atelari	EBF Daralari
4	Baucau	Quelicaí	Maluru	EBF Uaida
5	Bobonaro	Bobonaro	Oeleu	EBF Mologen
6	Emera	Emera	Poetete	EBF Munisipal Emera
7	Lautem	Iliomar	Tirilolo	EBF Nautetu
8	Manufahi	Alas	Dotik	EBF Sarin
9	Viqueque	Ossu	Ossorua	EBF We Eulaek



Progresu Harii Konstrusaun Eskola Edukativa iha Suku Sarin Postu Administrativu Alas Munisípiu Manufahi.

3. Konklusaun

Relatóriu ida ne'e atualiza liu ba rezultadu implementasaun PNDS ne'ebé kobre fulan Jullu-Setembru 2019. Ba 3º trimestre ida ne'e hanesan periodu kontinuasaun ba implementasaun projetu Faze III Siklu 2, inisiu ba asesmentu parseiru kona-ba Programa Retornu Ekonómia Báziku, hahú konstrusaun ba Implementasaun Fatin Halimar neennulu-resin-hitu (67) nomós harii konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa sia (9) iha Munisípiu hitu (7).

Rezultadu implementasaun PNDS durante periodu ida ne'e konklui katak:

- Gastus Orsamentu Jeral Estadu hamutuk **\$5,896,554.88 (59%)**;
- Monitorizasaun ba implementasaun projetu PNDS hamutuk 272 iha Suku (la inklui suku 7 iha RAEOA) no progresu fíziku atinji ona porsentu ruanulu-resin-rua (22%);
- Governu Timor-Leste liu husi *Fundo Desenvolvimento Capital Humano* (FDCH) fasilita treinamentu ba funsionáriu hamutuk ema nain 88, Governu Australia (GoA) mós apoiu treinamentu ba funsionáriu PNDS Nasionál no Sub-Nasionál hamutuk ema 15 no mós GoNZ apoiu treinamentu ba funsionáriu PNDS Nasionál no Sub-Nasionál hamutuk ema 110;
- Partisipasaun Feto iha Atividade PNDS hamutuk ema 1,295 mak feto ka porsentu haatnulu-resin-rua (42%);
- Kontinua halo enkontru koordenasaun ho seitores Setór relevantes;
- Hala'o enkontru kordenasaun internal no eksternal iha PNDS no parseiru sira;
- Hala'o atividade rutina PNDS kada tinan ba auditoria finansa iha Munisípiu Ainaro no Lautem;
- Semináriu no mini expo ko-naba kontribuisaun programa Nasionál dezvoltamentu Suku hodi hasa'e rendimentu ekonómia;
- Transferensia subsídiu orsamentu ba programa Fatin Halimar ba konta bankaria Suku 66 (falta Suku 1);
- Hala'o asesmentu viabilidade ekonómia ba implementasaun atividade sosíu ekonómia PNDS iha Programa Retornu Ekonómia Báziku;
- Implementasaun harii Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativa sia (9) iha Munisípiu hitu (7) no progresu fíziku atinji ona porsentu ualu (8%).

Planu 4º Trimestre (Outubro - Dezembro 2019)

Diresaun	Atividade	Outubru 2019	Novembru 2019	Dezembru 2019
PNDS	Kontinuasaun Implementasaun konstrusaun projetu PNDS Faze III Siklu 2	x	x	
	Enkontru Akontabilidade Dahuluk		x	x
	Transferensia Fundu Infraestrutura (2)		x	x
	Sertifikasaun no Enkontru Akontabilidade Final 100%		x	x
Playground	Transferensia Subsidiu Ba Conta Bankaria Suku	x		
	Implementasaun Projeitu Fatin Halimar Fase II ba Unidade 67		x	x
	Sertifikasaun no Enkontru Akontabilidade Final 100%		x	x
Konstrusaun Infraestrutura Eskola Edukativu	Implementasaun konstrusaun	x	x	
	Enkontru Akontabilidade Dahuluk		x	
	Transferensia Subsidiu Final		x	
	Sertifikasaun no Enkontru Akontabilidade Final 100%			x
Programa Retornu Ekonómia Bazika (PREB)	Analizasa resultadu ba atividades asesmentu husi prioridades PREB		x	
	Aprezentasaun rezultadu final ba ST – PNDS Nivel Nasionál		x	
	Prepara planu implementasaun PREB ba ano fiskal 2020			x

4. Anexu

- 1) Enkuadramentu PNDS
- 2) Relatório Planu Asaun Anual 3º Trimestre 2019
- 3) Lista Fatin Halimar

Anexu 1: Enkuadramentu Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

META (OBJETIVU JERAL)		
Hadi'ak kondisaun Sósio-Ekonómiku no Governasaun Lokál ba mane no feto sira iha Suku laran iha Timor-Leste liu husi infraestrutura ne'ebé Komunitade mak jere rasik.		
Rezultadu / Atividades	Indikadores de Dezempenhu	Meta Anual 2019
Rezultadu 1: HAMETIN PNDS NIA SISTEMA, PROSESU NO PROSEDIMENTU HODI FÓ IMPLEMENTASAUN DIRETA BA KOMUNITADE		
1.1 Halo prosesu transferensia ba subsídiu operacional no infraestrutura ba Suku	Suku 452 simu subsídiu Operasional no Infraestrutura	452* *depende ba alokasaun orsamentu transferensia públiku
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu (40% mak feto)	Fornese treinamentu iha área Tékniku, Sosial no Finansa	Ema nain 90
1.3 Resolve keixa Komunitade nian	Keixa resolve ona	80% resolve
Rezultadu 2: HASA'E PARTISIPASAUN KOMUNITÁRIA NO KAPASIDADE ATU HALO PLANEAMENTU NO JERE INFRAESTRUTURA LOKÁL		
2.1 Kapasitasaun kontinua ba membrus Ekipa Jestaun Suku no Komunitade	# EJS no Komunitade partisipa iha treinamentu	4,972 membru EJS* *depende ba alokasaun orsamentu transferensia públiku
2.2 40% husi feto sira partisipa iha PNDS nia atividade	% Husi feto sira partisipa iha atividade PNDS	40%
Rezultadu 3: INFRAESTRUTURA HO KUALIDADE DI'AK HARI'I NO MANTEIN ONA HUSI KOMUNITADE SIRA		
3.1 Monitorizasaun no supervisaun regular ba projetu PNDS	% Husi infraestrutura baziku iha qualidade Tékniku	80% projetu PNDS atinji qualidade di'ak padraun Tékniku PNDS
3.2 Halo visita terenu ba projetu iha Suku	# Suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	452 Suku monitorizadu husi ekipa PNDS

Rezultadu 4: PLANEAMENTU, KORDENASAUN NO KOMUNIKASAUN HODI HAMÓSU IMPLEMENTASAUN PROGRAMA NE'EBÉ EFETIVU NO KUALIDADE DI'AK

4.1 Enkontru kordenasaun regular (external) ho seitor relevante	# Enkontru kordenasaun External iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 4
4.2 Enkontru kordenasaun mensal (internal) iha nivel Nasionál & Munisípiu	# Enkontru kordenasaun iha nivel Nasionál no Munisípiu realizadu	Enkontru realiza dala 12

Rezultadu 5: JÉNERU, INKLUZAUN SOSIÁL, AMBIENTE NO DEFISIÊNCIA INTEGRADU IHA PNDS NIA ESTRATÉJIA SIRA, PLANU UNIDADE, DEPARTAMENTU NO INDIVIDUÁL

5.1 Prepara Planu Asaun Anual ba Jéneru no Inklusaun Sosiál (PAAJIS)	Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual
--	----------------------------	-------------

Anexo 3: Relatório Planu Asaun Anual ba 3º Trimestre 2019

Relatório de Desempenho Terceiro Trimestre (Julho-Setembro) 2019

Códigos	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Meio de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento				Total Orçamento Aprovado	Alterações Orçamentais (virements)	Orçamento Revisto	Orçamento Executado (Atual)	Orçamento executado (%)	Resultados atingidos Ano de 2019	Constrangimentos / Atrasos / Soluções propostas	Observações Adicionais
									Orçamento											
									BS	C	M	D								
Objetivo Geral: A Descentralização Administrativa e Poder Local assegurado, desenvolvido e melhorado com qualidade para prestar atendimento com eficiência e eficácia. As eleições gerais são bem organizadas, de forma transparente, neutral, imparcial e democrática.																				
Meta Final:																				
Indicador de Prestação de Serviços:																				
Programa: Boa Governança e Onda Institucional																				
Objetivos Específicos: Obter a infraestrutura básica pelos municípios com impacto positivo na vida socioeconómica de todos os cidadãos e capacitar os funcionários para o processo de desconcentração administrativa nas áreas de planeamento e financeira.																				
510	Sub-Programa: Boa Governança	1) 452 sucos que recebem subsídios de infraestrutura e operacionais para 2019	1) PDM 1: Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais para 2019	1) 452 sucos que recebem subsídios de infraestrutura e operacionais para 2019	1) 452 sucos que recebem subsídios de infraestrutura e operacionais para 2019	MAEOGE	BB0502					\$ 9.566.500,00	\$ 447.600,00	\$ 9.118.900,00	\$ 5.439.068,18	60%	1) Foi transferir os subsídios de operacionais para 240 sucos os subsídios de infraestruturais para 201 sucos; 2) Equipa PNDS continua realizar treinamentos na área de planeamento, capacitação das mulheres, Gestão financeira, construção dos Projetos, monitorização, operação e manutenção para Equipa Gestão do Suco em 55 sucos. Total participantes são: 542 pessoas (M:277 ; F:265);			
5180103	Desenvolver, implementar, monitorizar e avaliar os progressos do projeto das comunidades a nível suco	100% progresso dos projetos da comunidade a nível suco	1) TF 13.2.1- Relatório progresso físico; 2) CFM 12- Relatório Retros & Perspectivas; 3) Relatório mensal; 4) Relatório trimestral; 5) Relatório anual	1) 100% projetos avaliados; 2) 100% gastos realizados; 3) 100% atividades implementadas; 4) 100% resultados alcançados; 5) 100% resultados alcançados	30 sucos abrangidos para continuidade de monitorização e avaliação	MAEOGE	BB0502	\$322.000,00				\$ 322.000,00	\$ 447.600,00	\$ 769.600,00	\$ 382.686,70	50%	• Foi implementou os projetos dos PNDS em sucos e monitorização 272 projetos em 202 sucos na fase III suco 2. Os progressos foram 22%; • PNDS realizar Lançamento primeira pedra projetos pertença aqui em Aldeia Akanuru, Posto Administrativo Cristó Rei, Município Dili; • Foi realizar Lançamento primeira pedra do construção e reabilitação o projeto Estrada em Suco Maureta, Posto Administrativo Bazante, Município Liquiçá; • Foi realizar atividade seminário Dias das Mulheres Mundial em Município Laudem; • Realizar o atividade sobre audição na parte financeira em Município Anaro e Município Manufahi; • Realizar o atividade sobre audição na parte financeira em Município Anaro e Município Manufahi; • 60 pessoas em Nacional e Municipais foi utilizar o sistema MIS para análise dados realizados sobre áreas social, finança e técnica; • PNDS Município foi realizar os encontros com os fornecedores sobre todos processos aprovisionamentos PNDS. Os encontros foi realizar em 12 Municípios e REAOA e participantes dos encontros são os companhias locais, lojas, Comunidades, Equipa Gestão Dos Sucos; • Foi Realizar o encontro Nacional para Avaliar os sucesso e os desafios durante a implementação do PNDS em 13 Municípios. Participaram do encontro Directora do PNDS, os Chefes de Unidade, Chefes dos Departamentos, os funcionários do Secretariado do PNDS, os Diretores do PNDS dos 13 Municípios, assessores e equipa suporte no terreno. Total participante são 100 pessoas; • Foi transferido o subsídio 70 projetos jardim infantil para conta bancária dos sucos; • Continuação implementação e monitorização construção infraestrutura Escola Educativa 9 em 7 Municípios e o progresso físico foi atingir 6%.			
5180108	Prestar formação para os funcionários do PNDS e comunidades locais na área de tecnologia da informação e comunicação em inglês, português, género e inclusão social e comunicação efetivo e PREB a nível Nacional	250 funcionários PNDS e 50 comunidade sao capacitados	Relatório, lista presença e certificado	foram capacitadas 105 pessoas na area planejamento, gestao, financa, tecnologia da informacao e engenharia	90	MAE/FDCH	BB0502					\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 22.061,40	11%	• Foi realizar o treinamento para os funcionários dos PNDS na área técnico, finança e social. Total participantes são 88 Mulheres: 20 ; Homens: 68; • O Governo Australa ajudar para realizar o treinamento na área técnico, finança e social. Total participantes são 15 Mulheres: 1 ; Homens: 14; • O Governo Nova Zelandia ajudar para realizar o treinamento na área técnico, finança e social. Total participantes são 110 Mulheres: 23 ; Homens: 87;				
Programa Relevo Economico Basico																				
Indicador de Impacto Economico Basico																				
510	Transferir os subsídios para as atividades do PREB	3 sucos pilbos do PREB identificado e realizado	0	0	0	MAEOGE						\$ 200.000,00		\$ 200.000,00		0%	1) Foi realizar o atividades assessoria para 19 prioridades em 17 sucos. 2) continuação sobre sucos identificado no cooperação entre PNDS e parceiros.			

Anexu 4: Lista Fatin Halimar

No	Munisípiu	Postu	Suku	Naran Eskola Pre-Eskolar
1	Aileu	Aileu vila	Seloi-Craik	Pre Escolar Silvestre
2	Aileu	Aileu vila		Pre Escolar Sarlala
3	Aileu	Aileu vila	Seloi Malere	Pre Escolar Aidelun
4	Ainaro	Ainaro	Soro	Pre Escolar Lemos P. Almeida
5	Ainaro	Ainaro	Ainaro	Pre Escolar 4 Montanhas
6	Ainaro	Hatu-Udo	Leolima	Pre Escolar 4 unidade Aimerleu
7	Ainaro	Hatu Bulico	Nuno-Mogue	Pre Escolar Hato-Bulico Vila
8	Baucau	Baucau	Tirilolo	Pre Escolar Joao Paulo II
9	Baucau	Quelicaí	Letemumu	Prem Escolar Letemumu
10	Bobonaro	Cailaco	Meligo	Pre School Marco
11	Bobonaro	Cailaco	Atudara	Pre Escolar Maumela
12	Bobonaro	Balibo	Leohito	Pre Escolar Taur Matan Ruak
13	Bobonaro	Balibo	Batugade	Pre Escolar Kay-Rala Batugade
14	Bobonaro	Bobonaro	Lourba	Pre Escolar Gumer Nazare
15	Bobonaro	Bobonaro	Tebabui	Pre Escolar Tebabui
16	Bobonaro	Bobonaro	Ilal-Laun	Pre Escolar Daci Mau Ilatlaun
17	Bobonaro	Bobonaro	Bobonaro	Pre Escolar Dom Cailito Bobonaro
18	Cova Lima	Suai Vila	Debos	Pre Escolar Wematan
19	Cova Lima	Suai Vila		Pre Escolar Babu Sinuc
20	Cova Lima	Suai Vila	Camenaça	Pre Escolar Wedare
21	Cova Lima	Suai Vila	Suai Loro	Pre Escolar Sucabilaran
22	Dili	Atauro	Maquili	Pre Escolar Piheru/Maqueli
23	Dili	Atauro	Macadade	Pre Escolar Fitun Esperanca I
24	Dili	Atauro		Pre Escolar Gamaliel/Berao
25	Dili	Atauro	Beloi	Pre Escolar Fitun Esperanca II
26	Dili	Atauro	Biqueli	Pre Escolar Dotan/Biqueli
27	Dili	Atauro		Pre Escolar Ebmezer
28	Ermera	Ermera Vila	Riheu	Pre Escolar Nino Conis Santana
29	Ermera	Ermera Vila	Leguimea	Pre Escolar Filial Hatuleta
30	Ermera	Ermera Vila	Lauala	Pre Escolar Esperanca Gleno Tuguluru
31	Ermera	Hatolia	Coilate-Letelo	Pre Escolar Raeraga
32	Ermera	Hatolia	Hatolia Vila	Pre Escola S. Francisco Xavier
33	Ermera	Lete Foho	Catrai Leten	Pre Escolar Tatamailau Catrai Leten
34	Ermera	Letefoho	Dukurai	Pre Escolar Flos Carmeli
35	Lautem	Tutuala	Tutuala	Pre Escolar Mua-Cau Tutuala
36	Lautem	Iliomar	Iliomar 1	Pre Escolar Iliomar
37	Lautem	Iliomar	Fuat	Pre Escolar Filial Bubutau
38	Liquica	Maubara	Vatuboro	Pre Escolar Wini-Bruma Ismaik Raemeda
39	Liquica	Maubara	Vatuvou	Pre Escolar Vatunau
40	Liquica	Maubara	Vaviquinia	Pre eskola fatin ba labarik

No	Munisípiu	Postu	Suku	Naran Eskola Pre-Eskolar
41	Liquica	Liquica	Dato	Pre Escolar Mauboque
42	Liquica	Liquica		Pre Escolar Pukelara
43	Manatuto	Laclubar	Orlalan	Pre Escolar Flores de Laclubar
44	Manatuto	Laleia	Cairui	Pre Escolar Cairui
45	Manufahi	Same	Dai-sua	Pre Escolar Rai Kotu Dai Sua
46	Manufahi	Same	Rotuto	Pre Escolar 20 de Agosto Rotuto
47	Manufahi	Same	Grotu	Pre Escolar Domingos Savio Grotu
48	Manufahi	Same	Betano	Pre-Eskolar Nova Bemetan Betano
49	Manufahi	Same		Pre Escolar Selihasan
50	Manufahi	Same	Holarua	Pre Escolar Fatuco
51	Manufahi	Fatuberliu	Fahinehan	D. Filomena Lobato
52	Manufahi	Fatuberliu	Clacuc	Pre Escolar Weroun Fatukahi
53	Manufahi	Fatuberliu	Fatucahi	Nosa Senhora Peregrinasaun 1987 Clacuc
54	Manufahi	Alas	Maha-Quidan	Pre Escolar S. Antonio de Padua Wedau-Berec
55	Manufahi	Alas		Pre Escolar Domin Taumutuk Mahaquidan
56	Manufahi	Alas	Taitudac	Pre Escolar Feriksare Alas
57	Oecusse	Pante Macasar	Naimeco	Pre Escolar Sao Francisco Asis Baqui
58	Oecusse	Pante Macasar	Cunha	Pre Escolar Kiu Betmanu Noapai
59	Oecusse	Pante Macasar	Lalisuc	Pre Escolar Francisco Mouzinho
60	Oecusse	Pante Macasar	Bobocasse	Pre Escolar Bobolo'a
61	Oecusse	Oesilo	Bobometo	Pre Escolar Bobmanat
62	Viqueque	Ossu	Ossu de Cima	Pre Escolar Uaibua
63	Viqueque	Ossu		Pre Escolar Bimali
64	Viqueque	Uato Carbau	Uani Uma	Pre Escolar Uani-Uma
65	Viqueque	Uato Lari	Babulo	Pre Escolar Bubulo-Uatolari
66	Viqueque	Uato Lari	Vessoru	Pre Escolar Bui-Ita/Vessoru
67	Viqueque	Uato Lari	Matahoi	Pre Escolar Crianças Amor de Iraler

